

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA




OBRA:

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TETABIATE; REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA DEMOCRACIA; MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, ESTADO DE SONORA.

LOCALIDAD: TETABIATE y DEMOCRACIA
MUNICIPIO: SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA

REPORTE FOTOGRAFICO

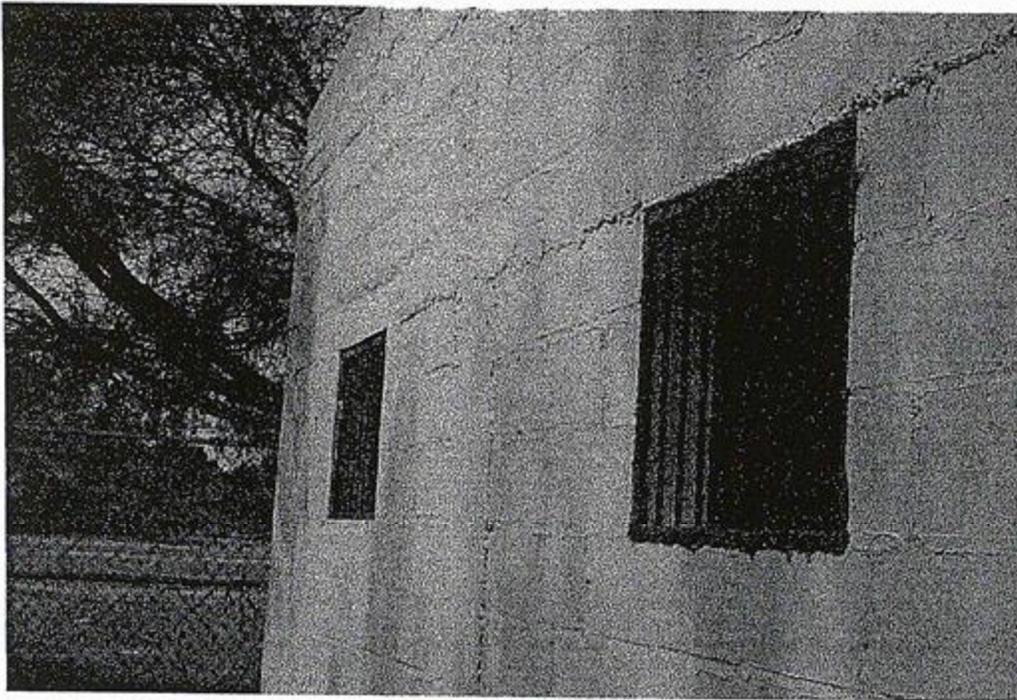

RELATORIA DE FOTOS

PINTURA DE ESMALTE EN MUROS A DOS MANOS, MARCA COMEX O SIMILAR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M. S. N. O. E.

[Handwritten signature]

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA




DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TETABIATE; REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA DEMOCRACIA; MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, ESTADO DE SONORA.

LOCALIDAD: TETABIATE y DEMOCRACIA

MUNICIPIO: SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA

REPORTE FOTOGRAFICO

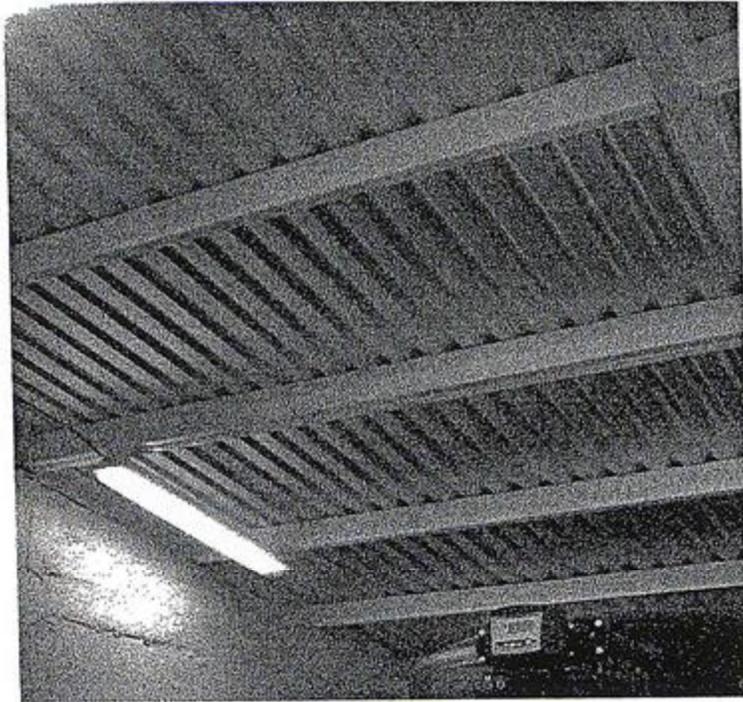

RELATORIA DE FOTOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZA ACANALADA R-72 12 FT. EN TECHUMBRE DE COBERTIZO PARA PLANTA DE EMERGENCIA. INCLUYE: MANO DE OBRA, LAMINA, MAQUINARIA, PERNOS DE SUJECION, Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M. L. M.

C.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA

OBRA:

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TETABIATE; REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA DEMOCRACIA; MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, ESTADO DE SONORA.




LOCALIDAD:

TETABIATE y DEMOCRACIA

MUNICIPIO:

SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA

REPORTE FOTOGRAFICO

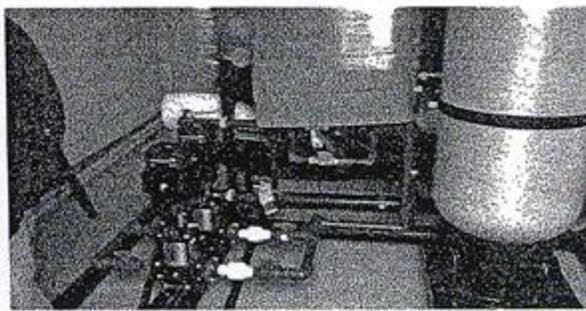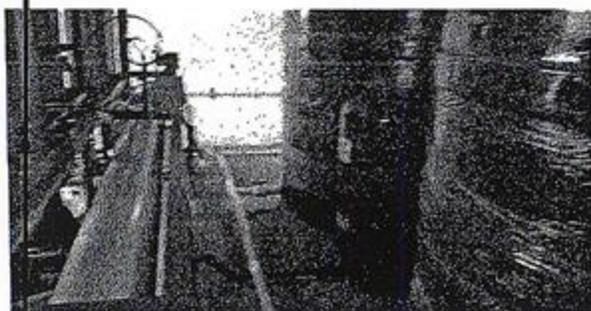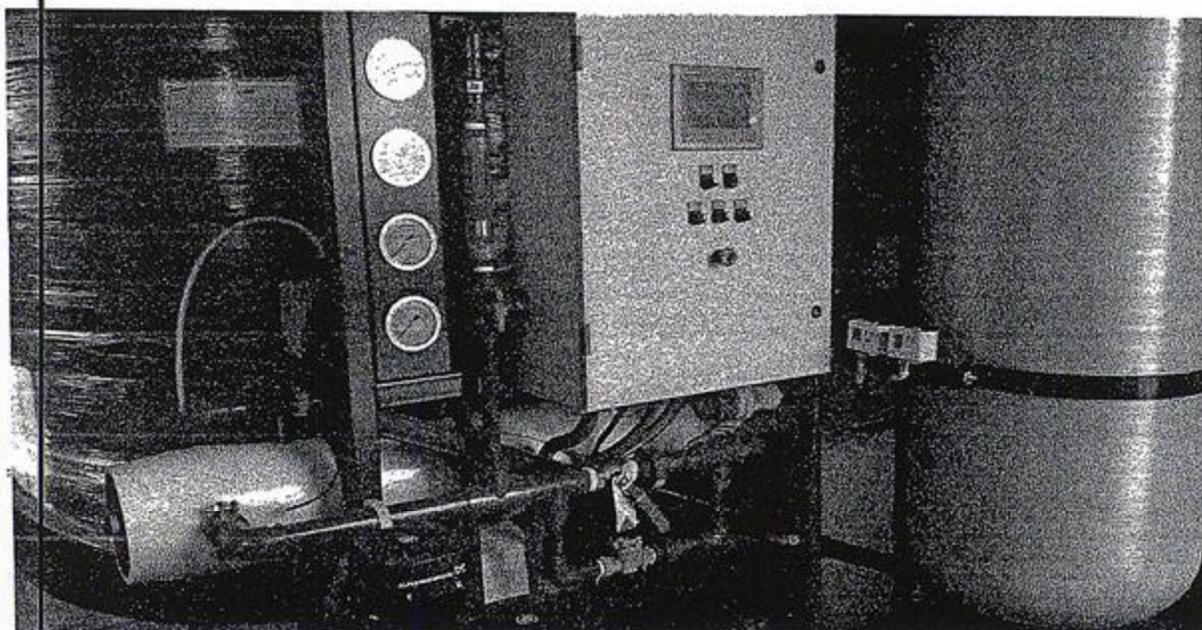

RELATORIA DE FOTOS

SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA POR OSMOSIS INVERSA CON CAPACIDAD PARA SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA.







Handwritten signature

Handwritten signature

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TETABIATE; REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA DEMOCRACIA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, EN EL ESTADO DE SONORA.
LOCALIDAD: TETABIATE Y LA DEMOCRACIA
MUNICIPIO: SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA.

R E P O R T E F O T O G R Á F I C O

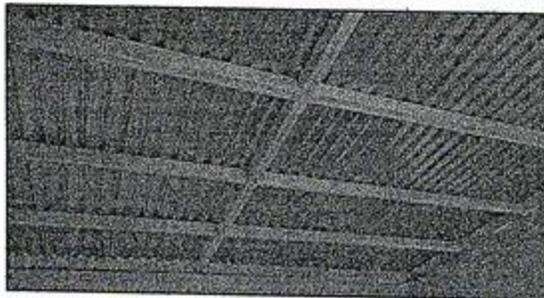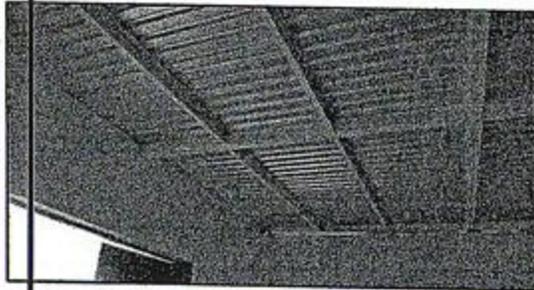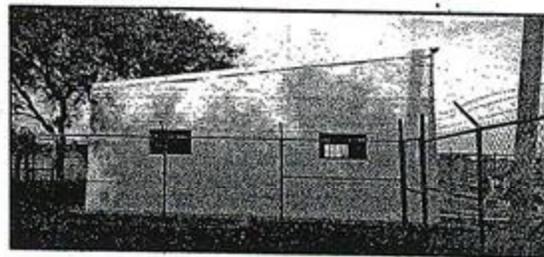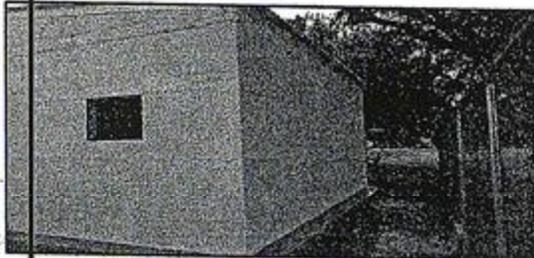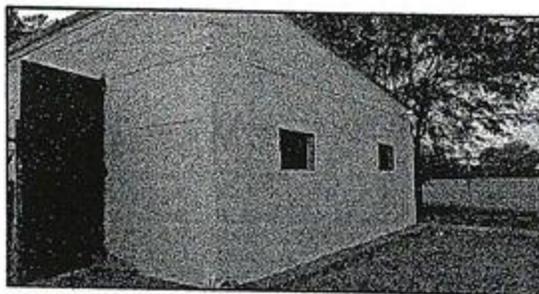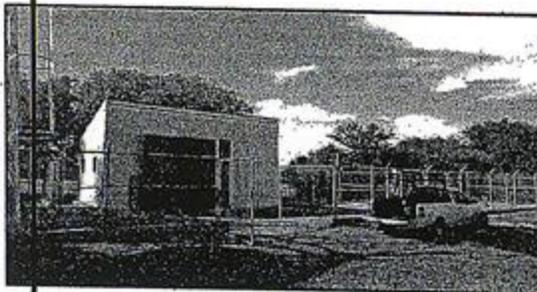







RELATORIA DE FOTOS

FOTOGRAFIAS EN DONDE SE APRECIAN LOS TRABAJOS TERMINADOS DE LA OBRA CIVIL DEL CUARTO DE MAQUINAS Y TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN LA LOCALIDAD DE LA DEMOCRACIA.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TETABIATE; REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA DEMOCRACIA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, EN EL ESTADO DE SONORA.
LOCALIDAD: TETABIATE Y LA DEMOCRACIA
MUNICIPIO: SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA.

REPORTE FOTOGRAFICO

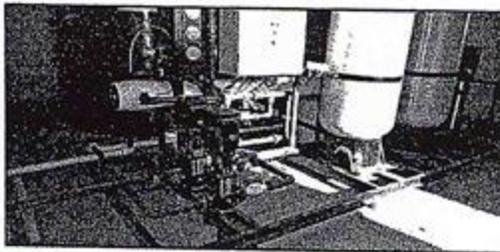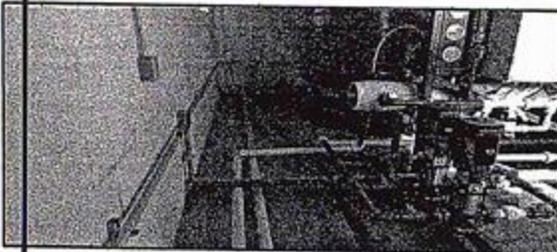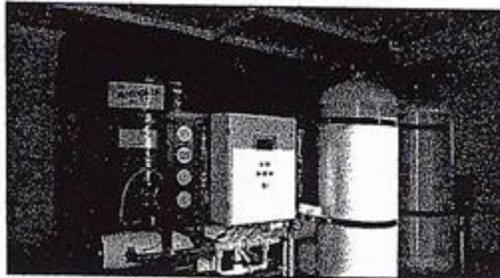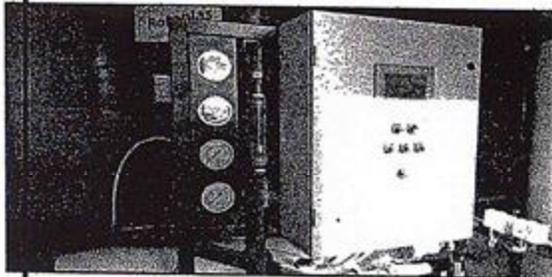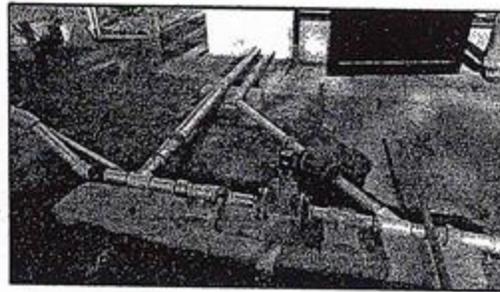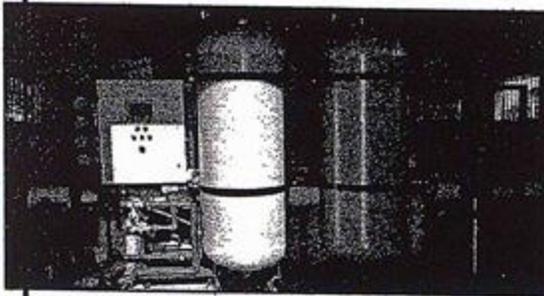

RELATORIA DE FOTOS

FOTOGRAFIAS EN DONDE SE OBSERVA LA INSTALACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y LAS CONEXIONES ADECUADAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN LA LOCALIDAD DE LA DEMOCRACIA.





DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TETABIATE; REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA DEMOCRACIA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, EN EL ESTADO DE SONORA.

LOCALIDAD: TETABIATE Y LA DEMOCRACIA

MUNICIPIO: SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA.

R E P O R T E F O T O G R Á F I C O

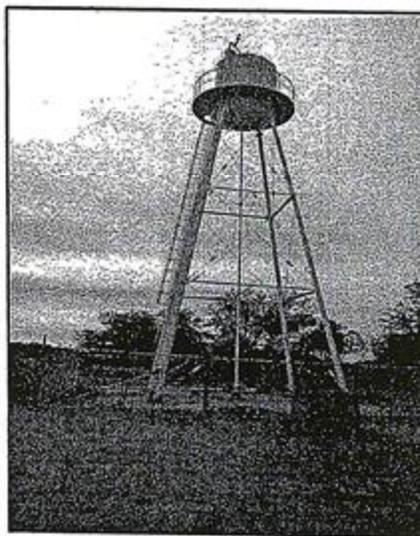
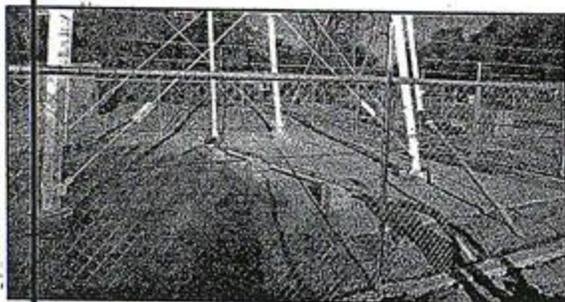


RELATORIA DE FOTOS

FOTOGRAFIAS EN DONDE SE OBSERVAN LOS TRABAJOS TERMINADOS DE CERCO DE PROTECCION DEL TANQUE ELEVADO, ENTRADA Y SALIDA DE CRUCEROS DEL TANQUE, TANQUE METALICO ELEVADO DE 20.0 M3 DE CAPACIDAD Y CAJAS DE CONTROL DE VALVULAS EN LA LOCALIDAD DE EL TETABIATE.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA

OBRA:

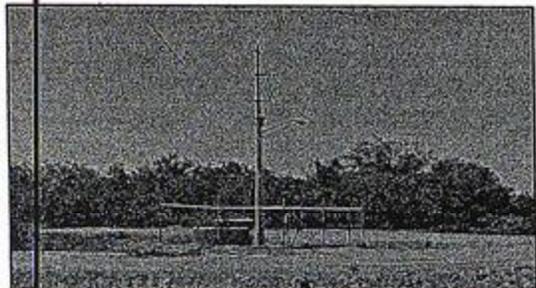REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TETABIATE; REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA DEMOCRACIA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, EN EL ESTADO DE SONORA.LOCALIDAD: **TETABIATE Y LA DEMOCRACIA**MUNICIPIO: **SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA.****R E P O R T E F O T O G R A F I C O****RELATORIA DE FOTOS**

FOTOGRAFÍAS EN DONDE SE APRECIAN LOS TRABAJOS TERMINADOS REFERENTE AL CARCAMO DE BOMBEO (OBRA CIVIL, CRUCEROS DE ENTRADA Y SALIDA, PROTECCION DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA Y ELECTRIFICACION). EN LA LOCALIDAD DE EL TETABIATE.

Bitácora Electrónica de Obra Pública

Organismo: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE SONORA

Área: DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA

Contrato: CEA-PROSSAPYS-IHU-AP-14-014 (14-014)

Obra: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TETABIATE; REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA DEMOCRACIA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, EN EL ESTADO DE SONORA

Lugar: TETABIATE Y LA DEMOCRACIA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA.

No. de nota: 1

Fecha: 2014-09-03 14:28:23.0

Tipo Nota: Apertura

Referencia:

Contratista		Dependencia	
Nombre del Contratista:	CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A. DE C.V.	Nombre:	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA
Domicilio:	CALLE YAÑEZ #34 ESQ. CON TAMAULIPAS COLONIA SAN BENITO	Centro de Trabajo:	COMISION ESTATAL DEL AGUA
Teléfono:	6622140252	Domicilio:	OCAMPO NO. 49 ENTRE JOSE MARIA AVILA Y MICHEL
		Teléfono:	2895700

Datos particulares del contrato

Número del Contrato:	CEA-PROSSAPYS-IHU-AP-14-014	Proyecto:	AGUA POTABLE
	12152203E12K008A1061301A00001.0071		
Partida Presupuestal:	Y		
	12152203E12K008A10610301A00001.0072		
Objeto del contrato:	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TETABIATE; REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA DEMOCRACIA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, EN EL ESTADO DE SONORA		
Plazo:	122 Días naturales.	Fecha de inicio:	01/09/2014
		Fecha de Término:	31/12/2014
Monto:	2,935,735.24 MN		
Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos:	TETABIATE Y LA DEMOCRACIA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA.		
Localización de la residencia de la obra:	TETABIATE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA.		

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente de construcción
Nombre: MENDEZ MENDEZ MARIO
Profesión: INGENIERO CIVIL
Identificación oficial : MEMM450104CM6
Domicilio: SAN BENITO YAÑEZ No. ext.34
Teléfono: 01-662-216-3724
Correo electrónico: mmendez@mendezd.com.mx

Residente
Nombre: TERAN BARCELO JORGE LUIS
Profesión: INGENIERO
Núm. de documento de designación: OFICIO NO. CEA-0278-14
Identificación oficial : 0580023253964
Domicilio: CENTENARIO O CAMPO No. ext.49
Teléfono: 2895700
Correo electrónico: TERANBARCELO@HOTMAIL.COM
Ficha: 365

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)

No. de nota: 2

Fecha: 2014-09-04
20:06:52.0

Tipo Nota: Validacion

Referencia:

Horarios para Asentar Notas

Se podrán asentar notas en el siguiente horario:
00:01 a 23:59 lunes, martes, miercoles, jueves, viernes, sabado, domingo
La bitácora se podrá consultar las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 8 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los número generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Mensual

Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al contrato , establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:
La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)
Firmada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 3

Fecha: 2014-09-04
20:15:38.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

LA OBRA DA INICIO CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CON LIMPIA DEL AREA DE TRABAJO DONDE SE CONSTRUIRA EL TANQUE METALICO ELEVADO DE 20 M3 Y LIMPIA DEL AREA DONDE SE CONSTRUIRA EL CARCAMO DE BOMBEO. LA CONTRATISTA ENTREGA A ESTA SUPERVISION CARTA DE INICIO DE OBRA CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y CARTA DONDE INDICA QUE EL SUPERINTENDENTE DE OBRA POR PARTE DE SU EMPRESA ES EL ING. MARIO MENDEZ MENDEZ .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)
MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)

No. de nota: 4

Fecha: 2014-09-04
20:19:19.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

ESTA SUPERVISION ELABORA CARTA DE LIBERACION DEL INMUEBLE CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014; PARA QUE DEN INICIO LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO. .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)
MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)

No. de nota: 5

Fecha: 2014-09-09
20:55:17.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

DURANTE ESTA SEMANA SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE UBICACION DE CARCAMO, ASI COMO EN LA TRAYECTORIA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA AL TANQUE ELEVADO. ASIMISMO SE INICIO CON LOS TRABAJOS DE TRAZO. SIMULTANEO A ESTOS TRABAJOS ANTERIORES EN SITIO, SE COTIZO LA FABRICACION DEL TANQUE ELEVADO Y SU ESTRUCTURA, MISMOS QUE SE MANDARON FABRICAR CON EL SR. IGNACIO BRISENO, PROVEEDOR DE SERVICIOS DE HERRERIA EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGON.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)
MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)

No. de nota: 6

Fecha: 2014-09-17
20:42:35.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

DADAS LAS LLUVIAS CONSTANTES QUE SE HAN PRESENTADO EN LA LOCALIDAD DE EL TETABIATE Y LA DEMOCRACIA, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS SE HA VISTO AFECTADO, PUESTO QUE SE HAN PRESENTADO LLUVIAS DURANTE TODOS LOS ULTIMOS 8 DIAS, SALVO EL DIA DE HOY. SE TERMINARON TRABAJOS DE LIMPIEZA EN AREA DE CARCAMO, Y SE INICIARON TRABAJOS DE EXCAVACION EN LA TRAYECTORIA DE LA TUBERIA DE PVC DE 3 PULGADAS. A LA FECHA, SE LLEVA UN AVANCE DE 200 MTS LINEALES APROXIMADAMENTE DE EXCAVACION DE ZANJA; ASI COMO 200 MTS DE COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 3 PULGADAS. TAMBIEN SE INICIO LA FABRICACION DEL TANQUE ELEVADO. SE RECIBIO EN SITIO EL TOTAL DE LA TUBERIA DE PVC DE 3 PULGADAS, PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA (PARTIDA H05H DEL CATALOGO), Y DE LA MISMA MANERA LLEGO EL MATERIAL PARA MARCOS Y CONTRAMARCOS PARA REGISTROS. (PARTIDAS H040B, H041B Y H040C DEL CATALOGO).

Archivos Adjuntos:

- la foto 2.JPG
- la foto 4.JPG
- la foto 5.JPG
- la foto 1.JPG

4 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 7

Fecha: 2014-09-25
20:51:05.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

DURANTE LA SEMANA DEL 17 AL 25 DE SEPTIEMBRE, SE REGISTRO MEJOR CLIMA, REGISTRANDO LLUVIAS SOLO EL DIA DE AYER MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE. EL BUEN CLIMA SE VIO REFLEJADO EN EL AVANCE DE LA EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIA. PUESTO QUE SE GENERO UN AVANCE ACTUAL DE EXCAVACION DE ZANJA, COLOCACION DE PLANTILLA Y COLOCACION DE TUBERIA DE 3" DE 1000 ML APROXIMADAMENTE. DESPUES DEL TRAZO DE LA TRAYECTORIA DE LA TUBERIA Y ANTES DE INICIAR CON LA ZANJA, SE HA TENIDO QUE HACER DESPALME CON MEDIOS MECANICOS Y UTILIZAR MAQUINARIA DEBIDO A LA VEGETACION ESPESA Y DE ALTURA QUE HABIA A LO LARGO DE LA TRAYECTORIA DE LA TUBERIA. ATRAS DE LA COLOCACION DE LA TUBERIA EN LA LINEA DE CONDUCCION, SE VIENE RELLENANDO Y COMPACTANDO, Y SE REGISTRA UN AVANCE EN ESTE CONCEPTO DE 400 ML APROX. SIMULTANEAMENTE PARA LA COLOCACION DE LA NUEVA LINEA DE CONDUCCION, SE HAN ESTADO HACIENDO SONDEOS FRECUENTES PARA UBICAR LINEA DE AGUA EXISTENTE (DE 2"), PUESTO QUE PRESENTA BASTANTES IRREGULARIDADES DE TRAZO EN SU TRAYECTORIA. EN TOTAL SE HAN HECHO 8 SONDEOS A LA FECHA. A PESAR DE LOS SONDEOS REALIZADOS, SE TUVO QUE REPARAR UN TRAMO DE TUBERIA DE 2" EXISTENTE..

Archivos Adjuntos:

- image (12).jpeg
- image (13).jpeg
- image (14).jpeg
- image (15).jpeg
- image (16).jpeg
- image (17).jpeg
- image (18).jpeg
- image (12).jpeg
- ...

8 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 8

Fecha: 2014-10-06
14:37:01.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

SE INSTRUYE A LA CONTRATISTA A ENTREGAR A ESTA SUPERVISION DE LOS GENERADORES DE LA PRIMERA ESTIMACION PARA SU RESPECTIVA REVISION Y APROBACION SI ESTA PROCEDE..

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)
Firmada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 9

Fecha: 2014-10-06
14:44:28.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2014 LA CONTRATISTA HACE ENTREGA A ESTA SUPERVISION DE SOLICITUD DE PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATALOGO. SE ANEXAN LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO; ASI COMO TAMBIEN UNA MODIFICACION PARA OPTIMIZAR LA PLANTA POTABILIZADORA YA QUE ESTA PROPUESTA ES MAS FACTIBLE Y MEJORARA SU FUNCIONAMIENTO CON RESPECTO A LA INDICADA EN EL CATALOGO DEL CONTRATO..

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)
Firmada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 10

Fecha: 2014-10-06
14:49:42.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2014 ESTA DIRECCION ENVA MEMORANDUM DIHU-404/14 A LA DIRECCION GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS PARA QUE ANALIZEN Y/O SE APRUEBEN LOS PRECIOS UNITARIOS ENVIADOS POR LA CONTRTISTA..

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)
Firmada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 11

Fecha: 2014-10-09
20:42:03.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

A LA FECHA SE LLEVA UNA INSTALACION DE TUBERIA DE 3 PULGADAS (76 MM) DE 1848 ML, CASI COMPLETANDO EN SU TOTALIDAD LA LINEA DE CONDUCCION DE CARCAMO A TANQUE ELEVADO. DURANTE ESTA INSTALACION, SE HAN HECHO OTRAS 2 REPARACIONES MAS DE LA TUBERIA EXISTENTE, DEBIDO A LA IRREGULARIDAD DE SU TRAYECTORIA, EN EL CASO DEL RELLENO Y COMPACTACION, SE TIENE COMPACTADO UN TOTAL DE 1655 ML DE ZANJA CON TUBERIA COLOCADA. Y SE INICIARA CON LAS PRUEBAS DE TUBERIA. SE TIENE FABRICADAS 4 CAJAS REGISTROS PARA VAEAS. SE HA ESTADO TRABAJANDO EN LA CIMENTACION DEL TANQUE ELEVADO, ENTRE ESOS TRABAJOS SE FINALIZO YA CON LA EXCAVACION PARA ZAPATAS Y TRABES DE LIGA, YA SE ENCUENTRAN HABILITADO TODO EL ACERO DE ESTA CIMENTACION Y YA SE COLARON LAS 4 ZAPATAS AISLADAS, ASI COMO 2 TRABES DE LIGA. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE HERRERIA PARA TANQUE ELEVADO.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (JALTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 12

Fecha: 2014-10-13
14:18:31.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2014 LA CONTRATISTA HACE ENTREGA A ESTA SUPERVISION DE LA PRIMERA ESTIMACION CON UN IMPORTE DE \$322,351.30 SIN IVA. CON FACTURA NO. 39. EN UN PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PRESENTA UNA AVANCE FISICO DEL 15% Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 13%, QUEDANDO UN SALDO DE \$2,208,454.94 SIN IVA. SE REVISARA Y ANALIZARA PARA SU PRONTO PAGO SI ES QUE PROCEDE.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JALTERBAR) (RESIDENTE)
Firmada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (JALTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 13

Fecha: 2014-10-30
15:09:39.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

A LA FECHA SE CUENTA CON UNA INSTALACION CASI EN SU TOTALIDAD DE TUBERIA DE 3 PULGADAS PARA LA LINEA DE CONDUCCION QUE VA DESDE EL CARCAMO HASTA EL TANQUE ELEVADO... QUEDANDO PENDIENTE EL TRAMO DEL CRUCE DE LA CALLE Y DEL CANAL, MISMO EN EL QUE YA SE ESTA PREPARANDO PARA INICIAR CON ESE CRUCE. LA COMPACTACION, TANTO EL RELLENO A VOLTEO DE ESA LINEA DE CONDUCCION SE TIENE COMPLETADA SIMULTANEAMENTE AL TUBO. SE REALIZARON LAS PRUEBAS DE LA TUBERIA EN UNA LONGITUD DE 1780 MTS, ARROJANDO UN RESULTADO SATISFACTORIO. DICHAS PRUEBAS FUERON REALIZADAS EL DIA MARTES 21 DE OCTUBRE INICIANDO CON UNA PRESION EN LA TUBERIA DE 4.5 KG/CM2 DE 8:00 A 10:00 AM, PARA SUBIR A UNA PRESION DE 6.0 KG/CM2 A LAS 10:00 AM Y MANTENERLA EN 6.00 HASTA LAS 4:00 PM, MANTENIENDO UNA PRESION CONSTANTE Y SIN PRESENTAR PERDIDA DE PRESION ALGUNA.

Archivos Adjuntos:

- IMG_4610.JPG
- IMG_4609.JPG

2 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JALTERBAR) (RESIDENTE)
MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)

No. de nota: 14

Fecha: 2014-10-30
15:40:25.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA ESTRUCTURA DEL TANQUE ELEVADO EN SITIO, ASI COMO EL MISMO TANQUE YA LISTO EN SU TOTALIDAD. SE TRABAJA EN EL HABILITADO DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAR Y SUBIR EL TANQUE CUANDO SE TERMINE DE ARMAR LA ESTRUCTURA EN SITIO. SIMULTANEAMENTE SE TRABAJA EN LOS ULTIMOS TRABAJOS DE CIMENTACION DEL TANQUE, COLANDO LOS DADOS DE CONCRETO... TENIENDO YA LISTAS EN SU TOTALIDAD LAS ZAPATAS Y TRABES DE LIGA.

Archivos Adjuntos:

- image (30).jpeg
- image (40).jpeg
- image (41).jpeg

3 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JALTERBAR) (RESIDENTE)
MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)

No. de nota: 15

Fecha: 2014-10-30
17:56:49.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

EN LA DEMOCRACIA SE AVANZO CON LA CIMENTACION DEL CUARTO DE MAQUINAS. SE LIMPIO Y SE REALIZO EL TRAZO CORRESPONDIENTE DE LOS MUROS DEL CUARTO DE MAQUINAS. DE LA MISMA MANERA SE INICIO Y TERMINARON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE LA ZAPATA CORRIDA DE LA CIMENTACION. SE TRABAJA EN EL ARMADO Y HABILITADO DE LA ZAPATA CORRIDA PARA PROCEDER A COLAR. SE CONTRATO LA TECHUMBRE DE LA EDIFICACION AL CONTRATISTA DE HERRERIA, IGNACIO BRISENO, DE ESTA MANERA TERMINANDO MUROS SE PROCEDERA A LA COLOCACION DE LA CUBIERTA.

Archivos Adjuntos:

- image (25).jpeg
- image (26).jpeg

2 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (JALTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 16

Fecha: 2014-10-30
18:05:56.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

SE TERMINARON LAS CAJAS REGISTROS DE VALVULAS A LO LARGO DE LA LINEA DE CONDUCCION QUE VA DEL CARCAMO AL TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DEL TETABATE. ACTUALMENTE SE TRABAJA EN LOS MARCOS Y CONTRAMARCOS DE LAS TAPAS PARA LAS CAJAS REGISTRO.

Archivos Adjuntos:

- image (19).jpeg
- image (24).jpeg

2 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 17**Fecha:** 2014-11-05
12:48:40.0**Tipo Nota:** Nota Libre**Referencia:**

SE INSTRUYE A LA CONTRATISTA DE HACER LA ENTREGA DE LOS GENERADORES DE LA SEGUNDA ESTIMACION PARA REVISION, ANALISIS Y EL PAGO CORRESPONDIENTE SI PROCEDE. YA QUE AL DEJAR PASAR MAS TIEMPO NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LOS GASTOS DE INDIRECTOS QUE ESTO PUDIERA GENERAR AL NO COBRAR A TIEMPO DICHA ESTIMACION.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)

No. de nota: 18**Fecha:** 2014-11-06
11:28:59.0**Tipo Nota:** Nota Libre**Referencia:**

AL 31 DE OCTUBRE SE TUVO UN AVANCE DE 673 MTS LINEALES DE COLOCACION DE TUBERIA PVC SISTEMA INGLES-PARA AGUA POTABLE DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, RD 41; DICHA TUBERIA FUE COLOCADA EN LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION EN EL POBLADO DE TETABIATE. Y SE REALIZARON SUS DEBIDAS CONEXIONES A LA RED EXISTENTE COLOCANDO LAS PIEZAS ESPECIALES. ACTUALMENTE SE CUENTA CON UNA COMPACTACION CON MEDIOS MECANICOS DE LA TUBERIA DE LOS MISMO 673 MTS, EQUIVALENTES A 121.14 M3 COMPACTADOS. A LA FECHA SE TRABAJA EN EL RELLENO A VOLTEO..

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 19**Fecha:** 2014-11-06
11:35:35.0**Tipo Nota:** Nota Libre**Referencia:**

EL DIA DE AYER 05 DE NOVIEMBRE SE PRESENTO LLUVIA EN EL POBLADO LA DEMOCRACIA. POR LO QUE ATRASO LOS TRABAJOS DE CIMENTACION DEL CUARTO DE MAQUINAS UNA TARDE. AUN ASI SE ALCANZO A COLAR PLANTILLA DE LA CIMENTACION Y PREPARAR EL ACERO PARA LA ZAPATA CORRIDA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 20**Fecha:** 2014-11-11
08:35:43.0**Tipo Nota:** Nota Libre**Referencia:**

CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014 LA CONTRATISTA HACE ENTREGA A ESTA SUPERVISION DE LA SEGUNDA ESTIMACION PARA SU REVISION, ANALISIS Y PRONTO PAGO SI ESTA PROCEDE. ESTA ESTIMACION TIENE UN PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2014. .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)

No. de nota: 21**Fecha:** 2014-11-25
08:58:39.0**Tipo Nota:** Nota Libre**Referencia:**

CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 LA CONTRATISTA TERMINO LAS 6.0 CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS E INSTALO LAS 6.0 VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE Y LAS CAJAS YA TIENEN LOS MARCOS, CONTRAMARCOS Y TAPAS DE FO.FO; ESTO REFERENTE A LA LINEA-DE CONDUCCION DEL CARCAMO DE BOMBEO AL TANQUE ELEVADO DE 20.0 M3 DE CAPACIDAD. YA SE ESTA CONSTRUYENDO LA ESTRUCTURA PARA EL DESPLANTE DEL CARCAMO DE BOMBEO. EN LO QUE CONCIERNE A LA ELECTRIFICACION DEL CARCAMO NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS. EL TANQUE ELEVADO DE 20.0 M3 YA ESTA ARMADO Y SE VAN A INICIAR LOS TRABAJOS DE SANBLASTEADO Y PINTADO EXTERIOR E INTERIOR. YA ESTAN TERMINADAS LAS BASES DE LA CIMENTACION DONDE VA A IR EL TANQUE. CON RESPECTO A LAS AMPLIACIONES DE LA RED INTERNA DEL TETABIATE YA ESTA LA TUBERIA DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO YA INSTALADA AL 100% ESTAMOS ESPERANDO QUE EL DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR ING. VIRGILIO CABRERA LAGARDA NOS PROPORCIONE LA LISTA DE LOS BENEFICIADOS PARA PODER INICIAR CON LA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS. EN LA DEMOCRACIA YA SE HABILITO CON ACERO LOS CASTILLOS Y CIMENTACIONES Y SE ESTA INICIANDO A CIMBRAR PARA PODER COLAR CON CONCRETO LAS ESTRUCTURAS REFERENTE A LA OBRA CIVIL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SE INSTRUYO A LA CONTRATISTA DE COLOCAR MATERIAL DE RELLENO EN LAS AREAS DE LAS 6.0 CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS YA QUE SE ENCUENTRAN SIN RELLENAR.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)

No. de nota: 22**Fecha:** 2014-12-05
12:18:34.0**Tipo Nota:** Nota Libre**Referencia:**

SE INSTRUYE A LA CONTRATISTA DE ENTREGAR A ESTA SUPERVISION DE LOS GENERADORES REFERENTE A LA ESTIMACION TRES DE LA OBRA DEL TETABIATE Y LA DEMOCRACIA DEL PERIODO 01 NOVIEMBRE DE 2014 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA SU ANALISIS, REVISION Y PRONTO PAGO; YA QUE AL DEJAR PASAR MAS TIEMPO NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LOS GASTOS DE INDIRECTOS QUE ESTO PUDIERA GENERAR AL NO COBRAR A TIEMPO DICHA ESTIMACION.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)
MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)

No. de nota: 23

Fecha: 2014-12-05
12:22:20.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON REFERENCIA A LA NOTA 9 SOBRE LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA CONTRATISTA ASERCA DE QUE SE AUTORIZEN PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATALOGO DE OBRA Y LA NOTA 10 EN REFERENCIA A MEMORANDUM DIHU-404/14 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2014 QUE SE LE ENVIA A LA DIRECCIÓN DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS PARA QUE SE ANALIZEN Y SE APRUEBEN DICHS PRECIOS UNITARIOS; HAGO MENCION EN ESTA NOTA QUE SE CANCELA DICHA SOLICITUD Y EL MEMORANDUM EN MENCION YA QUE LA CONTRATISTA ELABORA NUEVA SOLICITUD PARA QUE SE ANALICEN PRECIOS UNITARIOS PARA SU ANALISIS Y APROBACIÓN CON FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2014 Y SE REALIZA UN NUEVO MEMORANDUM DIHU-454/14 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2014; EL CUAL ES ENVIADO A LA DIRECCIÓN DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS PARA SU ANALISIS Y APROBACION.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)
MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)

No. de nota: 24

Fecha: 2014-12-05
19:06:34.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

EL PASADO FIN DE SEMANA CON FECHA DE SABADO 29 Y DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE SE LLEVO A CABO LA ERECCION DEL TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD DEL TETABIATE EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO. ANTERIORMENTE YA SE HABIA TRABAJADO EN EL FONDO, PINTURA Y SANBLASTE0 DEL MISMO TANQUE EN CUESTION. POR LO QUE EL TANQUE SE MONTO CON LA AYUDA DE UNA GRUA YA ESTANDO COMPLETAMENTE TERMINADO Y LISTO EN SU TOTALIDAD, INCLUYENDO TANQUE, ESTRUCTURA Y PINTURA.

Archivos Adjuntos:

- image (20).jpeg
- image (21).jpeg
- image (22).jpeg
- image (23).jpeg
- image (24).jpeg

5 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 25

Fecha: 2014-12-05
19:09:32.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

EN LA DEMOCRACIA SE TRABAJA EN EL TERMINADO DEL CUARTO DE MAQUINAS, COLOCANDO BLOCK, COLADO DE CASTILLOS Y CADENAS DE CERRAMIENTO. SE ADJUNTAN IMAGENES DE AVANCE..

Archivos Adjuntos:

- image (25).jpeg
- image (26).jpeg
- image (27).jpeg
- image (28).jpeg

4 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 26

Fecha: 2014-12-15
10:57:06.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2014 LA CONTRATISTA HACE ENTREGA A ESTA SUPERVISION DE GENERADORES DE OBRA CORRESPONDIENTES A LA TERCERA ESTIMACION LA CUAL TIENE UN PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA SU ANALISIS, APROBACION Y PRONTO PAGO SI ESTA PROCEDE. ESTA SUPERVISION LE RECUERDA A LA CONTRATISTA DE QUE ESTA DEPENDENCIA NO SE HACE RESPONSABLE SI LAS ESTIMACIONES NO LAS REALIZAN CON EL TIEMPO ESTIPULADO LO CUAL AL NO ELABORAR LAS ESTIMACIONES A TIEMPO ESTAS PUEDEN GENERAR GASTOS DE INDIRECTOS LOS CUALES REPERCUTEN A LA EMPRESA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)
MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)

No. de nota: 27

Fecha: 2014-12-18
19:38:09.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

AL DIA DE HOY SE CUENTA CON UN AVANCE CASI EN SU TOTALIDAD DE LA OBRA CIVIL DEL CUARTO DE MAQUINAS DE LA DEMOCRACIA, YA QUE SE TERMINO CON TRABAJOS DE CIMENTACION, CADENAS DE DESPLANTE, MUROS DE BLOCK, CASTILLOS, CADENAS DE CERRAMIENTO. QUEDANDO PENDIENTE LOS TRABAJOS DE HERRERIA, REFERENTES A LA CUBIERTA DE POLINERIA Y LAMINA, ASI COMO LAS PUERTAS Y VENTANAS. LOS TRABAJOS DE HERRERIA DE LA DEMOCRACIA YA SE ENCUENTRAN CONTRATADOS Y AVANZADOS, PUESTO QUE YA SE ENTREGO ANTICIPO DE ELLOS Y SE PROGRAMO LA INSTALACION DE LOS MISMOS PARA FINAL DE ESTA SEMANA Y PRINCIPIOS DE LA PROXIMA. ESTOS TRABAJOS LOS ESTA REALIZANDO EL CONTRATISTA DE HERRERIA, EL SR. IGNACIO BRICENO, MISMO QUE FABRICO EL TANQUE ELEVADO. POR OTRO LADO, EL DIA DE HOY SE NOS HIZO ENTREGA DE LA AUTORIZACION DE ALGUNOS PRECIOS UNITARIOS FUERA DE PRESUPUESTO, ASI COMO LA ESPECIFICACION DE COLORES DE LA CASA DE MAQUINAS, QUEDANDO COLOR BLANCO PARA MUROS Y NEGRO PARA PUERTAS Y VENTANAS.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 28

Fecha: 2014-12-19
12:45:53.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

EN EL TETABIATE, SE CUENTA CON UN AVANCE EN SU TOTALIDAD DE LA LINEA DE CONDUCCION Y VAEAS, ASI COMO LA FABRICACION Y ERECCION DEL TANQUE ELEVADO Y SU HERRERIA Y ESTRUCTURA. ACABADOS TERMINADOS (LIMPIEZA, SANDBLASTEO Y PINTURA). ASIMISMO, SE ENCUENTRA COMPLETADA LA INSTALACION DEL CARCAMO. DURANTE ESTA SEMANA, SE INSTALARON VALVULAS NUEVAS, REFERENTES AL DESFOGUE Y SALIDA DE AGUA DEL TANQUE ELEVADO, Y ACTUALMENTE SE TRABAJA EN ARREGLOS PARA EL CRUCE DEL CANAL.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
MARIO MENDEZ MENDEZ (MARIORIOMUERTO) (CONTRATISTA)

No. de nota: 29

Fecha: 2015-05-13
21:40:10.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 22-DIC.-2014 LA CONTRATISTA RECIBIO EL LISTADO DE LOS 28.0 BENEFICIARIOS EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2014 POR PARTE DE ORGANISMO OPERADOR DE SAN IGNACIO RIO MUERTO; POR LO CUAL YA SE INSTALARON LAS 28.0 TOMAS DOMICILIARIAS. SE INSTRUYE A LA CONTRATISTA DE INSTALAR ATRAQUES DE CONCRETO A LAS TOMAS PARA QUE ESTA QUEDE FIJA. SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE LA OBRA CIVIL DEL CARCAMO DE BOMBEO Y SE ESTA INICIANDO CON LA INSTALACION DEL CRUCERO DE ENTRADA Y SALIDA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 30

Fecha: 2015-05-13
21:42:46.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 24- DIC.-2014 LA CONTRATISTA YA REALIZO EL CRUCE DEL CANAL SECUNDARIO CON TUBERIA DE FO.GO. Y LA TOTALIDAD DE LA TUBERIA INSTALADA DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL CARCAMO A LA ORILLA DE LA CARRETERA PAVIMENTADA VICAM-SAN IGNACIO RIO MUERTO FUE DE 1,856.0 M.L. DE TUBERIA HIDRAULICA DE 3 DE DIAMETRO. YA ESTAN CONSTRUIDAS LAS DOS CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS E INSTALADAS LAS VALVULAS DE COMPUERTA DE 3 DE DIAMETRO A UN COSTADO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA. LA CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS DE ELECTRIFICACION DE CARCAMO DE BOMBEO Y PROTECCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CARCAMO.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 31

Fecha: 2015-05-13
21:45:17.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 26.- DIC.-2014 LA CONTRATISTA SIGUE CON LOS TRABAJOS DE ELECTRIFICACION DEL CARCAMO, YA SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE LA INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL DEL CARCAMO. SE LE INFORMA AL DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR ASI COMO TAMBIEN AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN IGNACIO RIO MUERTO DE QUE TIENEN QUE REALIZAR LA CONTRATACION DE LA ENERGIA ELECTRICA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE EL CONTRATO SALGA A NOMBRE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO. EN LA DEMOCRACIA SE INICIA CON LA INSTALACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA YA SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE LA TECHUMBRE DE LA CASETA, LA PINTURA EXTERIOR E INTERIOR Y LAS CONEXIONES EXTERIORES DE LA TUBERIA DEL POZO A LA PLANTA POTABILIZADORA Y TANQUE ELEVADO. SE INSTRUYE A LA CONTRATISTA DE COLOCAR APOYOS DE CONCRETO EN LA TUBERIA PARA QUE ESTE QUEDE FIJO.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 32

Fecha: 2015-05-13
21:49:55.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 27.- DIC.- 2014 LA CONTRATISTA YA TERMINO LOS TRABAJOS DE ELECTRIFICACION ELECTRICA DEL CARCAMO DE BOMBEO QUEDANDO PENDIENTE QUE EL H. AYUNTAMIENTO CONTRATE LA ENERGIA ELECTRICA POR LO PRONTO EL SISTEMA EXISTENTE SIGUE TRABAJANDO YA QUE NOS INDICARON QUE NO SUSPENDIERAMOS EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE EL TETABIATE POR PARTE DEL ORGANISMO OPERADOR DE SAN IGNACIO RIO MUERTO. LA CONTRATISTA INICIA CON LA INSTALACION DEL CERCO DE PROTECCION AL TANQUE ELEVADO. EN LA DEMOCRACIA SE SIGUE CON LA INSTALACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA. LA CAJA DE OPERACION DE VALVULAS Y LA INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3 QUE ESTA UBICADA ENFRENTA DE LA ENTRADA DEL CARCAMO YA QUEDO CONCLUIDA Y TAMBIEN LOS TRABAJOS DEL CRUCERO DE ENTRADA Y SALIDA DEL CARCAMO Y LA INSTALACION DE TANQUE ESTACIONARIO DE 10.0 M3 ASI COMO TAMBIEN EL EQUIPAMIENTO DEL MISMO.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 33

Fecha: 2015-05-14
12:10:32.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 29.-DIC.-2014 SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE LA PROTECCION DE CERCO PERIMETRAL DEL TANQUE ELEVADO. EL CONTRATO ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AUN NO SE HAN HECHO LOS TRAMITES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO. SE INSTRUYE A LA CONTRATISTA DE REALIZAR LIMPIEZA EN LAS AREAS DE TRABAJO. EN LA DEMOCRACIA YA CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE LA INSTALACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y TODAS LAS CONEXIONES NECESARIAS. LA CONTRATISTA INFORMA A ESTA SUPERVISION QUE LA ENERGIA REQUERIDA PARA QUE FUNCIONE DICHA PLANTA TIENE QUE SER TRIFASICA Y LA QUE SE TIENE EXISTENTE ES MONOFASICA POR LO QUE NO SE PODRAN HACER LAS PRUEBAS. CABE HACER NOTAR QUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE ESTE CONTRATO NO VIENE LA ELECTRIFICACION TRIFASICA PARA ESTA PLANTA POTABILIZADORA. SE INSTRUYE A LA CONTRATISTA PARA QUE SE RENTE UNA PLANTA ELECTRICA PARA REALIZAR LAS PRUEBAS. SE LE INFORMA AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE SAN IGNACIO RIO MUERTO DE QUE SE REALIZARAN DICHAS PRUEBAS A LA PLANTA POR LO QUE DEBERA MANDAR A CUANDO MENOS 3.0 PERSONAS PARA CAPACITARLAS Y ENSEÑARLES EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA; POR LO QUE DEBERA PROGRAMARSE Y AVISAR A ESTA SUPERVISION O A LA CONTRATISTA. ASI MISMO SE LES INFORMA DE LA NECESIDAD DE REALIZAR LA INSTALACION ELECTRICA TRIFASICA POR PARTE DE DICHO H. AYUNTAMIENTO PARA QUE LA PLANTA POTABILIZADORA FUNCIONE SIN NINGUN PROBLEMA Y SOLUCIONE LA PROBLEMÁTICA PARA ESTA COMUNIDAD DE LA DEMOCRACIA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)

Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 34

Fecha: 2015-05-14
12:12:03.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

30.- DIC.-2014 LA CONTRATISTA YA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS REFERENTE A LA OBRA DE LA COMUNIDAD DE EL TETABIATE; QUEDANDO PENDIENTE QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO REALICE EL CONTRATO ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA PODER QUE ESTE SISTEMA FUNCIONE. EN LA COMUNIDAD DE LA DEMOCRACIA YA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS REFERENTE A ESTE CONTRATO. QUEDANDO PENDIENTE QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO HAGA LA INSTALACION ELECTRICA TRIFASICA Y EL CONTRATO DE LA ENERGIA ELECTRICA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA PODER QUE LA PLANTA POTABILIZADORA FUNCIONE. SE LE COMUNICAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR QUE LA PLANTA SE VOLVERA A PROBAR Y CON EL PERSONAL ASIGNADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO SE CAPACITARA PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA UNA VEZ QUE ESE H. AYUNTAMIENTO REALICE EL CONTRATO RESPECTIVO PARA LA CONEXION Y OPERACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA. SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA DE ENTREGAR A ESTA SUPERVISION LA CUARTA ESTIMACION CON GENERADORES Y REPORTE FOTOGRAFICO PARA SU REVISION, ANALISIS Y PRONTO PAGO SI ESTA PROCEDE. LA CONTRATISTA HACE ENTREGA A ESTA SUPERVISION DE CARTA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS REFERENTE A ESTE CONTRATO CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2014.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)

Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 35

Fecha: 2015-05-14
12:26:21.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

SE INSTRUYE A LA CONTRATISTA DE ENTREGAR A ESTA SUPERVISION DE LOS GENERADORES REFERENTE A LA ESTIMACION DE LA OBRA DEL TETABIATE Y LA DEMOCRACIA DEL PERIODO 01 NOVIEMBRE DE 2014 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA SU ANALISIS, REVISION Y PRONTO PAGO; YA QUE AL DEJAR PASAR MAS TIEMPO NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LOS GASTOS DE INDIRECTOS QUE ESTO PUDIERA GENERAR AL NO COBRAR A TIEMPO DICHA ESTIMACION. ...

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)

Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 36

Fecha: 2015-05-14
12:32:24.0

Tipo Nota: Nota de cierre de la bitácora sin notificación de la contratista de la terminación de los trabajos

Referencia:

Con fecha 14/01/2015 se dan por terminados los trabajos de la obra y/o servicios que amparan la presente bitácora, los cuales fueron terminados el día 30/12/2014, verificados el día 31/12/2014 y recepcionados físicamente el día 14/01/2015, conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Esta bitácora se cierra unilateralmente ya que LA CONTRATISTA HACE ENTREGA DE CARTA DE TERMINACION DE LA OBRA CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2014 Y COMUNICA A ESTA SUPERVISION QUE LA ESTIMACION 4 DE CIERRE LA ELABORARA CON UN PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)

Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (ALTERBAR) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, Inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.



POLIZA DE FIANZA

FECHA DE EXPEDICION 30/01/2015	NUMERO DE FIANZA 88243031 00000 0000	MONTO DE FIANZA 253,080.62	MONTO DEL MOVIMIENTO 253,080.62	314 BUENA CALIDAD OBRA
-----------------------------------	---	-------------------------------	------------------------------------	------------------------

CHUBB DE MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA S.A DE C.V, EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE LE OTORGO EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA S.H.C.P. EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 5 Y 6 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS SE CONSTITUYE COMO FIADOR HASTA POR LA SUMA DE:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS 62/100 MN

CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA POLIZA

ANTE: LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA

PARA GARANTIZAR POR: CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO EN YAÑEZ NO. 34, COLONIA SAN BENITO, HERMOSILLO, SONORA. C.P. 83190., EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO QUE CELEBRA POR UNA PARTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y LA OTRA PARTE LA CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A. DE C.V. NO. CEA-PROSSAPYS-IHU-AP-14-014, DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2014, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$2,530,806.20 (DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 20/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, RELATIVO A: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TETABATE; REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA DEMOCRACIA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, EN EL ESTADO DE SONORA. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y OBRAS FINANCIADAS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA 35.1 DE LAS I.A.O. (INFORMACION AL OFERENTE) Y A LA CLAUSULA 52.1 DE LAS C.G.C (CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO), ASI MISMO SE OTORGA BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS: A) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO; B) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA; C) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA; D) QUE LA FIANZA ESTARA EN VIGOR POR 12 (DOCE) MESES MAS A PARTIR DE LA TERMINACION, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION Y HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES, ASI COMO DURANTE LA SUSBTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; E) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA; F) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA, ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 95, 95 BIS, 118 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR Y EN EL REGLAMENTO DEL ARTICULO 95 DE LA CITADA LEY; G) QUE LA AFIANZADORA PODRA MEDIANTE OFICIO QUE PROPORCIONE EL BENEFICIARIO, EJERCER LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN LOS ARTICULOS 97 Y 98 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. LA AFIANZADORA NO DISFRUTARA DE LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCLUSION A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 2814 Y 2815 DEL CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ESTA POLIZA REPRESENTA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES QUE SE CONTIENEN EN EL TITULO TERCERO CAPITULO CUARTO Y EN EL TITULO CUARTO DE LA PROPIA LEY, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA FIANZA REQUERIDA Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. FIN DE TEXTO.

ESTA PÓLIZA DE FIANZAS SE EXPIDE AL AMPARO DEL CONTRATO DE AFIANZAMIENTO MÚLTIPLE 000005831500001.

Sello Digital:

bygEwwjip/7Tt7qrIFsCRc56b00wUYKcJUCmfcysdHNqmcZvheugiNLPHPx1R1w+nUg7rBwvB5CF1qdLhLNgA3kVU
U1je2tisvemRKS63H7ZgidwsZP59wx+mT05TgplTL00TMR2KstjaH7RRUGnt1OmN4jgr1hsz14Sa9qw=

LINEA DE VALIDACION: 0388 2430 3100 0053 7589 1

Para validar este documento en nuestra página: <https://extpwa27a.chubb.com/consultefianza/>

De conformidad con lo establecido dentro del artículo 86 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, la afianzadora podrá utilizar medios electrónicos para pactar operaciones y prestación de servicios de la misma y el uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismo efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Representante Autorizado de la Compañía

DIANA JAVERIA INZUNZA GIL

Autorizado por la CNSF mediante oficio No. 06-367-II-1.3/01577 de fecha 15 de Febrero de 2012

ESTA POLIZA DE FIANZA ES UNA IMPRESION DE UN DOCUMENTO DIGITAL ENTREGADO DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS DENTRO DEL CODIGO DE COMERCIO EN MATERIA DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ACTA DE ENTREGA
CEA-PROSSAPYS-IHU-AP-14-014



PROGRAMA PROSSAPYS

SUB-PROGRAMA Agua Potable

Acta de entrega - recepción de: Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de El Tetabiate; Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en La Localidad de La Democracia, en Los Municipios de San Ignacio Río Muerto, Sonora.

Fecha Acta: 30 de enero de 2015 **Hora:** 11:00

Localidad: El Tetabiate y La Democracia **Municipio:** San Ignacio Río Muerto

Estado: Sonora

1. Servicio y tipo de obra realizada:

Obra	Tipo de Obra				
	Estudio	Proyecto	Rehabilitación	Construcción	Ampliación
Agua Potable			X		

5. Nombre de la Dependencia Ejecutora: Comisión Estatal del Agua

6. Inversión:

	Total	Federal	Estatad	Municipio
Ejercida	2,935,735.24	2,055,014.67	880,720.57	0.00

7. Descripción breve y clara de la obra realizada por tipo de servicio

Bienes: Agua Potable

Descripción general de los bienes: Tetabiate: Línea de Conducción de 1,800.0 m.l. de tubería hidráulica RD-41 de 3" de diámetro, instalación de 7.0 válvulas de admisión y expulsión de aire y de 2" de diámetro, instalación de 7.0 válvulas de esfera de 2" de diámetro, construcción de 6.0 cajas T-2 de 1.0 x 0.90 m., instalación de 6.0 marcos con tapa, cruce de canal secundario, interconexión a Tanque elevado de 20.0 m3, instalación de Tanque Metálico Elevado de 20.0 m3 de capacidad con cerco de protección, Crucero de Tanque Elevado, Estación de Bombeo con cerco de protección, Crucero de Carcamo, Interconexión a Carcamo, Equipamiento y Electrificación de Carcamo. Ampliación de tubería hidráulica de 3" de diámetro RD-41 con 667.12 m.l. y 28.0 Tomas Domiciliarias. La Democracia: Construcción de Potabilizadora con Planta Tratadora.

Se hace constar que la Comisión Estatal del Agua le hace entrega al H. Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto la obra para su operación y mantenimiento en lo subsecuente, así como los planos correspondientes a la construcción final, las Normas y Especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, los Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

9. Nombre de las localidades y municipios que se beneficiaron con las obras:


El Tetabiate y La Democracia, Municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora.

10. Nombre de la dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra:

Federal () Estatal () Municipal (X)

OOMAPASSIRM

11. Fecha de entrega-recepción de los bienes: 30 de enero de 2015





**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ACTA DE ENTREGA
CEA-PROSSAPYS-IHÚ-AP-14-014**



PROGRAMA	<u>PROSSAPYS</u>
SUB-PROGRAMA	<u>Agua Potable</u>
<u>Acta de entrega - recepción de:</u>	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de El Totablate; Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en La Localidad de La Democracia; en Los Municipios de San Ignacio Río Muerto; Sonora.

Entrega:

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

VOCAL EJECUTIVO DE LA CEA

C. LIC. RENE FRANCISCO LUNA SUGICH

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
URBANA

M.C. LUIS HERMAN VALENZUELA SALAS

Recibe:

POR EL H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, MPIO. DE

ING. PEDRO FLORES MORENO

**MUNICIPIO DE
SAN IGNACIO, RIO MTO. SON**

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, MPIO. DE S.I.R.M.,
SONORA

OPERADOR MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
SAN IGNACIO RIO MUERTO
OOMAPASSIRM
