



CONSTRUCCIONES VALBAR, S.A. DE C.V.

13. 6 PZAS DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 MTS. CON CANAL DE 102 MM (4")
14. 6 PZAS DE JUNTA GIBault COMPLETA DE 152 MM (6") DE DIAMETRO.
15. 1 PZA DE VALVULA DE NO RETORNO (CHECK), DE 152 MM (6") DE DIAMETRO

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES.

DAF-407-15
7

ATENTAMENTE

ING. GUILLERMO WAHNNATAH VERA
APODERADO ESPECIAL

Bitácora Electrónica de Obra Pública

Organismo: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE SONORA

Área: DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
URBANA

Contrato: CEA-PROSSAPYS-IHU-AP-14-016 (14-016)

Obra: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA
DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD
DE BAVIACORA, MUNICIPIO DE BAVIACORA, EN EL ESTADO
DE SONORA

Lugar: BAVIACORA SONORA

No. de nota: 1

Tipo Nota: Apertura

Referencia:

Fecha: 2014-10-07 15:04:10.0

Contratista	Dependencia
Nombre del Contratista: CONSTRUCCIONES VALBAR S.A. DE C.V.	Nombre: DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA
Domicilio: OTERO Y OBREGON S/N, , CENTRO, Teléfono: 016424224682	Centro de Trabajo: COMISION ESTATAL DEL AGUA Domicilio: OCAMPO 49 Teléfono: 2895700

Datos particulares del contrato

Número del Contrato: CEA-PROSSAPYS-IHU-AP-14-016	Proyecto: AGUA POTABLE
Partida Presupuestal: 1215 2203 E12 K008 A05 61303 A0 0001.0074	
Objeto del contrato: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAVIACORA, MUNICIPIO DE BAVIACORA, EN EL ESTADO DE SONORA	
Plazo: 122 Días naturales.	Fecha de inicio: 01/09/2014
Monto: 1,927,977.74 MN	Fecha de Término: 31/12/2014
Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos: BAVIACORA SONORA	

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente de construcción
Nombre: WAHNNATAH VERA GUILLERMO
Profesión: INGENIERO CIVIL
Núm. de documento de designación: IFE
Identificación oficial : 1255023429888
Domicilio: JUAREZ RINCON No. Int.N/A
Teléfono: 6424224662
Correo electrónico: guillermn@msn.com

Residente
Nombre: CHAVEZ TORRES MANUEL HIRAM
Profesión: INGENIERO CIVIL
Núm. de documento de designación: IFE
Identificación oficial : 0532063383336
Domicilio: CENTENARIO OCAMPO No. ext.49
Teléfono: (662)2895700
Correo electrónico: hiram.chavez@ceasonora.gob.mx
Ficha: 213

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

Firmada por:

GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)
MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

No. de nota: 2

Tipo Nota: Validacion

Referencia:

Fecha 2014-10-07 15:10:03.0

Horarios para Asentar Notas

Se podran asentar notas en el siguiente horario:
00:01 a 23:59 lunes, martes, miercoles, jueves,viernes, sabado, domingo
La bitácora se podra consultar las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas:3 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los número generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Mensual

Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al PLAZO , establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:
La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)
Firmada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)
MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

No. de nota: 3

Fecha: 2014-10-07
20:33:07.0

Tipo Nota: Recepción del inmueble por parte del contratista para inicio de la obra Referencia:

EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SE INICIO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. CEA-PROSSAPYS-IHU-AP-14-016 RELATIVOS A CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE BAVIACORA, MPIO.BAVIACORA, SONORA PONIENDO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA A DISPOSICION DE LA EMPRESA EL INMUEBLE DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)
Firmada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)
MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

No. de nota: 4

Fecha: 2014-10-07
20:39:34.0

Tipo Nota: Nota Libre Referencia:

08 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEBIDO A LA CONTINGENCIA PROVOCADA POR EL DERRAME DE QUIMICOS EN EL RIO SONORA POR PARTE DE LA MINERAS DEL GRUPO MEXICO SE RETRASA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA RESPECTIVA HASTA NUEVO AVISO YA QUE EL POZO DE DONDE SE IBAN A INICIAR LOS TRABAJOS HA SIDO SUSPENDIDO SU USO HASTA QUE LAS AUTORIDADES FEDERALES INDIQUEN OTRA COSA

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)
Firmada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)
MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

No. de nota: 5

Fecha: 2014-10-07
20:44:53.0

Tipo Nota: Nota Libre Referencia:

22 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE SIGUE EN ESPERA DE INICIO DE OBRA, SE INICIARON TRABAJOS DE LOCALIZACION Y PERFORACION POR OTRA EMPRESA PARA CONECTARSE AL NUEVO POZO Y PODER ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD, ESTAN POR LLEGAR LOS MATERIALES QUE SE SOLICITARON PARA EL INICIO DE LA OBRA.

No tiene ningún archivo adjunto


Nota Creada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)
Firmada por: GUILLERMO WAHNNATAH VERA (CONSRSC3) (CONTRATISTA)
MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA



NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE BAVIACORA, MPIO.BAVIACORA, SONORA.
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES VALBAR S.A. DE C.V.
NUMERO DE CONTRATO: CEA-PROSSAPYS-IHU-AP-14-016
FECHA DE INICIO: 01/09/2014
FECHA DE TERMINO: 31/12/2014
MONTO DEL CONTRATO: \$1,662,049.78
LOCALIDAD: BAVIACORA
MUNICIPIO: BAVIACORA

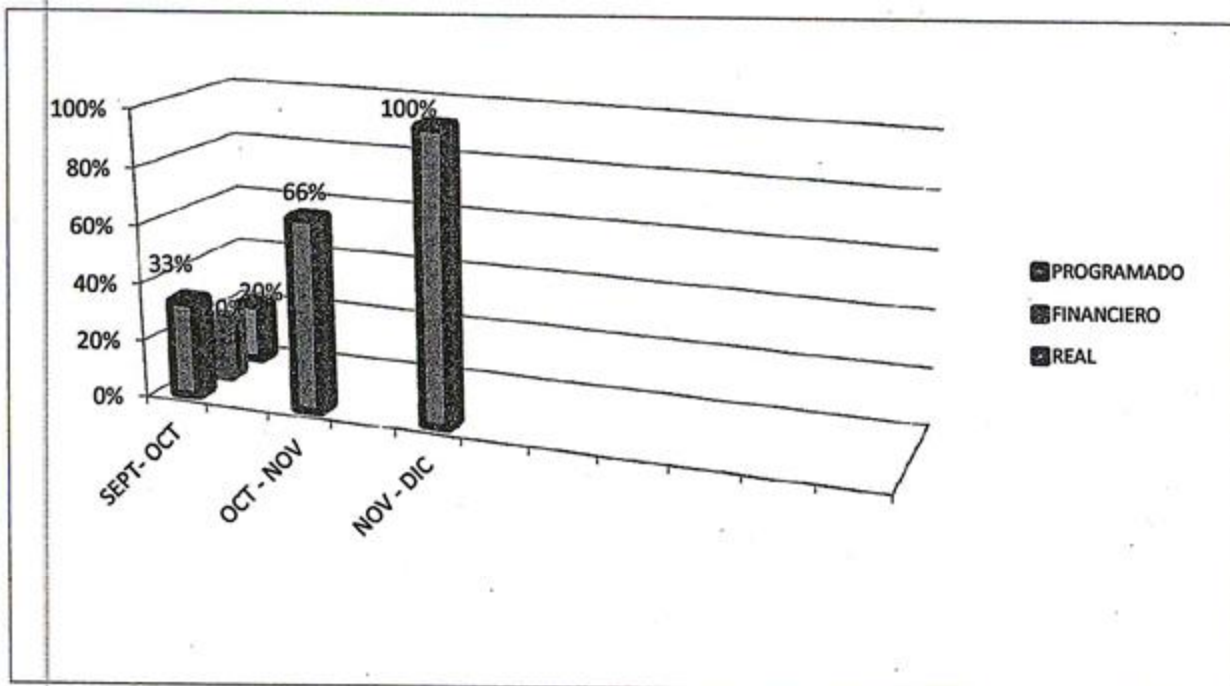

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Solventación de Observaciones a la Segunda Revisión a los Informes
Trimestrales del Ejercicio 2014 relativos a Obra Publica

Anexo Observación 13



EMISOR

Urbanización y Riego Baja California S.A. de C.V.
URB821018EL9
Vía Rápida Poniente 15029 Río Tijuana 3ra. Etapa
C.P. 22226, Tijuana, Baja California, México
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
www.urbaca.com.mx

ESTIMACION # 1

Serie / Folio: HILL109779
Folio Fiscal: 19EEBE11-84C9-4ED7-9F68-5B4EEFCC8F27
Certificado SAT: 00001000000202864530
Lugar de expedición: Hermosillo, Sonora
Fecha de certificación: 2014-12-15T18:23:29
Fecha de emisión: 2014-12-15T17:18:40
Certificado del emisor: 00001000000203399645
Tipo de comprobante: Factura
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.00
Remisión:

EXPEDIDO EN

Bivd. García Morales 262, El Llano
C.P. 83200 Hermosillo, Sonora, México
Tel.: (662) 216 1467 Fax: (662) 216 1468 / Correo-e: hermosillo@urbaca.com.mx

RECEPTOR

No. 2369

Castco De México SA de CV
CME020111JN3
Leocadio Salcedo 17 A Col. Jesús García,
C.P. 83140 Hermosillo, Sonora, México
Tel: (662)215 7992

Código	Concepto	Cant.	Unidad	Precio	Importe
00060	TUBO PVC HCO S.M C-7 160mm x 6	126.00	Pieza	416.16	52,436.16
Método de pago: Cheque Nominativo 7816					
Forma de pago: Pago en una sola exhibición					
Condiciones y Observaciones:					
0 Días de crédito					
* Toda devolución está sujeta a aprobación y a un cargo del 15% por administración					
Importe con letra: *** Cero Pesos 00/100 ***					
Desglose de impuestos trasladados: IVA 16% 0.00					
Desglose de impuestos retenidos:					
Amortización (100.00%) 52436.16					
Sub Total: 0.00					
Impuestos trasladados: 0.00					
Impuestos retenidos: 0.00					
TOTAL 0.00					

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.0|19EEBE11-84C9-4ED7-9F68-5B4EEFCC8F27|2014-12-15T18:23:29|DALJqcQL8DXnC61/naq5Jp1kVItIb5r/Pn+WGB37mxbYMcQxXgZHXnsQ8KgXZlgEuishhnKU1m5fAAYaExfIcV0ZOH7H/QlLhrPc1Zz4w753cnLEaH0Bg2C4RwoqtEJV007s1rrkVWeddgQm+gfMPKIR68/jsVGPBXZpXUK+xc=|00001000000202864530|]

Sello Digital

DALJqcQL8DXnC61/naq5Jp1kVItIb5r/Pn+WGB37mxbYMcQxXgZHXnsQ8KgXZlgEuishhnKU1m5fAAYaExfIcV0ZOH7H/QlLhrPc1Zz4w753cnLEaH0Bg2C4RwoqtEJV007s1rrkVWeddgQm+gfMPKIR68/jsVGPBXZpXUK+xc=

Sello Digital del SAT

GoeIYDQGk50YM+jkIb8DPI/0UJQ0U7MySZrcyPqG9RBnN+a85KjddpC1KPCJaLhs8AqarOrnkI+b3X7SLK83UTpZcD9natemvIv/IDzCvMqp7FWWL13cgkPspDLdtb7NUw+hKpwqVhO+cdNAirjUNF+kZaIUgRYGS6OCX1G6Fec=



URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA
S.A. DE C.V.
PAGADO
FECHA 15/10/14
FIRMA *[Signature]* 109779

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



EMISOR
 Urbanización y Riego Baja California S.A. de C.V.
 URBS21018ELS
 Via Rápida Poniente 15029 Río Tijuana 3ra. Etapa
 C.P. 22226, Tijuana, Baja California, México
 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
 www.urbaca.com.mx

Serie / Folio: HILL109852
 Folio Fiscal: E512E9AF-D1CC-48D2-A851-BEABF583E79
 Certificado SAT: 00001000000202864530
 Lugar de expedición: Hermosillo, Sonora
 Fecha de certificación: 2014-12-23T19:01:52
 Fecha de emisión: 2014-12-23T17:55:56
 Certificado del emisor: 00001000000203399545
 Tipo de comprobante: Factura
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00
 Remisión:

EXPEDIDO EN

RECEPTOR

No. 2369



Bvd. Garcia Morales 262, El Llano
 C.P. 83200 Hermosillo, Sonora, México
 Tel.: (662) 216 1467 Fax: (662) 216 1468 / Correo-e: hermosillo@urbaca.com.mx

Castco De México SA de CV
 CHEQ20111JN3
 Leocadio Salcedo 17 A Col. Jesús García,
 C.P. 83140 Hermosillo, Sonora, México
 Tel: (662)215 7992

Código	Concepto	Cant.	Unidad	Precio	Importe
TM100060	TUDO RVC HCO S.M.C-7 160mm x 6	140.00	Pieza	416.16	58,262.40
Método de pago: Cheque Nominalivo 7816					
Forma de pago: Pago en una sola exhibición					
Condiciones y Observaciones:					
0 Días de crédito					
* Toda devolución está sujeta a aprobación y a un cargo del 15% por administración					
Importe con letra: *** Cero Pesos 00/100 ***					
Desglose de impuestos trasladados: IVA 16% 0.00					
Amortización (100.00%) 58,262.40					
Sub Total: 0.00					
Impuestos trasladados: 0.00					
Impuestos retenidos: 0.00					
TOTAL 0.00					
Desglose de impuestos retenidos:					

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.0|E512E9AF-D1CC-48D2-A851-BEABF583E79|2014-12-23T19:01:52|dUXJj1StqHekX4m9XxhSddsWESmDsmcXBvtOPhIKUdk7IDz0obInkkvZfJddvu9d0h903WA3+JSnn+IJHcaLqqoFMPvUdOSEvhmBd+meIvviCh6EXUSoEUuEzw1MYKsyqMNPtP07b0yI27+EF9W6M68rk1wWZpAvJepLzjAbhgg=|00001000000202864530|]
 Sello Digital
 dUXJj1StqHekX4m9XxhSddsWESmDsmcXBvtOPhIKUdk7IDz0obInkkvZfJddvu9d0h903WA3+JSnn+IJHcaLqqoFMPvUdOSEvhmBd+meIvviCh6EXUSoEUuEzw1MYKsyqMNPtP07b0yI27+EF9W6M68rk1wWZpAvJepLzjAbhgg=
 Sello Digital del SAT
 LhZLxWIs9j5k6nHUaBkyGDV21b1D0k/xlu/JP718DoxSPFghkGL+/OnNI2Z9PT7yEQh03QRJvETIVvYAcnevynoe1wy8R/VGL+pTsvKmdW
 y2e7kXIPXaTWWoNkcC4Pbdg8JnRiv65bmtgwjDQ69Rti9LBdeY0taIgDKTux1s=



13-DIC-14
 FA 109852

[Handwritten signature]



PEDIDO

CLIENTE: Castco De México SA de CV

NÚMERO DE CLIENTE: 2369

DIRECCION: Leocadio Salcedo 17 A Col. Jesús García, Hermosillo, Sonora,

FECHA DE PEDIDO: 15/Diciembre/14

No. DE PEDIDO: 39563

No. DE O.C.:

ATENDIÓ: FERNANDO RUIZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REQUERIDA
VA4800064	VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO BRIDADA €	2.00
FFEXT160	EXTREMIDAD FOFO BRIDADA 6" 160mm	7.00
CHCO0622M	CODO PVC ANGER C-10 S/M 6" X 22	5.00
FFJG0165	JUNTA GIUBAULT S/M 165mm x 6"	7.00
FF 1640	REDUCCION FOFO BRIDADA 6" x 4"	1.00
FFEXT115	EXTREMIDAD FOFO BRIDADA 4" EN 115MM	3.00
FFJG0120	JUNTA GIUBAULT 120MM x 4"	1.00
AB61022160	ABRAZADERA FOFO PVC S/M 6" X 3/4" EN 160MM	5.00
VA600010M	VALVULA ADMO/EXPULSION DE AIRE ROSCADA 1	5.00
FFTE00640	TEE FOFO BRIDADA 6" x 4"	1.00
VA4800044	VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO BRIDADA 4	1.00
FFRE00430	REDUCCION FOFO BRIDADA 4" x 3"	1.00
FFEXT090	EXTREMIDAD FOFO BRIDADA 3" EN 90MM	1.00
FFJG0120	JUNTA GIUBAULT 120MM x 4"	2.00
FFJG0090	JUNTA GIUBAULT 90mm x 3'	1.00
CHCO04090	CODO PVC ANGER S.I 4" X 90	1.00
CHCOR0040	COPE REPARACION PVC ANGER S.I. DR-26 4'	1.00
FF4800161	CONTRAMARCO SENCILLO CENTRADO 4" X 1.10 MTS	6.00
FFMCT0161	MARCO C/TAPA STD 50X50 FOFO 110KG	8.00
FF4. 170	CONTRAMARCO SENCILLO CENTRADO 4" X 1.40 MTS	2.00
FFEP0030	EMPAQUE DE PLOMO 3"	1.00
FFEP0040	EMPAQUE DE PLOMO 4"	4.00
FFEP0060	EMPAQUE DE PLOMO 6"	9.00

RECIBI PEDIDO
COMPLETO



PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

ANTICIPO: \$0.00 (0.00 %)

SUB-TOTAL: \$45,812.53

I.V.A.: \$7,330.01

TOTAL: \$53,142.55



PEDIDO

CLIENTE: Casto De México SA de CV NÚMERO DE CLIENTE: 2369 DIRECCION: Leopoldo Salcedo 17 A Col. Jesús García, Hermosillo, Sonora,	FECHA DE PEDIDO: 15/Diciembre/14 No. DE PEDIDO: 39564 No. DE O.C.: ATENDIÓ: FERNANDO RUIZ
---	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REQUERIDA	€
FN1650753	TORNILLO C/TUERCA 3/4" x 3 1/2"	72.00	
FN1650581	TORNILLO C/TUERCA 5/8" x 2 1/2"	4.00	
FN1650582	TORNILLO C/TUERCA 5/8" x 3"	24.00	

*RECIBI
 PEDIDO
 COMPLETO*



PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

[Signature]
 SUB-TOTAL: \$2,233.06
 I.V.A.: \$357.29
 TOTAL: \$2,590.35

ANTICIPO: \$0.00 (0.00 %)



EMISOR

Urbanización y Riego Baja California S.A. de C.V.
URB821018EL9
Vía Rápida Poniente 15029 Río Tijuana 3ra. Etapa
C.P. 22226, Tijuana, Baja California, México
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
www.urbaca.com.mx

Serie / Folio: HILL109835

Folio Fiscal: 486C9719-8A92-4AF0-9CE4-3D8F164BE93A

Certificado SAT: 00001000000202864530

Lugar de expedición: Hermosillo, Sonora

Fecha de certificación: 2014-12-20T13:55:00

Fecha de emisión: 2014-12-20T12:50:06

Certificado del emisor: 00001000000203399645

Tipo de comprobante: Factura

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1.00

Remisión:

EXPEDIDO EN

Blvd. García Morales 262, El Llano
C.P. 83200 Hermosillo, Sonora, México
Tel.: (662) 216 1467 Fax: (662) 216 1468 / Correo-e: hermosillo@urbaca.com.mx

RECEPTOR

No. 2369

Castco De México SA de CV

CME020111JN3

Leocadio Salcedo 17 A Col. Jesús García,

C.P. 83140 Hermosillo, Sonora, México

Tel: (662)215 7992

Código	Concepto	Cant.	Unidad	Precio	Importe
041041	TUBO PVC HCO S/I RD-41 100mm x 6	117.00	Pieza	213.16	24,939.72
Método de pago: Cheque Nominativo 7816					
Forma de pago: Pago en una sola exhibición					
Condiciones y Observaciones:					
0 Días de crédito					
* Toda devolución está sujeta a aprobación y a un cargo del 15% por administración					
Importe con letra: *** Cero Pesos 00/100 ***					
Desglose de impuestos trasladados: IVA 16% 0.00					
Desglose de impuestos retenidos:					
Amortización (100.00%) 24939.25					
Sub Total: 0.00					
Impuestos trasladados: 0.00					
Impuestos retenidos: 0.00					
TOTAL 0.00					

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|486C9719-8A92-4AF0-9CE4-3D8F164BE93A|2014-12-20T13:55:00|cWaYnYLFpTmylk6WZY29yPGDI4uZ7nKRnO9GooFkprARVX0NbGmPep0sNgP8BsexQyJEx8zP/JDuALv/I7B+IZvKs5zLSAp1UTuXgvfCIEKGcsEFZW/NVQaT3WdpUMaYM330hGihpdvQg9uIYHGklmEBgV2XEGKmGlasnzI8OU=|00001000000202864530||

Sello Digital

cWaYnYLFpTmylk6WZY29yPGDI4uZ7nKRnO9GooFkprARVX0NbGmPep0sNgP8BsexQyJEx8zP/JDuALv/I7B+IZvKs5zLSAp1UTuXgvfCIEKGcsEFZW/NVQaT3WdpUMaYM330hGihpdvQg9uIYHGklmEBgV2XEGKmGlasnzI8OU=

Sello Digital del SAT

ehiYKlo0PKF151Tf9Xo9nWEDv8NSoKkXh7VYMYTTY3ykLjBe3e6kOMg9zQl++VtLz+bZ1Jmwv8h89qe4kMGBU49WEwmg+/G1Q4cE8JrYSftQCtexgsPI97DUJcexCKWhcihRnRQWdSTZ3Jz+rfyIcdJMOMbpxCrJ4F2Dm04JM=



FECHA 13-DIC-14
SIN SER N FA. 109762



EMISOR

Urbanización y Riego Baja California S.A. de C.V.
URB821018EL9
Vía Rápida Poniente 15029 Río Tijuana 3ra. Etapa
C.P. 22226, Tijuana, Baja California, México
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
www.urbaca.com.mx

Serie / Folio: HILL109821

Folio Fiscal: A1368239-464B-48FC-A68E-6D5EBE8E3246

Certificado SAT: 00001000000202864530

Lugar de expedición: Hermosillo, Sonora
Fecha de certificación: 2014-12-19T10:00:36

Fecha de emisión: 2014-12-19T08:55:39

Certificado del emisor: 00001000000203399645

Tipo de comprobante: Factura

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1.00

Remisión:

EXPEDIDO EN

RECEPTOR

No. 2369

Castco De México SA de CV

CME020111JN3

Leocadio Salcedo 17 A Col. Jesús García,

C.P. 83140 Hermosillo, Sonora, México

Tel: (662)215 7992

Blvd. García Morales 262, El Llano

C.P. 83200 Hermosillo, Sonora, México

el. (662) 216 1467 Fax: (662) 216 1468 / Correo-e: hermosillo@urbaca.com.mx

Código

Concepto

Cant.

Unidad

Precio

Importe

TH041041

TUBO PVC HCO S/L RD-41 100mm x 6

100.00

Pieza

213.16

21,316.00

Método de pago: Cheque Nominativo 7816

Amortización (100.00%)

21315.60

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Sub Total:

0.00

Condiciones y Observaciones:

Impuestos trasladados:

0.00

0 Días de crédito

Impuestos retenidos:

0.00

* Toda devolución está sujeta a aprobación y a un cargo del 15% por administración

TOTAL

0.00

Importe con letra: *** Cero Pesos 00/100 ***

Desglose de impuestos trasladados: IVA 16% 0.00

Desglose de impuestos retenidos:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A1368239-464B-48FC-A68E-6D5EBE8E3246|2014-12-19T10:00:36|REBtA/ua3PM60EEF7GHBg8Jt0ZBZDfs4YVNYz0MaZwK7cwtjStqMntu0aTT0T4o1HuqGXyUWJzNwEVXXGFJheauL3smS20JLLWrMbQE49Baul4xnRMm2BzWeGYNNHqCASJHrIGS1tvgAJghVXbCKIXRjX5n37hHhMC1aCFg=|00001000000202864530|

Sello Digital

REBtA/ua3PM60EEF7GHBg8Jt0ZBZDfs4YVNYz0MaZwK7cwtjStqMntu0aTT0T4o1HuqGXyUWJzNwEVXXGFJheauL3smS20JLLWrMbQE49Baul4xnRMm2BzWeGYNNHqCASJHrIGS1tvgAJghVXbCKIXRjX5n37hHhMC1aCFg=

Sello Digital del SAT

AcAbnlC9vONPvr72ODsEGl2Jrub81JlWfH8/bSPfMdZFRduu28aAkQFSEEDOrSUwX0cRMpYzON/O6C68+CV4JFSGkxLvh43q7WCZXNX7cMroYtg5NapSG2f66MjYYPNpwe2sZxTev9VPMu/r0l/REclPPA4reSr95bbXX8=




URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.

PAGADO

FECHA 13-Dic-14

FIRMA FA.109762

Handwritten signature



PEDIDO

CLIENTE: Castor De México SA de CV

NÚMERO DE CLIENTE: 2369

DIRECCION: Leopoldo Salcedo 17 A Col. Jesús García, Hermosillo, Sonora,

FECHA DE PEDIDO: 12/Diciembre/14

No. DE PEDIDO: 39554

No. DE O.C.:

ATENDIÓ: FERNANDO RUIZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REQUERIDA	SURTIDA	UNIDAD
TH041041	TUBO PVC HCO S/I RD-41 100mm x 6	217.00	217.00	PZ
TM100060	TUBO PVC HCO S.M C-7 160mm x 6	680.00	266.00	PZ

RECIBI 414 TRANS RESTANTES

PEDIDO COMPLETO



PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

ANTICIPO: \$329,243.65 (100.00 %)

SUB-TOTAL: \$329,243.65

I.V.A.: \$52,678.98

TOTAL: \$381,922.63

cliente: CASCO DE MEXICO S.A, DE C.V	Atención a: _____
Dirección: _____	Condiciones: _____
Tel: _____	Tiempo de Entrega: _____
Fax: _____	Vendedor: MANUEL VAZQUEZ
Email: _____	Email: MVAZQUEZ@KURODA.COM
Ciudad: HERMOSILLO, SONORA	Tipo de Cambio: _____


CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO
6		TEE DIVIDIDA EN ACERO INOXIDABLE 12"x3"	
5		TEE DIVIDIDA EN ACERO INOXIDABLE 14" x 4"	
14		TEE DIVIDIDA EN ACERO INOXIDABLE 14" x 3"	
5		VALV COMP HD V/FIJO SELLO/FLEX 4" SIMEX	
20		VALV COMP HD V/FIJO SELLO/FLEX 3" SIMEX	
5		VAL ADM Y EXP AIRE 101MM	
20		VAL ADM Y EXP AIRE 76MM	
2		VALV COMP HD V/FIJO SELLO/FLEX 6" SIMEX	
<p>FORMA DE PAGO: \$ 160,394.48 ANTICIPO Y RESTO C. ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA DE 10 A 15 DIAS HABILES SE INCLUIRA EN ELE PEDIDO 1 TEE DIVIDIDA DE 12X3 1 TEE DIVIDIDA DE 14 X 3 <i>despues</i> PAGANDOSE JUNTO CON EL RESTO DE LA FACTURA</p> <p>LAS CARACTERISTICAS DE LAS PIEZAS SE SUJETARAN A LO CONTENIDO EN CATALOGO RECIBIDO.</p>			

los a cambio sin previo aviso
recios no incluyen IVA

Firma de Conformidad



KS COMERCIAL, SA DE CV SUC MAYOREO
 Periférico Pte. 81-A entre Navarrete y Luis Encinas Col. Country Club.
 Tel: (662)2605620-31-32 Fax: (662)2605966
 Hermosillo, Sonora, México.
www.ks-mayoreo.com

[Handwritten signature]

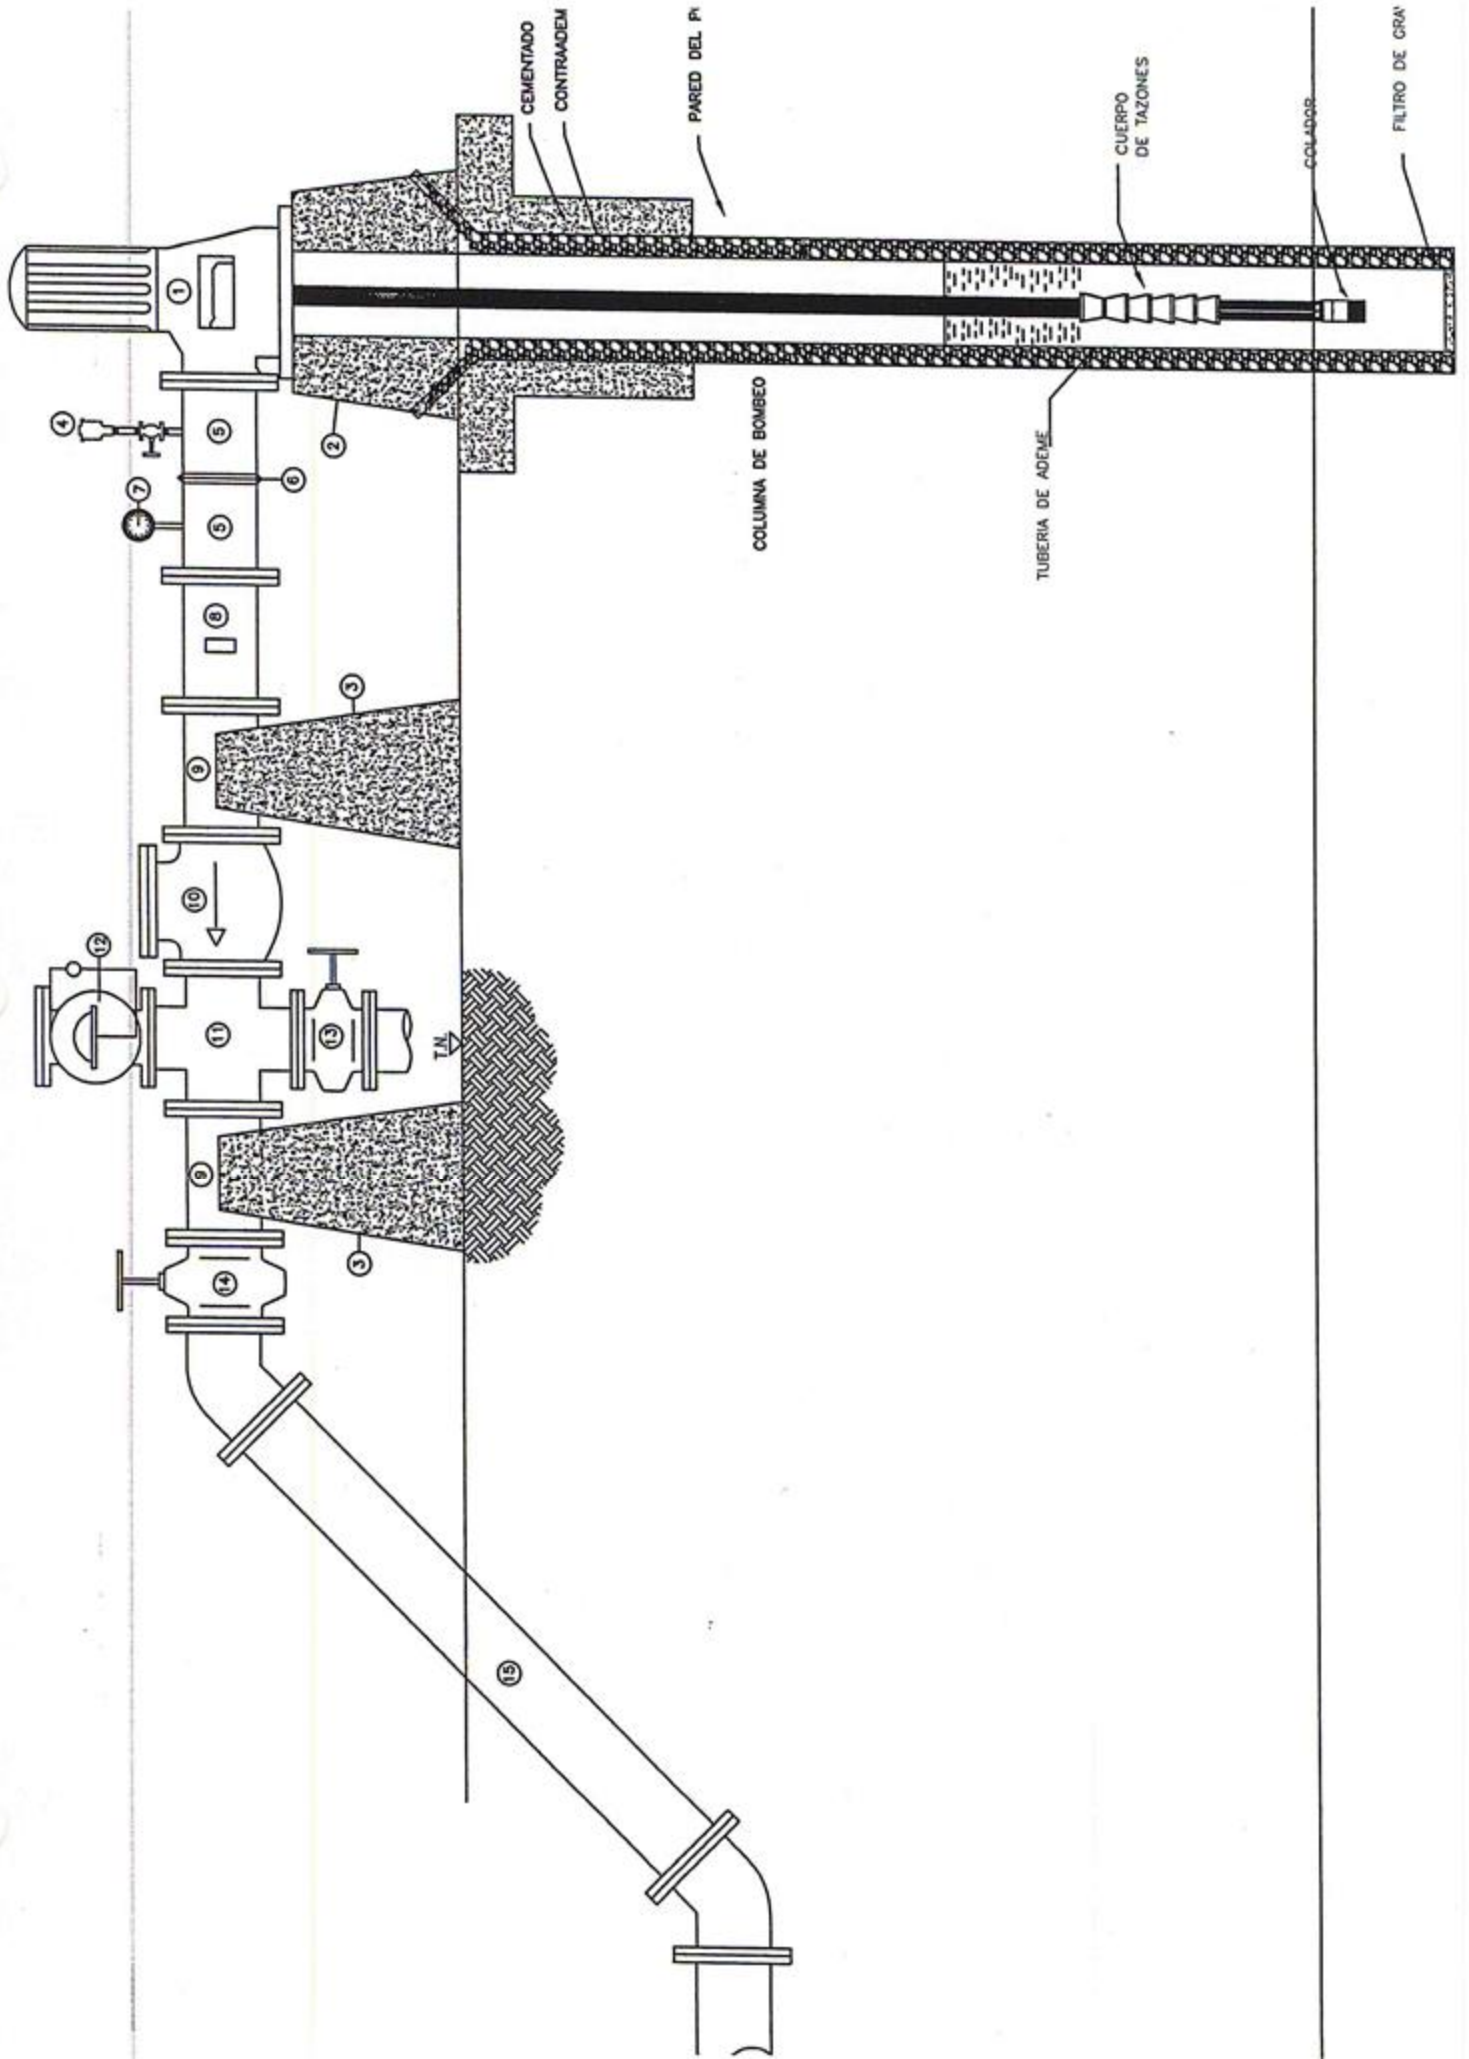

CRUCERO DE POZO-1 BAYUMS

1.- MOTOR VERTICAL TIPO TURBINA DE 100 H.P.	1	Equipo.
2.- BASE PARA EQUIPO DE BOMBEO.	1	Pza.
3.- BASE PARA CRUCERO DE EQUIPO DE BOMBEO.	2	Pza.
✓ 4.- VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE 1" DE ϕ	1	Pzas.
✓ 5.- EXTREMIDAD DE 10" ϕ .	2	Pzas.
✓ 6.- JUNTA MECANICA BRIDADA DE 10" ϕ .	1	Pzas.
✓ 7.- MANOMETO DE 1/2".	1	Pzas.
✓ 8.- MEDIDOR DE GASTO CON TUBO DE 10"	1	Pzas.
✓ 9.- CARRETE DE ACERO DE 10" ϕ (CORTO).	2 3	Pzas.
✓ 10.- VALVULA CHECK DE 10" ϕ .	1	Pzas.
11.- TEE DE 10"x 6" ϕ .	1	Pzas.
✓ 12.- VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 6" ϕ .	1	Pzas.
✓ 13.- VALVULA DE COMPUERTA DE 6" ϕ .	1	Pza.
✓ 14.- VALVULA DE COMPUERTA DE 10" ϕ .	1	Pza.
✓ 15.-ZETA DE ACERO DE 2.50 MTS C/2 CODOS 45'X 10"	1	Pza.
✓ EMPAQUE DE PLOMO DE 10" ϕ .	11	Pza.
✓ EMPAQUE DE PLOMO DE 6" ϕ .	3 1	Pza.
✓ TORNILLOS DE $3/8"$ x $3 1/4"$.	48 16	Pza.
✓ TORNILLOS DE $7/8"$ x 4".	132 36	Pza.

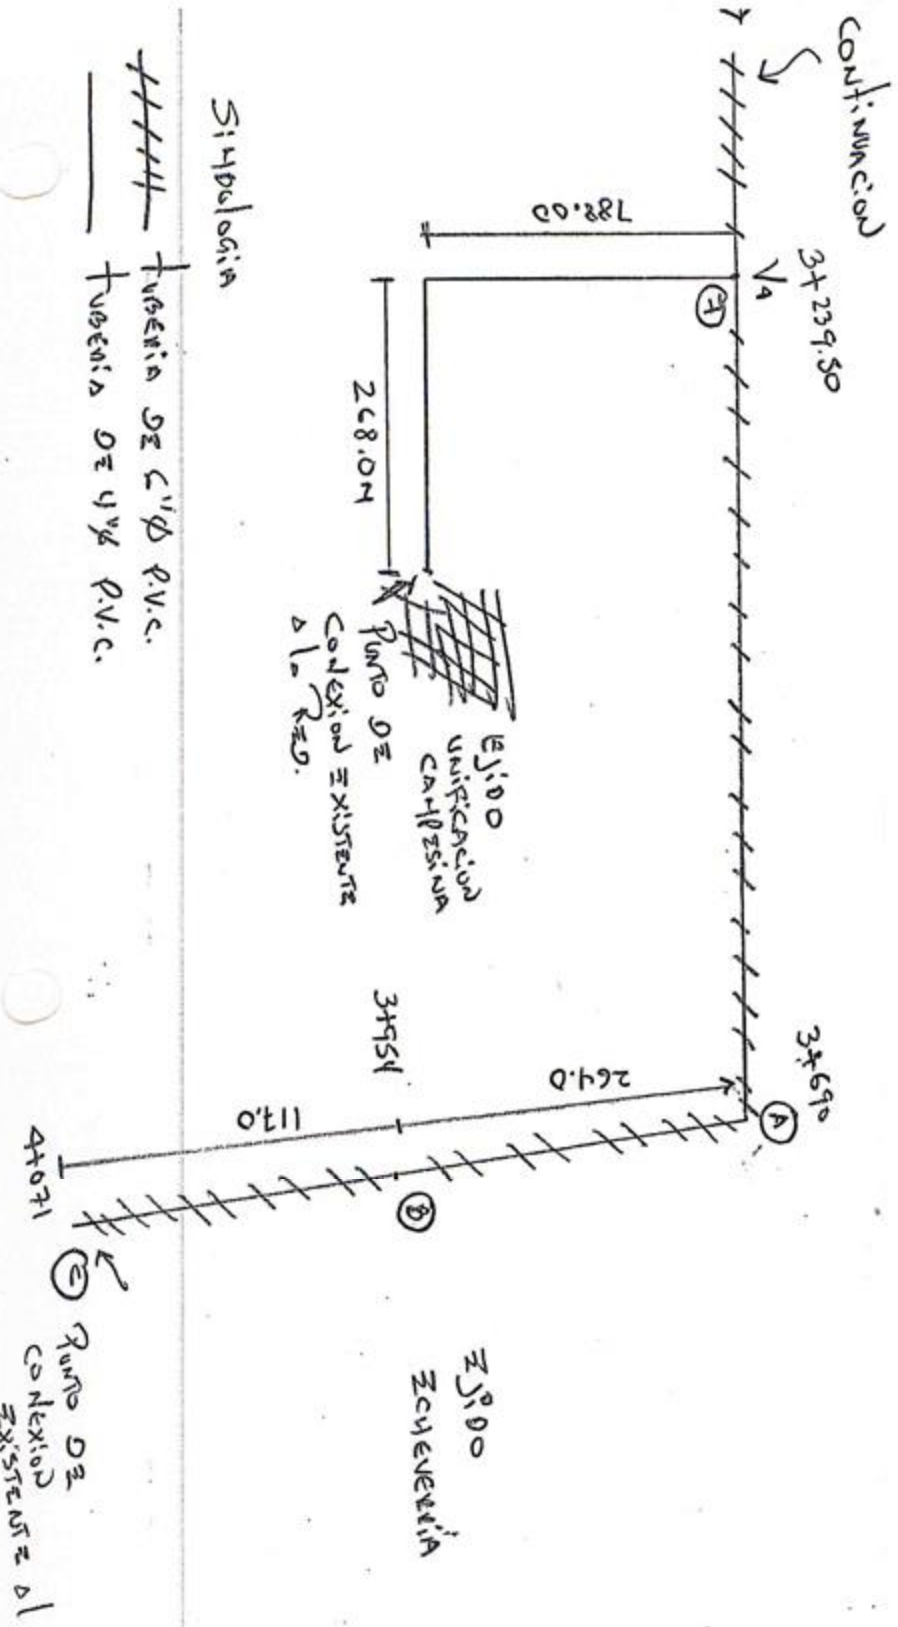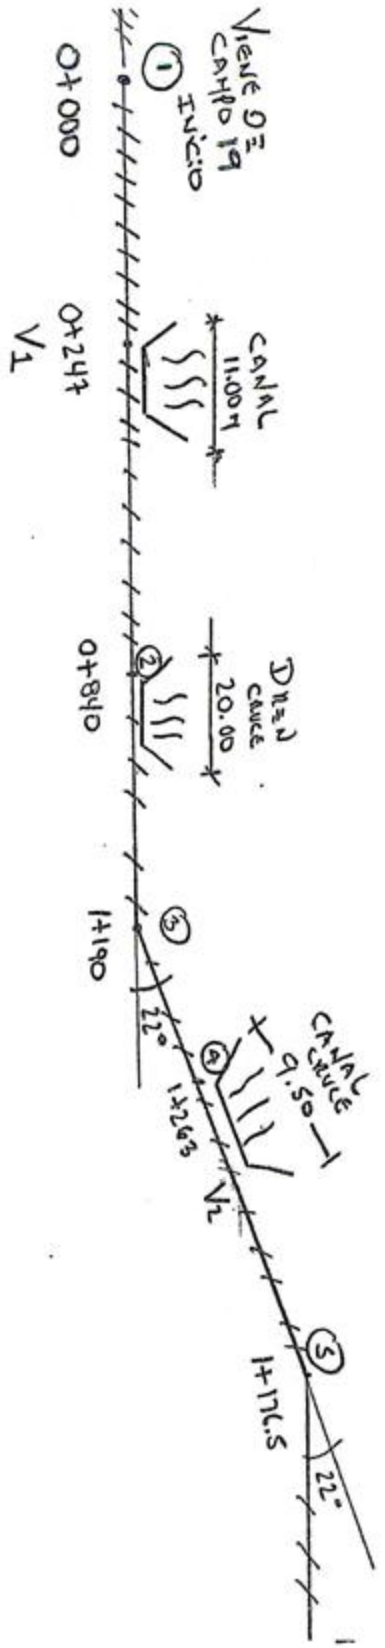

Siphon

TUBERIA DE 14" P.V.C.
 TUBERIA DE 4" P.V.C.

PUNTO DE CONEXION EXISTENTE


SECCION DE LA ZANJA

RELLENO A VOLTEO

RELLENO COMPACTADO
A 95 % PROCTOR

TUBO DE PVC 6"

PLANTILLA ò
CAMA DE ARENA

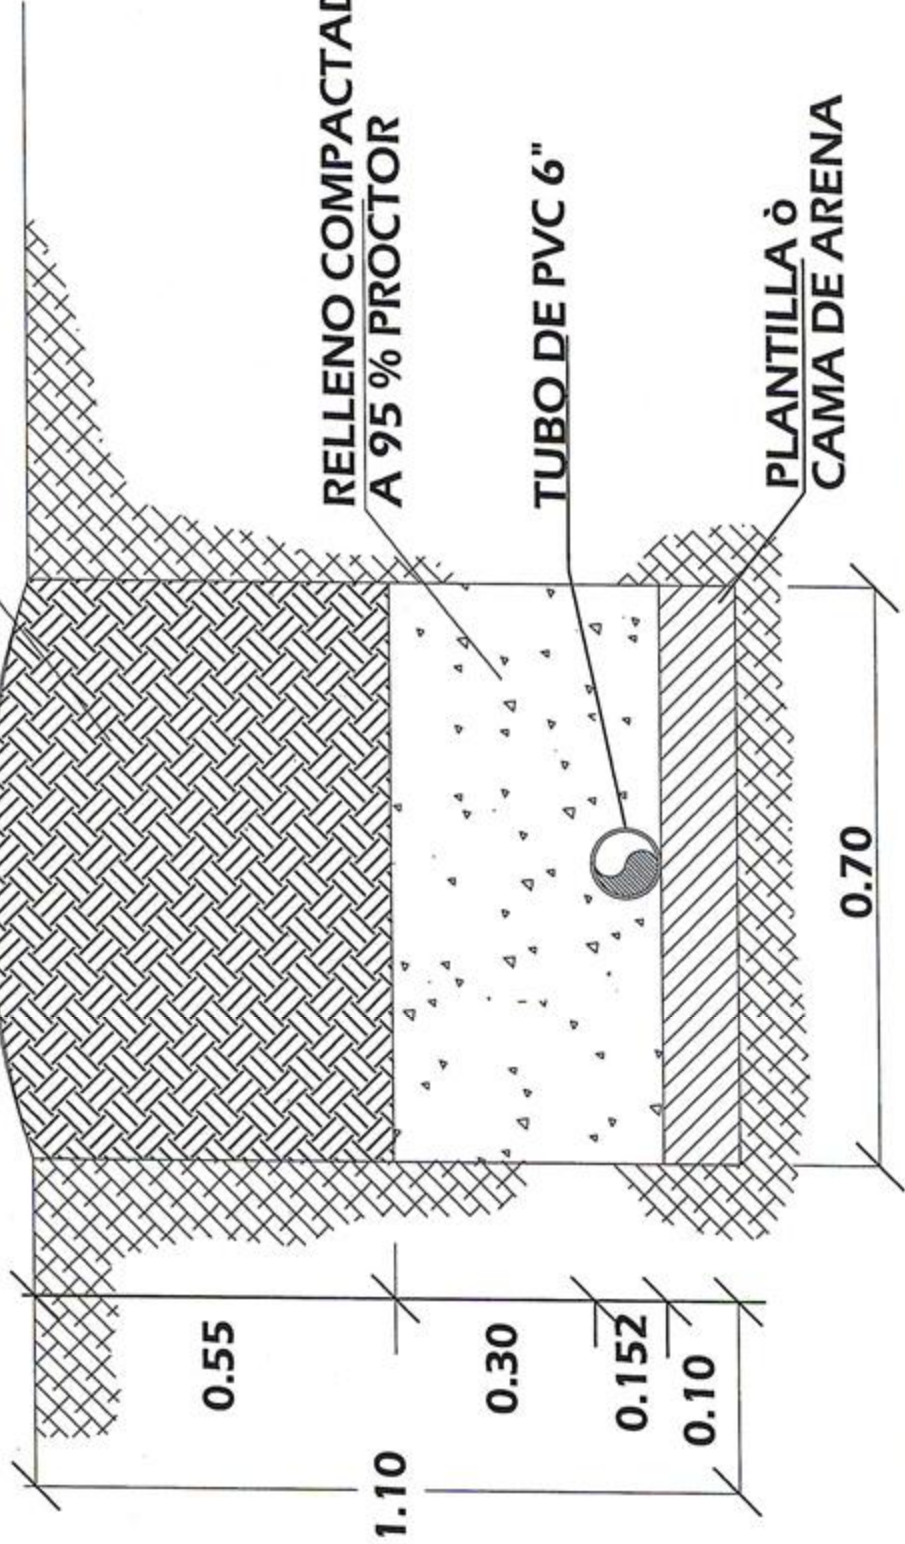

[Handwritten signature]

VOLUMENES DE EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS

MM	TUBERÍAS			EXCAVACIÓN			VOL. TUBO	PLANTILLA	RELLENOS	
	PULG	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLUMEN	COMPACTADO			VOLTEO	
50	2	0.00	0.55	0.70	0.385	0.00196	0.06	0.1905	0.1375	0.00
60	2 1/2	0.00	0.60	1.00	0.600	0.00283	0.06	0.2132	0.3240	0.00
75	3	0.00	0.60	1.00	0.600	0.00442	0.06	0.2206	0.3150	0.00
100	4	1.064.00	0.60	1.00	0.600	0.00785	0.06	0.2321	0.3000	0.00
150	6	0.00	0.70	1.10	0.770	0.01767	63.24	0.2973	0.3850	0.00
200	8	0.00	0.75	1.15	0.863	0.03142	0.08	0.3436	0.4125	0.00
250	10	0.00	0.80	1.20	0.960	0.04909	0.08	0.3909	0.4400	0.00
300	12	0.00	0.85	1.25	1.063	0.07069	0.09	0.4393	0.4675	0.00
350	14	0.00	0.90	1.30	1.170	0.09621	0.09	0.4888	0.4950	0.00
400	16	0.00	1.00	1.40	1.400	0.12566	0.10	0.5743	0.6000	0.00
450	18	0.00	1.15	1.45	1.668	0.15904	0.12	0.7035	0.6900	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

SECCION DE LA ZANJA

RELLENO A VOLTEO

RELLENO COMPACTADO
A 95 % PROCTOR

TUBO DE PVC 4"

PLANTILLA ò
CAMA DE ARENA

