

R
N

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-0086/2018, de fecha 18 de enero de 2019, se me comisiona para que en compañía del Ing. Alberto Álvarez Mendivil, efectúe la verificación física de las obras, correspondiente a la Auditoría No. 1130 con título "Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas", ubicadas en los Municipios Bácum, Benito Juárez y Cajeme, Sonora.

El día 23 de enero de 2019, se realizó el traslado a la Localidad Marte R. Gómez, Municipio de Cajeme, para realizar la inspección física de la obra:

OBRA1: "(13-00-0068) Construcción de baños y tejaban en Escuela Primaria 23 de Octubre, en la Localidad de Marte R. Gómez, Municipio de Cajeme, Sonora."

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No.: ISIE-FAFEF-13-003

Contratista: USMAN CONSULTORES, S.A. de C.V.

Monto de Contrato: \$910,955.74

Monto Ejercido: \$832,339.76

Monto Cancelado: \$78,615.98

Anticipo otorgado: \$273,286.72

Anticipo Amortizado: \$273,286.72

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 27 de enero de 2014 al 27 de marzo de 2014

Periodo Real: 05 de julio de 2014 al 20 de enero de 2015



En estas fotografías se muestra el acceso a la escuela y el tejaban.

29/01/19
C. Saldate

Handwritten signature or mark.

El día 24 de enero de 2019, se realizó el traslado a la Localidad Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, para realizar la inspección física de la obra:

OBRA2: "(13-00-0043) Obras Complementarias en exterior para la terminación del edificio de Biblioteca en Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, en la Localidad de Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora."

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No.: ISIE-FAFEF-13-034

Contratista: Constructora ARONOS, S.A. de C.V.

Monto de Contrato: \$3'886,937.93

Monto Ejercido: \$3'752,513.62

Monto Cancelado: \$134,424.31


Anticipo otorgado: \$777,387.58

Anticipo Amortizado: \$777,387.58


Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 17 de diciembre de 2013 al 15 de abril de 2014

Periodo Real: 17 de mayo de 2014 al 13 de septiembre de 2014

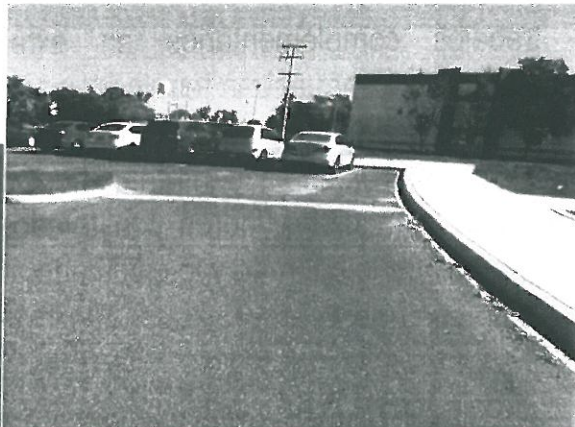

En estas fotografías se aprecian las guarniciones, banquetas y pavimento

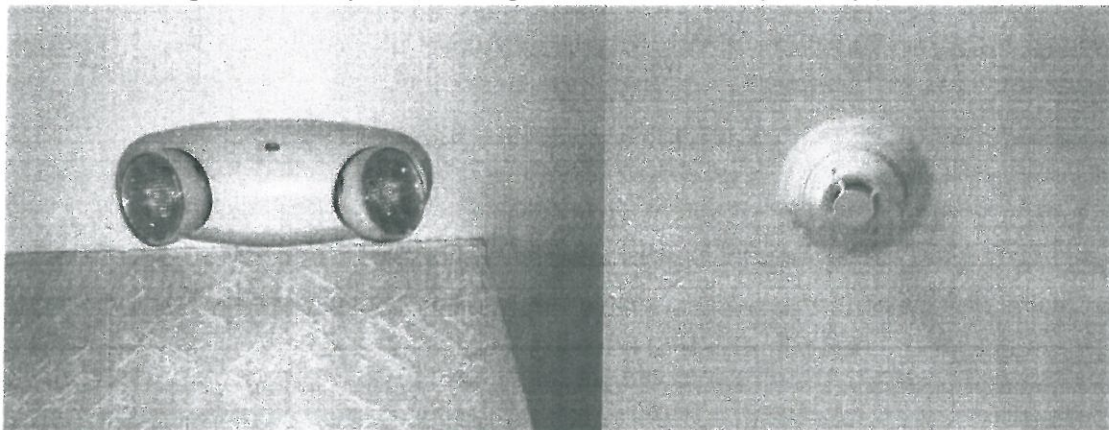

En estas fotografías se aprecian la lámpara de emergencia y el detector de humo

OBRA3: "(17-FC-0028) Construcción de un aula en CAM 17, en la Localidad de Villa Juárez, Municipio de Benito Juárez, Sonora.

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No.: ISIE-ED-17-004

Contratista: Diseños y Construcciones LOAR, S.A. de C.V.

Monto de Contrato: \$1'059,816.04

Monto Ejercido: \$980,454.96

Monto Cancelado: \$79,361.18

Anticipo otorgado: \$317,944.84

Anticipo Amortizado: \$317,944.84


Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 16 de mayo de 2017 al 03 de agosto de 2017

Periodo Real: 21 de junio de 2017 al 08 de septiembre de 2017



En estas fotografías se aprecia el acceso a la escuela y el aula

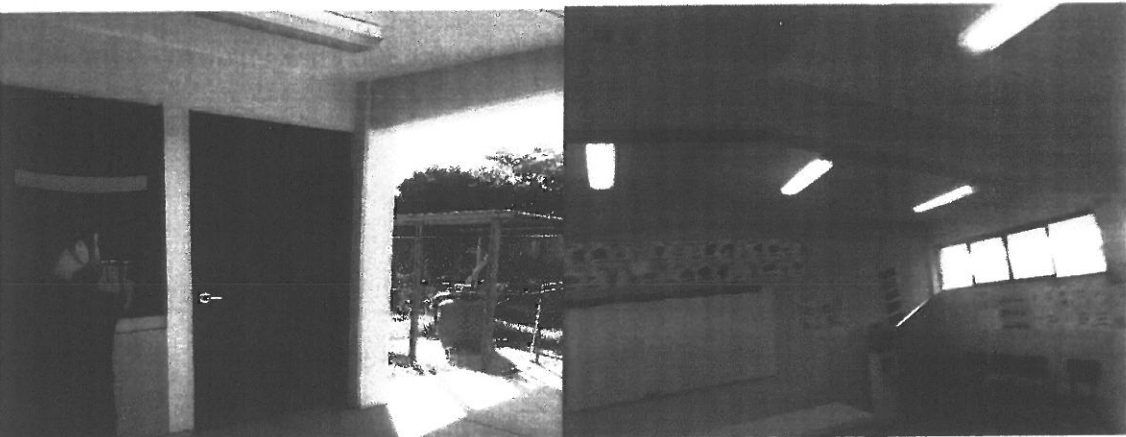

En estas fotografías se aprecia la puerta de acceso y el interior del aula.

OBRA4: "(13-00-0064) Construcción de una aula de usos múltiples, alimentadores eléctricos y obra exterior, en CAM No. 40, de la Localidad de Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora."

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No.: ISIE-FAFEF-13-019

Contratista: USMAN CONSULTORES, S.A. de C.V

Monto de Contrato: \$668,169.99

Monto Ejercido: \$595,855.94

Monto Cancelado: \$72,314.05


Anticipo otorgado: \$200,451.00

Anticipo Amortizado: \$200,451.00


Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 19 de diciembre de 2013 al 16 de febrero de 2014

Periodo Real: 14 de febrero de 2014 al 16 de febrero de 2015

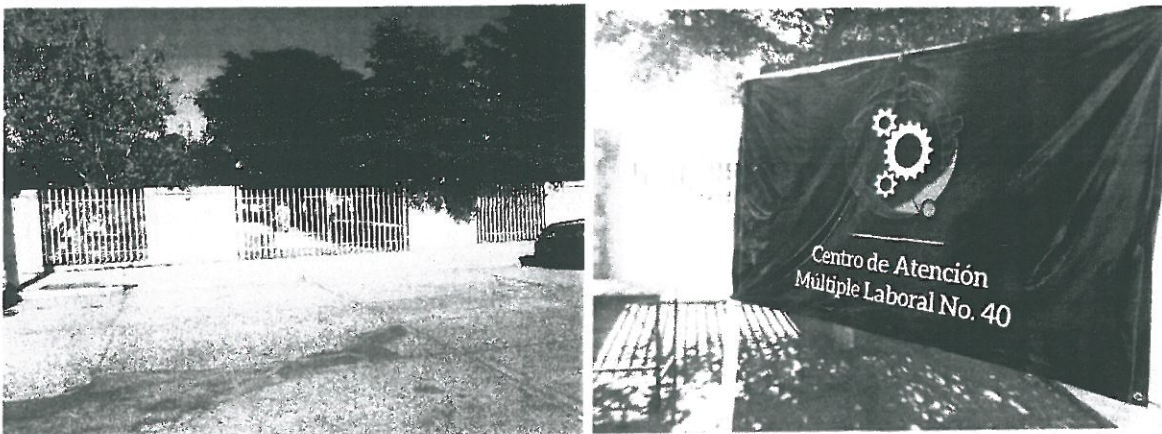

En estas fotografías se puede apreciar Acceso al Centro de Atención CAM No. 17

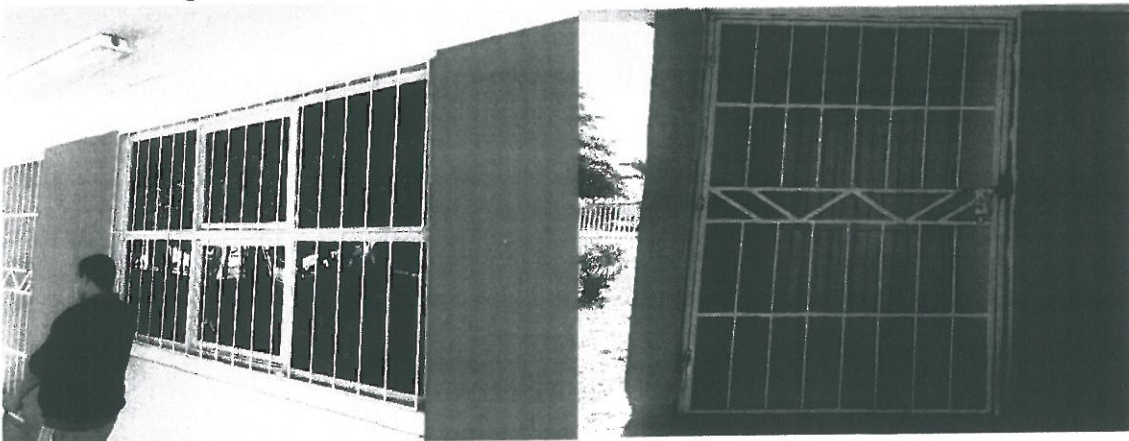

En estas fotografías se puede apreciar la fachada y puerta de acceso.

El día 25 de enero de 2019, se continuó con la verificación física en la Localidad Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, de la obra:

OBRA5: "(13-00-0065) Construcción de tejaban en CENDI No. 3, en la Localidad de Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora."

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No.: ISIE-FAFEF-13-031

Contratista: USMAN CONSULTORES, S.A. de C.V

Monto de Contrato: \$448,539.21

Monto Ejercido: \$377,894.64

Monto Cancelado: \$70,644.57

Anticipo otorgado: \$134,561.76

Anticipo Amortizado: \$134,561.76

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 24 de diciembre de 2013 al 21 de febrero de 2014


Periodo Real: 09 de abril de 2014 al 07 de abril de 2014




En estas fotografías se aprecia al acceso y el tejaban

Conclusiones:

Se constató que el trabajo se ejecutó de acuerdo a lo cobrado en el finiquito no teniendo nada que observar.

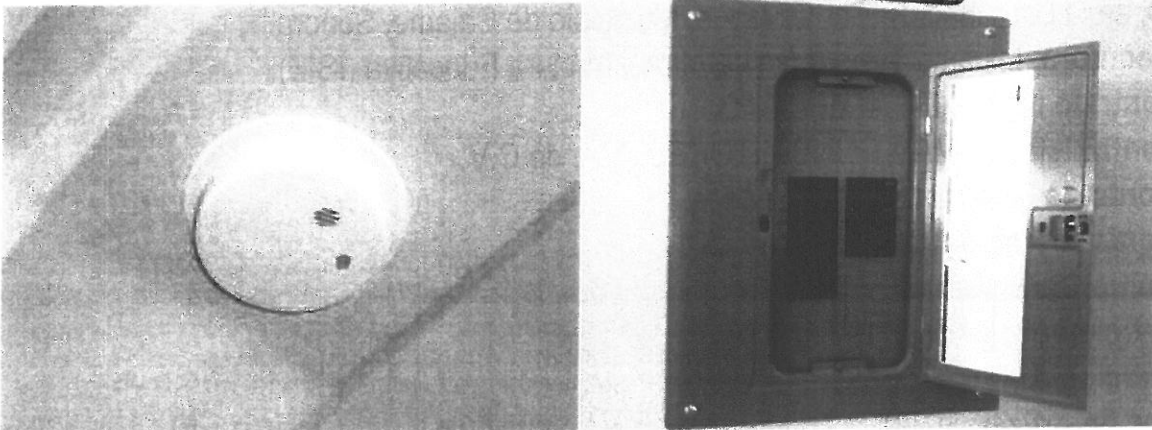

En estas fotografías se aprecia el detector de humo y el centro de carga.

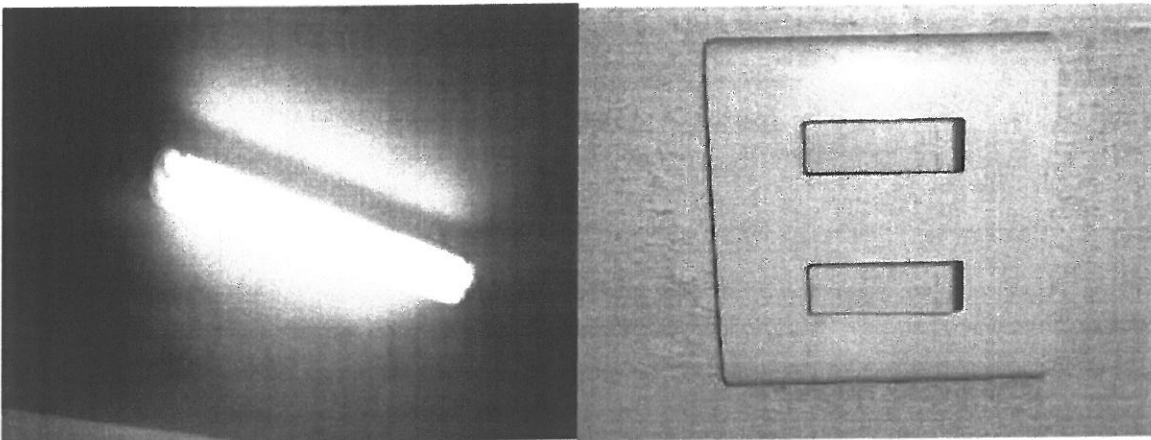

En estas fotografías se aprecian la luminaria y el apagador

Conclusiones:

Se constató que el trabajo se ejecutó de acuerdo a lo cobrado en el finiquito no teniendo nada que observar.

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

El día 26 de enero de 2019, se realizó el traslado a la Localidad San José de Bécum, Municipio de Bécum, para realizar la inspección física de la obra:

OBRA8: "(13-00-0066) Construcción de cerco perimetral y rehabilitación de cancha deportiva, en la Escuela Secundaria Técnica No.15, de la Localidad de San José de Bécum, Municipio de Bécum, Sonora.

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No.: ISIE-FAFEF-14-002

Contratista: USMAN CONSULTORES, S.A. de C.V

Monto de Contrato: \$792,117.81

Monto Ejercido: \$644,643.73

Monto Cancelado: \$147,474.08

Anticipo otorgado: \$237,635.34

Anticipo Amortizado: \$237,635.34

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 27 de enero de 2014 al 27 de marzo de 2014

Periodo Real: 09 de abril de 2014 al 22 de junio de 2015



En esta fotografía se muestra el acceso a la Escuela Secundaria Técnica No. 15



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio.- No. ECOP-DEC-0086/2019

Hermosillo, Sonora, a 18 de enero de 2019.

Asunto: Se le comisiona

Ing. Francisco Rivera Velázquez
Auditor Supervisor
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 11 Fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que en compañía del Ing. Alberto Álvarez Mendivil, efectúe la verificación a las obras anexas a este oficio correspondientes a la auditoría 1130 con título "Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas" ubicadas en los municipios de Bacum, Benito Juárez y Cajeme, Sonora.

Dicha comisión comprende del 23 al 26 enero del año en curso, para lo cual dispondrá de 3 días de viáticos y 1 día de gastos de camino con cargos a la partida del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe con las conclusiones respectivas.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección."


Lic. Fernando Herrera Saldate
El Director General

C.c.p. Ing. Héctor González Tirado. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G.
Lic. Edgar Prendas Sandoval. Director de Bienes Financieros y Materiales
Archivo.
EIEA/CLR/GVB

h o

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Centro de Gobierno Edificio Hermosillo segundo piso entre Blvd Paseo Río Sonora, Col. Vado del Río, C.P. 83280.

Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
HERMOSILLO, SONORA
