

P.D. 286  
mayo

**Lic. Fernando Herrera Saldate**  
**Director General de Evaluación y Control de Obra Pública**  
**Secretaría de la Contraloría General**

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-1002/2019, de fecha 21 de Mayo del 2019, con motivo de la verificación física de las obras ubicadas en los municipios de Villa Pesqueira, San Pedro de la Cueva, Bacanora, Arivechi, Yecora, y Rosario, Sonora.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:


El día 27 de Mayo del 2019, se realizó el traslado y revisión de las obras ubicada en las localidades de Nácori Grande, municipio de Villa Pesqueira, San Pedro de la Cueva, municipio de San Pedro de la Cueva y Bacanora, municipio de Bacanora.

**Nombre de la Obra:** REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI GRANDE.

**N° de Contrato:** SRSSA002353

**Ejecutora:** SECOP

**No. De Obra Asignada:** 19-RCS-008

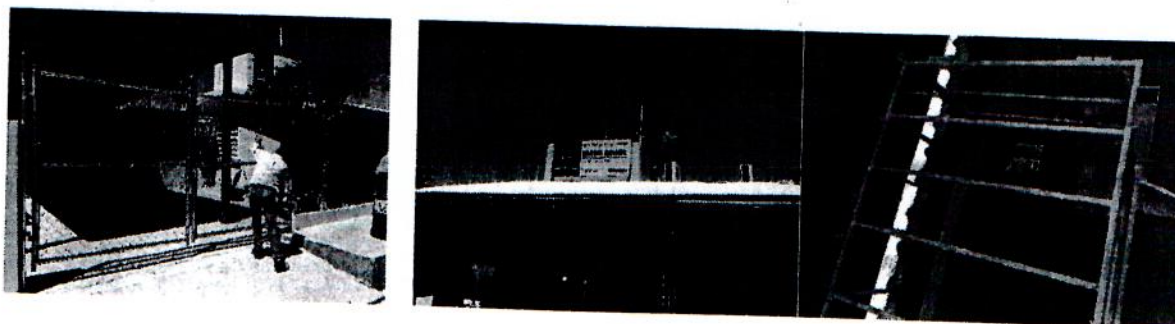

Al momento de la visita, no se encontró personal responsable de la ejecución de los trabajos que se estaban llevando a cabo. La rehabilitación del centro de salud se encuentra con un avance aproximado del 95% faltando aun algunos conceptos por ejecutar.


Personal del Centro de Salud manifiesta que no se realizó el desmontaje de un aparato de aire acondicionado de ventana y la reparación del muro, concepto que no se encuentra contemplado dentro del Catálogo de Conceptos.

**Nombre de la Obra:** REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LA CUEVA.

**N° de Contrato:** SRSSA002131

**Ejecutora:** CECOP

**No. De Obra Asignada:** 19-RCS-012

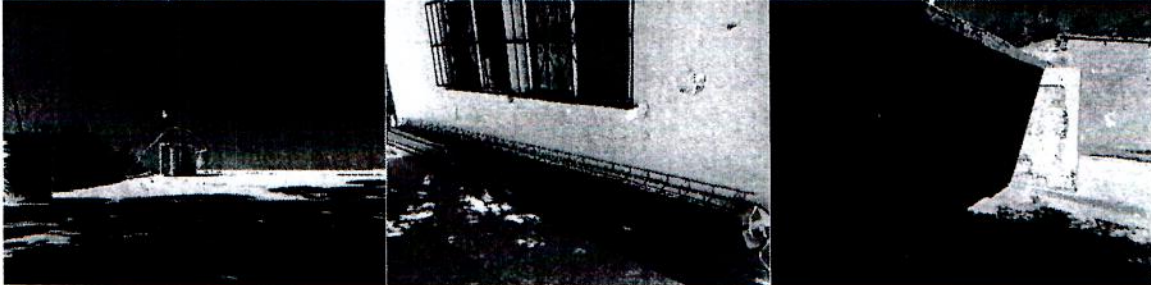

Al momento de la visita, no se encontró personal responsable de la ejecución de los trabajos de rehabilitación. La presidente municipal comentó que las actividades se suspendieron aproximadamente dos semanas atrás, con el objetivo de preparar la techumbre del tejaban.

Los trabajos de rehabilitación ejecutados son: construcción de la losa de concreto para la Caseta de Protección para los Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos, Rampa para personas con Capacidades Diferentes, Impermeabilización de Cubierta (losa de azotea) a base elastomérico Thermotec, construcción de pasillo, construcción de zapatas aisladas para tejaban, Desmontaje barandal de herrería.

Los trabajos de rehabilitación en interiores como lo son: baños, plafones, puertas, drenaje y pintura en general no se han iniciado.


Los trabajos se encuentran con un avance aproximado del 15%.

**Nombre de la Obra:** REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BACANORA.

**N° de Contrato:** SRSSA000352

**Ejecutora:** CECOP

**No. De Obra Asignada:** 19-RCS-056

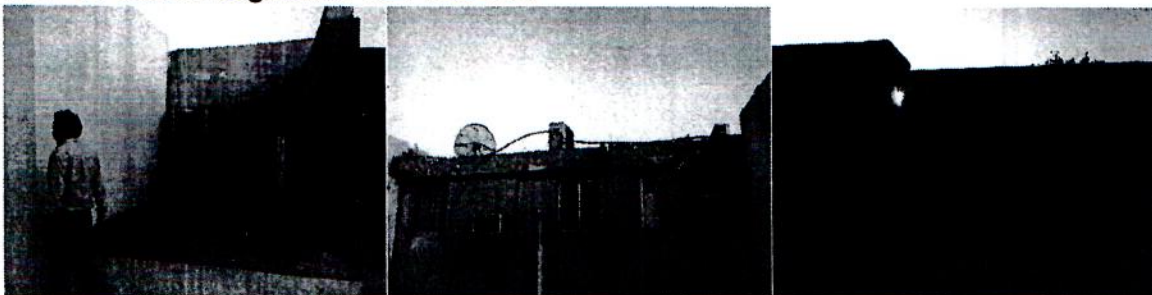

Al momento de la visita, los trabajos de rehabilitación aún no se habían iniciado.


El día 28 de Mayo del 2019, se realizó el traslado y revisión de las obras ubicada en las localidades de Arivechi y Tarachi ambos en el municipio de Arivechi y Maycoba, municipio de Yecora.

**Nombre de la Obra:** REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ARIVECHI.

**N° de Contrato:** SRSSA000270

**Ejecutora:** CECOP

**No. De Obra Asignada:** 19-RCS-055

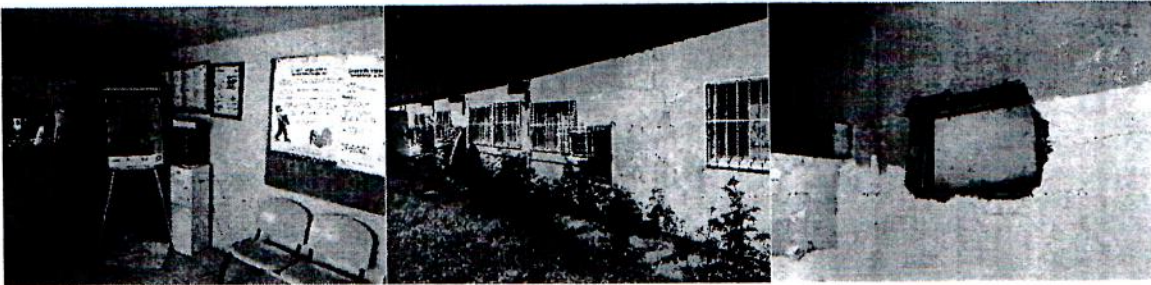


Al momento de la visita, los trabajos de rehabilitación aún no se habían iniciado.

**Nombre de la Obra:** REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TARACHI.

**N° de Contrato:** SRSSA000282

**Ejecutora:** CECOP

**No. De Obra Asignada:** 19-RCS-058

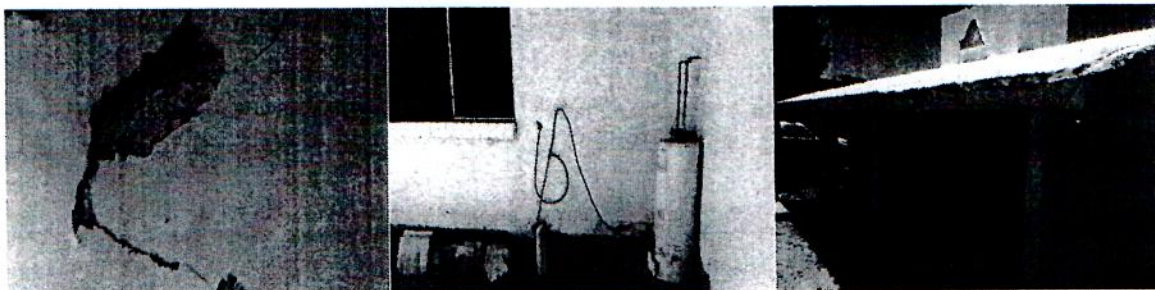


Al momento de la visita, los trabajos de rehabilitación aún no se habían iniciado.

**Nombre de la Obra:** REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MAYCOBA.

**N° de Contrato:** SRSSA002370

**Ejecutora:** CECOP

**No. De Obra Asignada:** 19-RCS-047

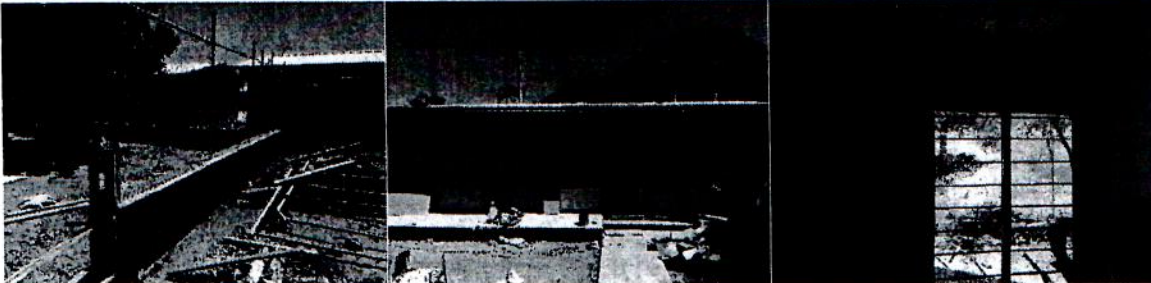

Al momento de la visita se estaba realizando los trabajos de rehabilitación de los siguientes conceptos: Construcción de cadena de remate inferior de cerco, construcción de puerta peatonal a base de malla ciclónica de 1.20X2.00 metros, puerta para vehículos a base de malla ciclónica de 1.20X2.00 metros

Los trabajos de rehabilitación ejecutados son: Cambios de luminarias, cambios de contactos y apagadores, Impermeabilización, cancelería y ventanas, cerco de malla ciclónica, muro de tabla roca, rehabilitación de lavabo, muebles sanitarios y accesorios para baños.

Los trabajos se encuentran con un avance aproximado del 75%.

El día 29 de Mayo del 2019, se realizó el traslado y revisión de las obras ubicada en las localidades de Nuri de Rosario.

**Nombre de la Obra:** HABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NURI.

**N° de Contrato:** SRSSA002213

**Ejecutora:** CECOP

**No. De Obra Asignada:** 19-RCS-029



Al momento de la visita, no se encontró personal responsable de la ejecución los trabajos de rehabilitación.

Los trabajos de rehabilitación ejecutados son: Rampas para personas con capacidades diferentes, impermeabilización de losa de azotea, protección para puertas a base de perfil P.T.R, protección para ventanas a base de cuadrado de 1/2", rehabilitación de cisterna, suministro e instalación de equipo hidroneumático, caseta de protección para residuos peligrosos biológicos infecciosos, accesorios para baños  
Los trabajos se encuentran con un avance aproximado del 90%.

Habiéndose concluido las actividades de verificación física de obras, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Se anexa copia de oficio de comisión.

**ATENTAMENTE**

*Ismael Soto Piri*  
**Ing. Ismael Soto Piri**



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública  
Oficio.- No. ECOP-DEC-1002/2019.

Asunto: Se le comisiona

Hermosillo, Sonora 21 de mayo del 2019  
2019: Año del combate a la corrupción  
"2019: Año de la Megarregión Sonora-Arizona".

**Ing. Ismael Soto Piri**  
Auditor Supervisor  
Presente.

Con fundamento en el Artículo 18 Fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que en compañía del Ing. Timoteo de Jesús Melquiades realice la verificación física de las obras anexas a este oficio, las obras están ubicadas en los municipios de Villa Pesqueira, San Pedro de la Cueva, Bacanora, Arivechi, Yecora y Rosario, Sonora.


Dicha comisión comprende del 27 al 29 de mayo del año en curso para lo cual dispondrá de 2 días viáticos y 1 día de gastos de camino con cargo a los Recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Toyota Hilux con placas VB-71-399, recorriendo 1,700 km de carretera pavimentada por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 27 de mayo a partir de las 8:00 horas entregándose al término de la comisión de acuerdo a las instrucciones giradas por esa unidad en su oportunidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente  
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

**Lic. Fernando Herrera Saldate**  
Director General

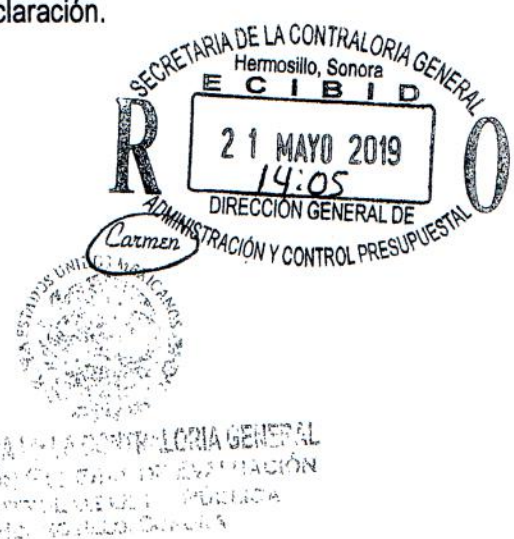

C.c.p. Ing. Héctor González Tirado. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente.  
Lic. Edgar Prendas Sandoval. Director de Recursos Financieros y Materiales. Presente.  
Archivo  
LMN/EIA/GVB

*LMN*





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Subsecretaría de Egresos

SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS

FECHA : 21 de mayo del 2019		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E501002133A1 375011 1911EM13 1060000900 1304E501002133A1 375021 1911EM13	
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de la Contraloría General			
UNIDAD RESPONSABLE : 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública			
UNIDAD EJECUTORA: 1304E501002133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P			
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: Ing. Ismael Soto Piri NIVEL: 8B No. DE EMPLEADO 37111			
PUESTO FUNCIONAL: Auditor Supervisor			
DESTINO: Villa Pesqueira, San Pedro de la Cueva, Bacanora, Arivechi, Yecora y Rosario, Sonora.			
MOTIVO: Se le comisiona para que en compañía del Ing. Timoteo de Jesús Melquiades realice la verificación física de las obras anexas a este oficio, las obras están ubicadas en los municipios de Villa Pesqueira, San Pedro de la Cueva, Bacanora, Arivechi, Yecora y Rosario, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DEC-1002/2019.			
PERIODO DE LA COMISIÓN: 27 al 29 de mayo del 2019		POR INSTRUCCIONES DE: Lic. Fernando Herrera Saldate Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.	
NÚMERO DE DÍAS	COSTO POR DÍA	TOTAL POR DÍA	
VIATICOS: 2 días	\$ 700.00	\$ 1,400.00	
GASTOS DE CAMINO: 1 día	\$ 300.00	\$ 300.00	
SUMA TOTAL:		\$ 1,700.00	
OBSERVACIONES: con cargo a los recursos del 2 al millar estatal			
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$ 1,700.00 (mil setecientos pesos 00/100 M.N.)			
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO	SOLICITA - RECIBE	AUTORIZA	
<i>Ismael Soto Piri</i> ING. ISMAEL SOTO PIRI RFC Sopi870818S68	ING. HÉCTOR GONZÁLEZ TIRADO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	<del>LIC. FERNANDO HERRERA SALDATE DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.</del>	

W



ANEXO AL OFICIO ECOP-DEC-1002/20019

NO DE OBRA ASIGNADA	CLUES	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
19-RCS-008	SRSSA002353	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI GRANDE	NACORI GRANDE	VILLA PESQUEIRA
19-RCS-012	SRSSA002131	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA
19-RCS-056	SRSSA000352	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BACANORA	BACANORA	BACANORA
19-RCS-055	SRSSA000270	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ARIVECHI	ARIVECHI	ARIVECHI
19-RCS-058	SRSSA000282	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TARACHI	TARACHI	ARIVECHI
19-RCS-047	SRSSA002370	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MAYCOBA	MAYCOBA	YECORA
19-RCS-029	SRSSA002015	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NURI	NURI	ROSARIO

3
