

**Lic. Fernando Herrera Saldate**  
**Director General de Evaluación y Control de Obra Pública**  
**Secretaría de la Contraloría General**

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-1341/2019, de fecha 08 de julio de 2019, se me comisiona para que en compañía del Ing. Fernando Escobas López, se efectúe la verificación física de las obras, correspondiente a la Auditoría No. 1374-DS-GF con título " Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Santana y Caborca, Sonora".

**El día 11 de julio de 2019, se realizó el traslado a la Localidad Caborca, Municipio de Caborca, Sonora, para realizar la inspección física de la obra:**

**DATOS GENERALES DE LA OBRA:**

**OBRA:** "Obra complementaria para la construcción de Centro de Atención Temprana en el Distrito de Altar, con sede en el Municipio de Caborca, Sonora"

**Ejecutora:** Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

**Contrato No.:** SIDUR-ED-16-440

**Contratista:** ZERO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

**Monto de Contrato:** \$2'113,205.65

**Monto Ejercido:** \$2'113,205.65

**Monto Cancelado:** \$0.00


**Anticipo otorgado:** \$0.00

**Periodo de ejecución Contratado:** 29 de diciembre de 2016 al 27 de enero de 2017


**Periodo Real:** 22 de diciembre de 2016 al 29 de diciembre de 2016.



En esta fotografía se muestra el acceso al Centro de Atención Temprana en el Distrito de Altar, con sede en el Municipio de Caborca, Sonora.

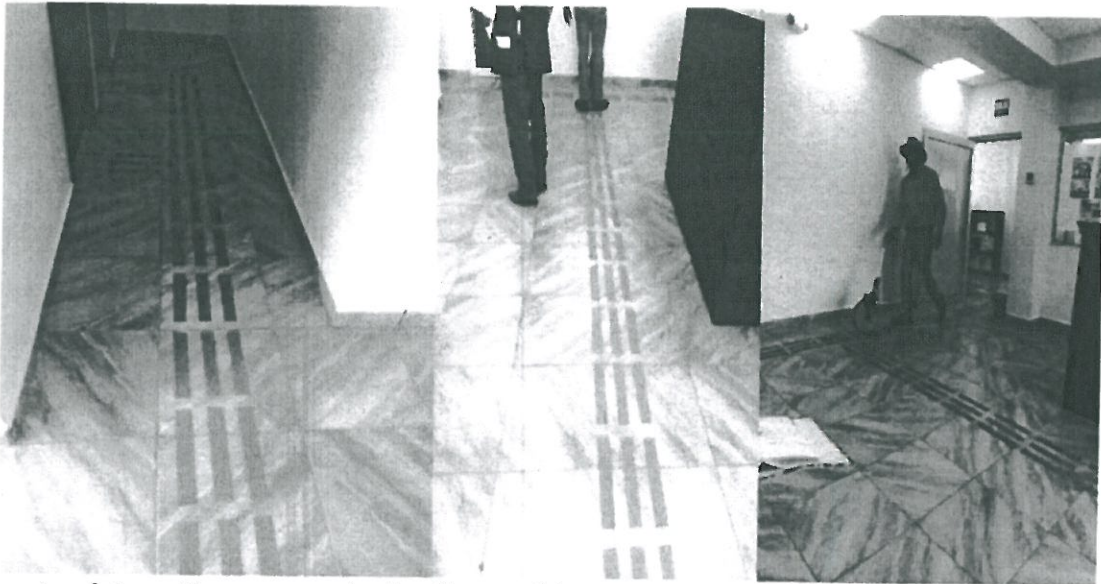


En estas fotografías se muestra las tiras antiderrapantes de polipropileno de 2" de ancho de la marca 3M, a razón de 2.7 mts. por ml separadas por 5 cms. en ambos sentidos (ancho de tiras de 30cms. @ 5 cms.), incluye materiales y desperdicios, trazos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

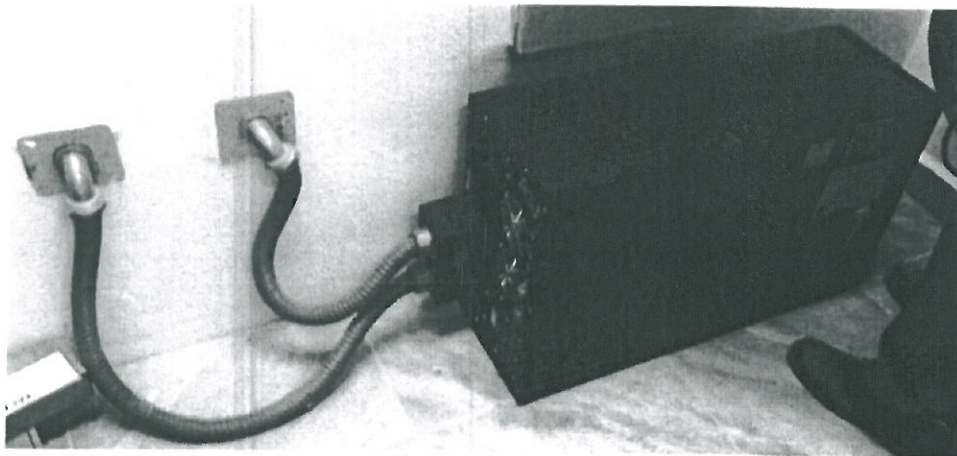


En esta fotografía se muestra el sistema de fuerza de ininterrumpible marca EATON, modelo 9PX10KSP (9PX SPLIT-PHASE, 208/120 VOLTS INPUT/OUTPUT) de 10KVA/9KW de capacidad, factor de potencia del 0.9 tecnología ON LINE doble conversión, cero tiempo de transferencia en caso de una falla eléctrica, salida de onda senoidal pura, eficiencia de hasta in 97% en modo de alta eficiencia, 94% típico, interface gráfica LCD, incluye tarjeta SNMP (NETWORK-MS), incluye material y mano de obra.

✓

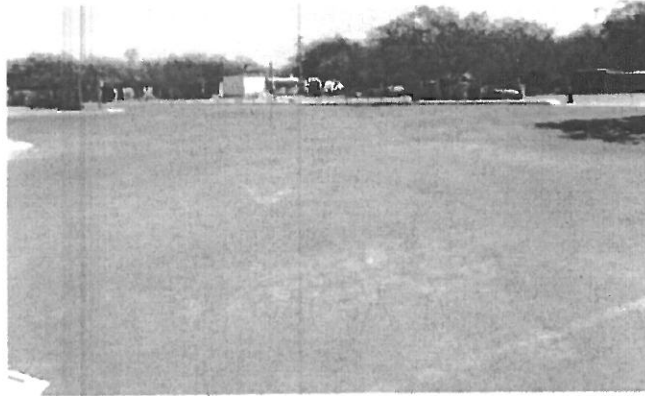

En esta fotografía se muestra la carpeta asfáltica caliente de 5cms de espesor compactos al 95% de su P.V.S.M.

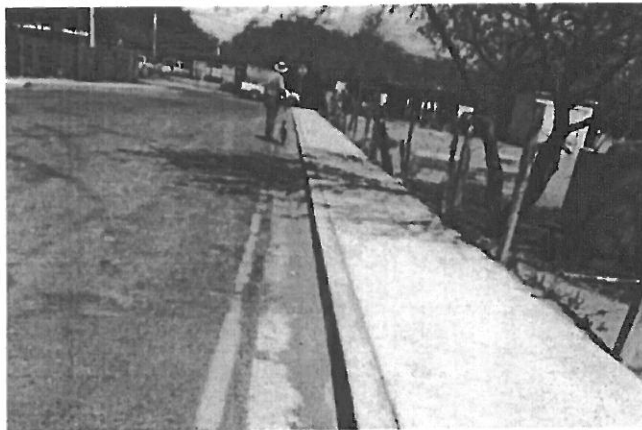


En esta fotografía se muestra la guarnición tipo "L" de concreto hidráulico premezclado de  $f_c=200\text{kg/cm}^2$  T.M.A. de 131 LTS/ML, de sección 15 X 35 X 60 X 18 cms.



En estas fotografías se muestra banqueta de 8cms, de espesor de concreto hidráulico premezclado de  $f_c=200\text{kg/cm}^2$ , T.M.A.  $\frac{3}{4}$ ", armada con malla electrosoldada 6x6 10/10.



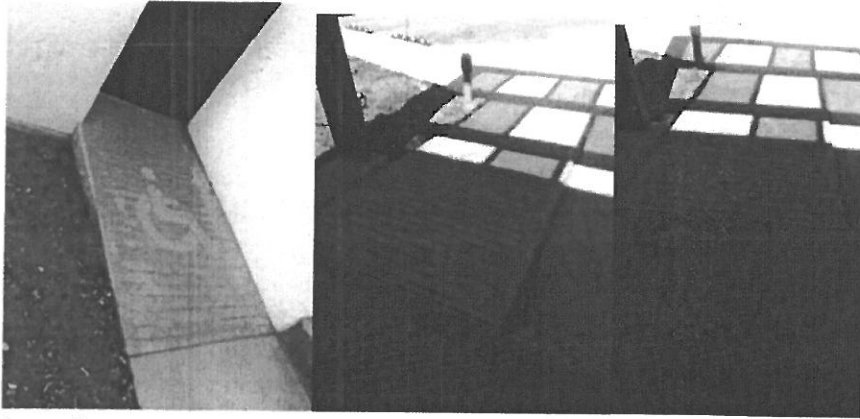

En estas fotografías se muestra rampas de concreto salado  $f_c=200\text{kg/cm}^2$ , T.M.A.  $\frac{3}{4}$ ", de 2.40 de base a 1.20 mts, de fondo y 1.20 mts de largo mts con logotipo de discapacitados con molde y en banquetas.



En estas fotografías se muestra topes fabricados a base de neopreno en estacionamiento.

**Conclusiones:**

La obra se encuentra terminada, a la fecha se están realizando las cuantificaciones para la elaboración del acta de sitio y poder determinar si existen diferencias entre los conceptos pagados contra lo verificado en campo.

Posteriormente nos trasladamos a la Localidad Santa Ana, Municipio de Santana, Sonora, para pernoctar y el día 12 de julio de 2019, se realizó la inspección física de la obra:

**DATOS GENERALES DE LA OBRA:**

**OBRA:** "Pavimentación con carpeta asfáltica de Av. Independencia entre calle 5 de mayo y Blvd. Luis Donald Colosio, Av. López Rayón entre Agustín Rodríguez y calle 15 y Av. Abasolo entre Agustín Rodríguez y calle 15 en la Localidad y Municipio de Santa Ana, Sonora."

**Ejecutora:** Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

**Contrato No.:** SIDUR-PF-14-269

**Contratista:** EDIFICACIONES Y PROYECTOS MOCELIK, S.A. DE C.V.

**Monto de Contrato:** \$8'855,923.60

**Monto Ejercido:** \$9'308,246.73

**Monto Cancelado:** \$0.00

**Anticipo otorgado:** \$3'542,369.44

**Anticipo Amortizado:** \$3'542,369.44

**Por Amortizar:** \$0.00

**Periodo de ejecución Contratado:** 23 de diciembre de 2014 al 20 de junio de 2015


**Periodo Real:** 08 de julio de 2016 al 30 de septiembre de 2016.



En esta fotografía se muestra el inicio de la pavimentación de la Av. Independencia entre calle 5 de mayo y Blvd. Luis Donald Colosio, en la Localidad y Municipio de Santa Ana, Sonora.



En esta fotografía se muestra el inicio de la pavimentación de la Av. López Rayón entre Agustín Rodríguez y calle 15, en la Localidad y Municipio de Santa Ana, Sonora

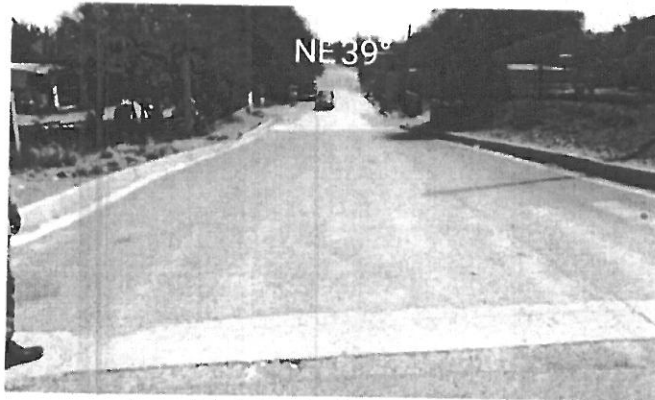

En esta fotografía se muestra el inicio de la pavimentación de la Av. Abasolo entre Agustín Rodríguez y calle 15, en la Localidad y Municipio de Santa Ana, Sonora

**Conclusiones:**

La obra se encuentra terminada, a la fecha se están realizando las cuantificaciones para la elaboración del acta de sitio y poder determinar si existen diferencias entre los conceptos pagados contra lo verificado en campo.

**Pernoctando en la Localidad Santa Ana, Municipio de Santana, Sonora, para posteriormente trasladarnos el día 13 de julio de 2019, a la Ciudad de Hermosillo, Sonora.**

**Ing. Francisco Rivera Velázquez**  
**Auditor Encargado**
