



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

Asunto: Se le comisiona

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio. - No. ECOP-DE-2216/2019.
Hermosillo, Sonora, 29 de noviembre del 2019
"2019: Año de la Megarregión Sonora-Arizona".
2019: Año del combate a la corrupción"

Ing. Francisco Rivera Velázquez
Auditor Encargado.
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 18 Fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que efectúe la verificación física de las obras anexas a este oficio, en seguimiento a la auditoría No. 1350-DS-GF con título "Recursos del Programa Escuelas al Cien", las obras se encuentran ubicadas en el municipio de Nogales, Sonora.

Dicha comisión comprende del 2 al 6 de diciembre del año en curso, para lo cual dispondrá de 4 días de viáticos y 1 día de gastos de camino con cargos a la partida del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en un vehículo Dodge con placas VB71-397, recorriendo aproximadamente 800 kms de carretera pavimentada, cruzando 4 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 2 de diciembre a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión de acuerdo a las instrucciones giradas por esa unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección."


Lic. Fernando Herrera Saldate
El Director General

C.c.p. Ing. Héctor González Tirado. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G.
Lic. Edgar Prendas Sandoval. Director de Bienes Financieros y Materiales
Archivo.
EIEA/LMN/GVB

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
Hermosillo, Sonora
RECIBID
02 DIC. 2019
850
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
HERMOSILLO, SONORA



Anexo de oficio no. ECOP-DE-2216/2019

CONTRATO	DESCRIPCION	MONTO+ IVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	Fecha
ISIE-FP100-16-063	(15-FP-0014) Rehabilitación de firmes, aplanado, pintura, vidrios, y cancelería, red sanitaria, muebles, pintura, luminarias, equipo de aires, rampas y andadores, bebederos, letrina en la escuela primaria Francisco Peralta Galvez de la localidad y municipio de nogales, sonora	\$ 1,204,600.96	Nogales	Heroica Nogales	lunes, 2 de diciembre de 2019
ISIE-FP100-16-278	(16-FP-0254) Rehabilitación del plantel en jardín de niños Gustavo Diaz Ordaz, de la localidad de Heroica Nogales y municipio de Nogales, Sonora	\$ 618,593.39	Nogales	Heroica Nogales	martes, 3 de diciembre de 2019
ISIE-FP100-16-278	(16-FP-0255) Rehabilitación del plantel en jardín de niños Manuel Avila Camacho, de la localidad de Heroica Nogales y municipio de Nogales, Sonora	\$ 317,704.25	Nogales	Heroica Nogales	martes, 3 de diciembre de 2019
ISIE-FP100-16-278	(16-FP-0252) Rehabilitación del plantel en jardín de niños Luis Basurto Guzman, de la localidad de Heroica Nogales y municipio de Nogales, Sonora	\$ 569,943.31	Nogales	Heroica Nogales	martes, 3 de diciembre de 2019
ISIE-FP100-17-064	(16-FP-0259) Construcción de letrina, rehabilitación de cubierta, rehabilitación de pisos, impermeabilización, aires acondicionados, rehabilitación de andadores y rehabilitación de cerco perimetral en jardín de niños Villa Sonora, de la localidad y municipio de Nogales, Sonora.	\$ 1,099,970.85	Nogales	Heroica Nogales	miércoles, 4 de diciembre de 2019
ISIE-FP100-18-300	(16-FP-0262) IMPERMEABILIZACION, PINTURA GENERAL, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE CISTERNA, EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO ROLDAN, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	\$ 606,041.30	NOGALES	HEROICA NOGALES	miércoles, 4 de diciembre de 2019
ISIE-FP100-18-336	(16-FP-0251) CONSTRUCCION DE BODEGA, REHABILITACION DE AULAS, COMEDOR, SERVICIOS SANITARIOS, AIRE ACONDICIONADO Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	\$ 1,094,373.12	NOGALES	HEROICA NOGALES	miércoles, 4 de diciembre de 2019
ISIE-FP100-18-337	(16-FP-0264) REHABILITACION DE AJUAS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, AIRE ACONDICIONADO Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS ALAMOS, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	\$ 1,730,024.23	NOGALES	HEROICA NOGALES	jueves, 5 de diciembre de 2019
ISIE-FP100-18-042	(16-FP-0433) REHABILITACION DE CUBIERTA EN EDIFICIO 1A, REHABILITACION DE MUROS, APLICACION DE PINTURA, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, REHABILITACION DE CUBIERTA EN EDIFICIO 2B, SUSTITUCION DE BASTIDORES Y PUERTAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, EN ESCUELA PRIMARIA VICENTA OCARANZA NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.	\$ 868,327.79	NOGALES	HEROICA NOGALES	jueves, 5 de diciembre de 2019
ISIE-FP100-16-073	(15-FP-0079) CONSTRUCCION DE UN AULA, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y OBRA EXTERIOR, EN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (UPN) UNIDAD 26 "C" EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.	\$ 978,197.18	NOGALES	NOGALES	jueves, 5 de diciembre de 2019
ISIE-FP100-16-277	(16-FP-0265) REHABILITACION DEL PLANTEL EN JARDIN DE NIÑOS FRONTERA, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE PORTICO DE ENTRADA, REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE CISTERNA EQUIPADA Y PINTURA GENERAL.	\$ 1,089,802.32	NOGALES	HEROICA NOGALES	viernes, 6 de diciembre de 2019

15 de No
Diciembre

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-2216/2019, de fecha 29 de diciembre de 2019, se me comisiona para que se efectúe la verificación física de las obras, en seguimiento a la Auditoría No. 1350-DS-GF con título "Recursos del Programa Escuelas al Cien", las obras se encuentran ubicadas en el Municipios de Nogales, Sonora".

El día 02 de diciembre de 2019, nos trasladamos a la Localidad de la Heroica Nogales, Municipio de Nogales e iniciamos con la inspección física de la obra:

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

OBRA: "Rehabilitación de firmes, aplanados, pintura, vidrios y cancelería, red sanitaria, muebles, pintura, luminarias, equipo de aires, rampas y arñadores, bebederos, letrina en la Escuela Primaria Francisco Peralta Gálvez de la Localidad de la Heroica Nogales del Municipio de Nogales, Sonora."

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No.: ISIE-FP100-16-063

Contratista: PROMOCIONES TESIA, S.A. de C.V.

Monto de Contrato: \$1'344,034.52

Monto Ejercido: \$1'204,600.96

Anticipo otorgado: \$403,210.36

Anticipo Amortizado: \$403,210.36

Periodo de ejecución Contratado: 03 de marzo de 2016 al 31 de mayo de 2016

Periodo Real: 28 de abril de 2016 al 26 de julio de 2016



En esta fotografía se muestra el acceso a la Escuela Primaria Francisco Peralta Gálvez de la Localidad de la Heroica Nogales del Municipio de Nogales, Sonora.

Conclusiones:

Los trabajos de rehabilitación de la obra se encuentran terminados, a la fecha se están realizando las cuantificaciones para la elaboración del acta de sitio y poder determinar si existen diferencias entre los conceptos pagados contra lo verificado en campo.

El día 03 de diciembre de 2019, continuamos con la revisión de la obra:

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

OBRA: "Rehabilitación del plantel en Jardín de Niños Gustavo Díaz Ordaz, de la Localidad de la Heroica Nogales del Municipio de Nogales, Sonora."

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No.: ISIE-FP100-16-278

Contratista: SENTIDO VIAL, S.A. de C.V.

Monto de Contrato: \$641,447.15

Monto Ejercido: \$618,593.39

Anticipo otorgado: \$192,434.14

Anticipo Amortizado: \$192,434.14

Periodo de ejecución Contratado: 10 de agosto de 2016 al 08 de octubre de 2016

Periodo Real: 30 de agosto de 2016 al 05 de noviembre de 2016



En esta fotografía se muestra el acceso del plantel de Jardín de Niños Gustavo Díaz Ordaz de la Localidad de la Heroica Nogales del Municipio de Nogales, Sonora.

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada, a la fecha se están realizando las cuantificaciones para la elaboración del acta de sitio y poder determinar si existen diferencias entre los conceptos pagados contra lo verificado en campo.

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

OBRA: "Rehabilitación del plantel en Jardín de Niños Manuel Ávila Camacho, de la Localidad de la Heroica Nogales del Municipio de Nogales, Sonora."

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No.: ISIE-FP100-16-278

Contratista: SENTIDO VIAL, S.A. de C.V.

Monto de Contrato: \$337,055.37


Monto Ejercido: \$317,704.25

Anticipo otorgado: \$101,116.61

Anticipo Amortizado: \$101,116.61

Periodo de ejecución Contratado: 10 de agosto de 2016 al 08 de octubre de 2016

Periodo Real: 30 de agosto de 2016 al 10 de noviembre de 2016.

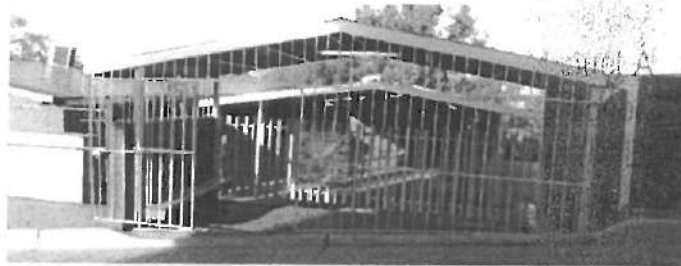

En esta fotografía se muestra el acceso del plantel en Jardín de Niños Manuel Ávila Camacho de la Localidad de la Heroica Nogales del Municipio de Nogales, Sonora.

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada, a la fecha se están realizando las cuantificaciones para la elaboración del acta de sitio y poder determinar si existen diferencias entre los conceptos pagados contra lo verificado en campo.

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

OBRA: "Rehabilitación del plantel en Jardín de Niños Luis Basurto Guzmán, de la Localidad de la Heroica Nogales del Municipio de Nogales, Sonora."

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No.: ISIE-FP100-16-278

Contratista: SENTIDO VIAL, S.A. de C.V.

Monto de Contrato: \$604,972.19

Monto Ejercido: \$569,943.31

Anticipo otorgado: \$181,491.66

Anticipo Amortizado: \$181,491.66

Periodo de ejecución Contratado: 10 de agosto de 2016 al 08 de octubre de 2016

Periodo Real: 30 de agosto de 2016 al 28 de octubre de 2016



En esta fotografía se muestra el acceso plantel en Jardín de Niños Luis Basurto Guzmán de la Localidad de la Heroica Nogales del Municipio de Nogales, Sonora.

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada, a la fecha se están realizando las cuantificaciones para la elaboración del acta de sitio y poder determinar si existen diferencias entre los conceptos pagados contra lo verificado en campo.

El día 04 de diciembre de 2019, continuamos con la revisión de la obra:

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

OBRA: "Construcción de letrina, rehabilitación de cubierta, rehabilitación de pisos, impermeabilización, aires acondicionados, rehabilitación de andadores y rehabilitación de cerco perimetral en Jardín de Niños Villa Sonora de la Localidad de la Heroica Nogales del Municipio de Nogales, Sonora."

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No.: ISIE-FP100-17-064

Contratista: CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, R.G., S.A. de C.V.

Monto de Contrato: \$1'099,970.85

Monto Ejercido: \$992,310.26

Anticipo otorgado: \$329,991.26

Anticipo Amortizado: \$329,991.26

Periodo de ejecución Contratado: 18 de agosto de 2017 al 26 de octubre de 2017

Periodo Real: 07 de abril de 2018 al 13 de junio de 2018



En esta fotografía se muestra el acceso del plantel de Jardín de Niños Villa Sonora de la Localidad de la Heroica Nogales del Municipio de Nogales, Sonora.

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada, a la fecha se están realizando las cuantificaciones para la elaboración del acta de sitio y poder determinar si existen diferencias entre los conceptos pagados contra lo verificado en campo.

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

OBRA: "Impermeabilización, pintura general, rehabilitación del sistema eléctrico, rehabilitación menor de servicios sanitarios y construcción de cisterna, en el Jardín de Niños Rosario Roldan de la Localidad de la Heroica Nogales del Municipio de Nogales, Sonora."

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No.: ISIE-FP100-18-300

Contratista: Ing. Erick Rivera Arvizu

Monto de Contrato: \$623,431.65

Monto Ejercido: \$606,041.30

Anticipo otorgado: \$187,029.50

Anticipo Amortizado: \$187,029.50

Periodo de ejecución Contratado: 20 de septiembre de 2018 al 31 de octubre de 2018

Periodo Real: 20 de septiembre de 2018 al 31 de octubre de 2018



En esta fotografía se muestra el acceso del plantel de Jardín de Niños Rosario Roldan de la Localidad de la Heroica Nogales del Municipio de Nogales, Sonora.

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada, a la fecha se están realizando las cuantificaciones para la elaboración del acta de sitio y poder determinar si existen diferencias entre los conceptos pagados contra lo verificado en campo.

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

OBRA: "Construcción de bodega, rehabilitación de aulas, comedor, servicios sanitarios, aire acondicionado y obra exterior, en el Jardín de Niños 5 de Mayo de la Localidad de la Heroica Nogales del Municipio de Nogales, Sonora."

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No.: ISIE-FP100-18-336

Contratista: ESTUDIO 4D, S.A. de C.V.

Monto de Contrato: \$1'094,373.12

Monto Ejercido: \$1'054,345.16

Anticipo otorgado: \$328,311.93

Anticipo Amortizado: \$328,311.93

Periodo de ejecución Contratado: 04 de octubre de 2018 al 13 de octubre de 2018

Periodo Real: 24 de noviembre de 2018 al 03 de enero de 2019



En esta fotografía se muestra el acceso del plantel de Jardín de Niños 5 de Mayo de la Localidad de la Heroica Nogales del Municipio de Nogales, Sonora.

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada, a la fecha se están realizando las cuantificaciones para la elaboración del acta de sitio y poder determinar si existen diferencias entre los conceptos pagados contra lo verificado en campo.

El día 05 de diciembre de 2019, continuamos con la revisión de la obra:

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

OBRA: "Rehabilitación de aulas y de servicios sanitarios, aire acondicionado y obra exterior en Jardín de Niños Álamos de la Localidad de la Heroica Nogales del Municipio de Nogales, Sonora."

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No.: ISIE-FP100-18-337

Contratista: ESTUDIO 4D, S.A. de C.V.

Monto de Contrato: \$1'730,024.23

Monto Ejercido: \$1'595,614.02

Anticipo otorgado: \$519,007.27

Anticipo Amortizado: \$519,007.27

Periodo de ejecución Contratado: 04 de octubre de 2018 al 13 de noviembre de 2018

Periodo Real: 24 de noviembre de 2018 al 01 de marzo de 2019



En esta fotografía se muestra el acceso del plantel de Jardín de Niños Álamos de la Localidad de la Heroica Nogales del Municipio de Nogales, Sonora.

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada, a la fecha se están realizando las cuantificaciones para la elaboración del acta de sitio y poder determinar si existen diferencias entre los conceptos pagados contra lo verificado en campo.

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

OBRA: "Rehabilitación de cubierta en edificio 1A, rehabilitación de muros, aplicación de pintura, rehabilitación de instalaciones eléctricas, rehabilitación de cubierta en edificio 2B, sustitución de bastidores y puertas, rehabilitación de servicios sanitarios, en escuela primaria Vicenta Ocaranza No. 1, de la Localidad de la Heroica Nogales del Municipio de Nogales, Sonora."

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No.: ISIE-FP100-18-042

Contratista: Ing. Erick Rivera Arvizu

Monto de Contrato: \$868,441.55

Monto Ejercido: \$868,327.79

Anticipo otorgado: \$260,532.47

Anticipo Amortizado: \$260,532.47

Periodo de ejecución Contratado: 23 de marzo de 2018 al 20 de junio de 2018

Periodo Real: 26 de abril de 2018 al 24 de julio de 2018



En esta fotografía se muestra el acceso de la escuela primaria Vicenta Ocaranza No. 1 de la Localidad de la Heroica Nogales del Municipio de Nogales, Sonora.

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada, a la fecha se están realizando las cuantificaciones para la elaboración del acta de sitio y poder determinar si existen diferencias entre los conceptos pagados contra lo verificado en campo.

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

OBRA: "Construcción de un aula, equipo de aire acondicionado y obra exterior, en Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad 26 "C", de la Localidad de la Heroica Nogales del Municipio de Nogales, Sonora."

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No.: ISIE-FP100-16-073

Contratista: TECNOVIAS DE NOGALES, S.A. de C.V.

Monto de Contrato: \$1'006,451.41


Monto Ejercido: \$978,197.18

Anticipo otorgado: \$301,935.42

Anticipo Amortizado: \$301,935.42

Periodo de ejecución Contratado: 30 de marzo de 2016 al 27 de junio de 2016

Periodo Real: 28 de abril de 2016 al 26 de septiembre de 2016

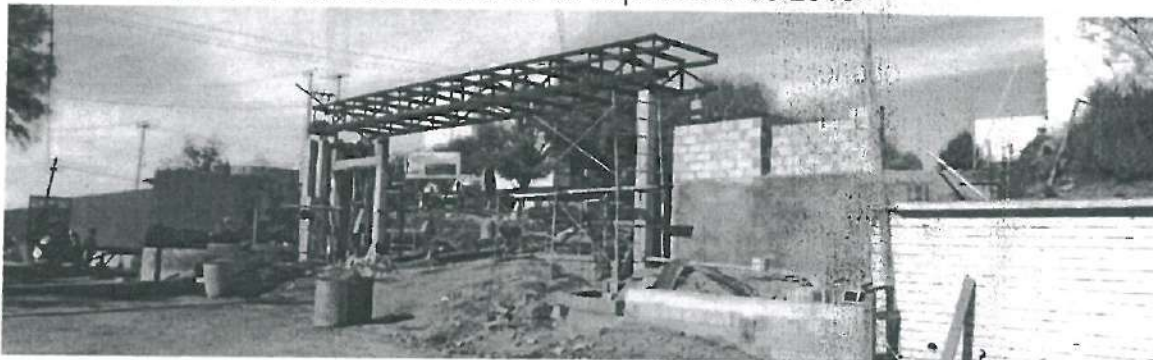

En esta fotografía se muestra el acceso de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad 26 "C", de la Localidad de la Heroica Nogales del Municipio de Nogales, Sonora.

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada, a la fecha se están realizando las cuantificaciones para la elaboración del acta de sitio y poder determinar si existen diferencias entre los conceptos pagados contra lo verificado en campo.

El día 06 de diciembre de 2019, continuamos con la revisión de la obra:

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

OBRA: "Rehabilitación del plantel en Jardín de Niños Frontera, de la Localidad de la Heroica Nogales del Municipio de Nogales, Sonora. Consistente en: Construcción de pórtico de entrada, reparación del sistema eléctrico, suministro e instalación de lámparas y luminarias, impermeabilización de techos, reparación de servicios sanitarios, cerco perimetral, construcción de cisterna equipada y pintura general.

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No.: ISIE-FP100-16-277

Contratista: ADCAMO CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS, S.A. de C.V.

Monto de Contrato: \$1'089,802.32

Anticipo Amortizado: \$519,007.27

Periodo de ejecución Contratado: 10 de agosto de 2016 al 08 de octubre de 2016

Periodo Real: 02 de septiembre de 2016 al 31 de octubre de 2016



En esta fotografía se muestra el acceso del plantel de Jardín de Niños Frontera de la Localidad de la Heroica Nogales del Municipio de Nogales, Sonora.

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada, a la fecha se están realizando las cuantificaciones para la elaboración del acta de sitio y poder determinar si existen diferencias entre los conceptos pagados contra lo verificado en campo.

Ing. Francisco Rivera Velázquez
Auditor Encargado



Asunto: Se le comisiona

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio. - No. ECOP-DE-2216/2019.
Hermosillo, Sonora, 29 de noviembre del 2019
"2019: Año de la Megarregión Sonora-Arizona".
2019: Año del combate a la corrupción"

Ing. Francisco Rivera Velázquez
Auditor Encargado.
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 18 Fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que efectúe la verificación física de las obras anexas a este oficio, en seguimiento a la auditoría No. 1350-DS-GF con título "Recursos del Programa Escuelas al Cien", las obras se encuentran ubicadas en el municipio de Nogales, Sonora.

Dicha comisión comprende del 2 al 6 de diciembre del año en curso, para lo cual dispondrá de 4 días de viáticos y 1 día de gastos de camino con cargos a la partida del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en un vehículo Dodge con placas VB71-397, recorriendo aproximadamente 800 kms de carretera pavimentada, cruzando 4 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 2 de diciembre a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión de acuerdo a las instrucciones giradas por esa unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reección."

Lic. Fernando Herrera Saldate
El Director General

C.c.p. Ing. Héctor González Tirado. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G.
Lic. Edgar Prendas Sandoval. Director de Bienes Financieros y Materiales
Archivo.
EIEA/LMN/GVB

h



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA

