



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio. - No. ECOP-DE-0015/2020.
Hermosillo, Sonora, 10 de enero del 2020

Asunto: Se le comisiona

Ing. Francisco Rivera Velázquez
Auditor Encargado.
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 18 Fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que en compañía del Ing. José Alfredo Cota Valdez efectúe la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondientes a la auditoría No. 05- FORTALECE17SIDUR/2018, las obras están ubicadas en Guaymas y Ciudad Obregón, Sonora.

Dicha comisión comprende del 15 al 18 de enero del año en curso, para lo cual dispondrá de 3 días de viáticos y 1 día de gastos de camino con cargos a la partida del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en un vehículo Dodge con placas VB71-391, recorriendo aproximadamente 900 kms de carretera pavimentada, cruzando 4 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 15 de enero a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión de acuerdo a las instrucciones giradas por esa unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección."

Lic. Fernando Herrera Saldate
El Director General

C.c.p. Ing. Héctor González Tirado. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G.
Lic. Edgar Prendas Sandoval. Director de Bienes Financieros y Materiales
Archivo.
EIEA/LMN/GVB



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
HERMOSILLO, SONORA



Anexo a oficio No. ECOP-DE-0015/2020
 Secretaría General del Estado de Sonora
 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública

No.	Descripción de la obra	Título de la observación	Localidad / Municipio	Fecha / Hora Lugar de Reunion
1	Construcción de Parque Recreativo de Skateboarding en la Localidad de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora. Contrato No.: SIDUR-PF-17-140 Contratista: CSG INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	12 Deficiencias en la Ejecución y conclusión de los trabajos.	Guaymas Guaymas	15/ene/2020 10:00 En la Obra
2	Construcción de Canchas y Juegos Infantiles en el Malecón Turístico de la Localidad de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora. Contrato No.: SIDUR-PF-17-140 Contratista: CSG INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	12 Deficiencias en la Ejecución y conclusión de los trabajos.	Guaymas Guaymas	15/ene/2020 11:00 En la Obra
3	Construcción de Parque Malecón Turístico de la Localidad de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora. Contrato No.: SIDUR-PF-17-109 Contratista: DESARROLLO Y TECNOLOGÍA GARELLI, S.A. DE C.V.	12 Deficiencias en la Ejecución y conclusión de los trabajos.	Guaymas Guaymas	15/ene/2020 12:00 En la Obra
4	Construcción de Teatro al Aire Libre en el Malecón Turístico de la Localidad de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora. Contrato No.: SIDUR-PF-17-128 Contratista: DISTRIBUCIONES REMCCA, S.A. DE C.V.	08 Conceptos de obra pagados no ejecutados. 12 Deficiencias en la Ejecución y conclusión de los trabajos.	Guaymas Guaymas	15/ene/2020 13:00 En la Obra
5	Rehabilitación de Plaza Principal en la Localidad de San José de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora. Contrato No.: SIDUR-PF-17-109 Contratista: DESARROLLO Y TECNOLOGÍA GARELLI, S.A. DE C.V.	12 Deficiencias en la Ejecución y conclusión de los trabajos.	San José de Guaymas Guaymas	15/ene/2020 15:00 En la Obra
6	Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Rural de la Localidad de Pueblo Yaqui, Municipio de Cajeme, Sonora. Contrato No.: SIDUR-PF-17-203 Contratista: TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.	12 Deficiencias en la Ejecución y conclusión de los trabajos.	Pueblo Yaqui C. Obregón	16/ene/2020 08:00 En la Obra
7	Construcción de Cancha de Fútbol 7 en la Localidad de Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora. Contrato No.: SIDUR-PF-17-157 Contratista: DCR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V.	12 Deficiencias en la Ejecución y conclusión de los trabajos.	Cajeme C. Obregón	16/ene/2020 12:00 En la Obra
8	Construcción de Cancha De Fútbol 7, Modulo de Baños y Rehabilitación de Área de Gimnasio en la Localidad de Cd. Obregón Municipio de Cajeme, Sonora. Contrato No.: SIDUR-PF-17-159 Contratista: GRUPO MERCLA S.A. de C.V.	11 Conceptos de obra pagados no constatados en revisión física (No verificados por estar cerrada el área de baños y oficina).	Cajeme C. Obregón	16/ene/2020 16:00 En la Obra
9	Construcción de la Unidad de Terapia para el Adolescente en la Localidad de Providencia, Municipio de Cajeme, Sonora. Contrato No.: SIDUR-PF-17-241 Contratista: EXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.	05 Incumplimiento al programa de Ejecución de Obra Vigente (Atraso en la ejecución de los Trabajos). 08 Conceptos de obra pagados no ejecutados. 13 Recursos comprometidos pendientes de comprobar al 31 de diciembre de 2018.	Providencia C. Obregón	17/ene/2020 08:00 18/ene/2020 08:00 En la Obra



u

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DE-0015/2020, de fecha 10 de enero de 2020, se me comisiona para que en compañía del Ing. José Alfredo Cota Valdez efectúe la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondientes a la Auditoría No. 05-FORTALECE17SIDUR/2018, las cuales se encuentra ubicadas en Guaymas y Ciudad Obregón, Sonora.

El día 15 de enero de 2020, nos trasladamos a la Localidad de Guaymas, Municipio de Guaymas, donde se constataron las siguientes obras:

OBRA1: "Construcción de Parque Recreativo de Skateboarding en la Localidad de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora."

Ejecutora: Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Contrato No.: SIDUR-PF-17-140

Contratista: CSG INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Monto de Contrato: \$ 2'452,998.25

Monto Ejercido: \$ 2'452,998.25

Monto Cancelado: \$0.00

Anticipo otorgado: \$709,862.23

Anticipo Amortizado: \$709,862.23

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 18 de agosto de 2017 al 15 de diciembre de 2017

Periodo Real: 25 de agosto de 2017 al 21 de enero de 2018.



En esta fotografía se muestra la Construcción de Parque Recreativo de Skateboarding en la Localidad de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora.

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada, a la fecha se encuentra funcionando se están realizando las cuantificaciones para la elaboración de las acta de sitio y poder actualizar el estatus que guardan a las observaciones.

OBRA: “Construcción de Canchas y Juegos Infantiles en el Malecón Turístico de la Localidad de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora.”

Ejecutora: Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Contrato No.: SIDUR-PF-17-140

Contratista: CSG INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Monto de Contrato: \$4'016,851.67

Monto Ejercido: \$4'016,851.67

Monto Cancelado: \$0.00


Anticipo otorgado: \$1'290,428.32

Anticipo Amortizado: \$1'290,428.32

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 18 de agosto de 2017 al 15 de diciembre de 2017

Periodo Real: 25 de agosto de 2017 al 21 de enero de 2018.

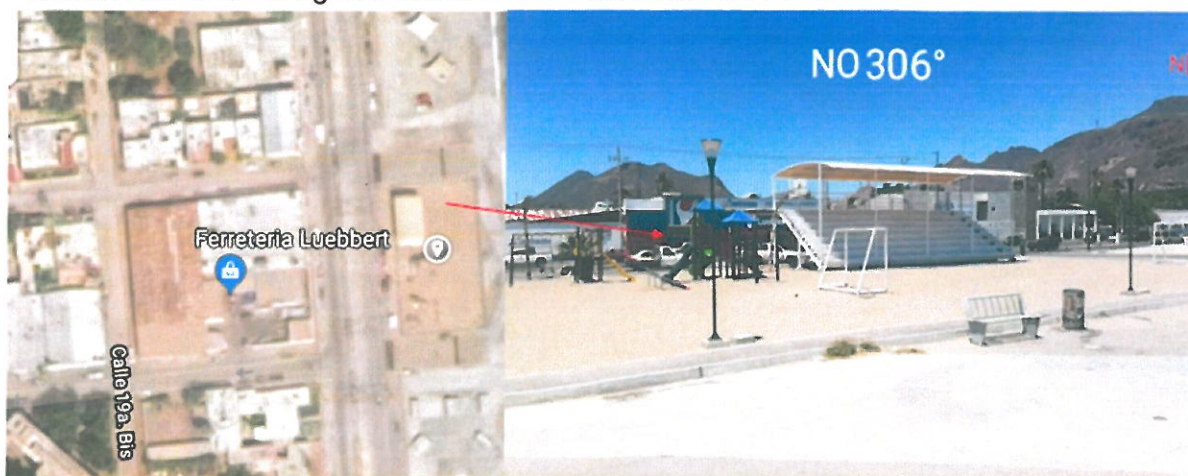

En esta fotografía se muestra el área de la Construcción de Canchas y Juegos Infantiles en el Malecón Turístico de la Localidad de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada, a la fecha se encuentra funcionando se están realizando las cuantificaciones para la elaboración de las acta de sitio y poder actualizar el estatus que guardan a las observaciones.

OBRA: "Construcción de Parque Malecón Turístico de la Localidad de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora."

Ejecutora: Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Contrato No.: SIDUR-PF-17-109

Contratista: DESARROLLO Y TECNOLOGÍA GARELLI, S.A. DE C.V.

Monto de Contrato: \$3'472,622.86

Monto Ejercido: \$3'472,622.86

Monto Cancelado: \$0.00


Anticipo otorgado: \$960,023.51

1 Anticipo Amortizado: \$960,023.51

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 18 de agosto de 2017 al 15 de diciembre de 2017

Periodo Real: 25 de agosto de 2017 al 21 de enero de 2018.

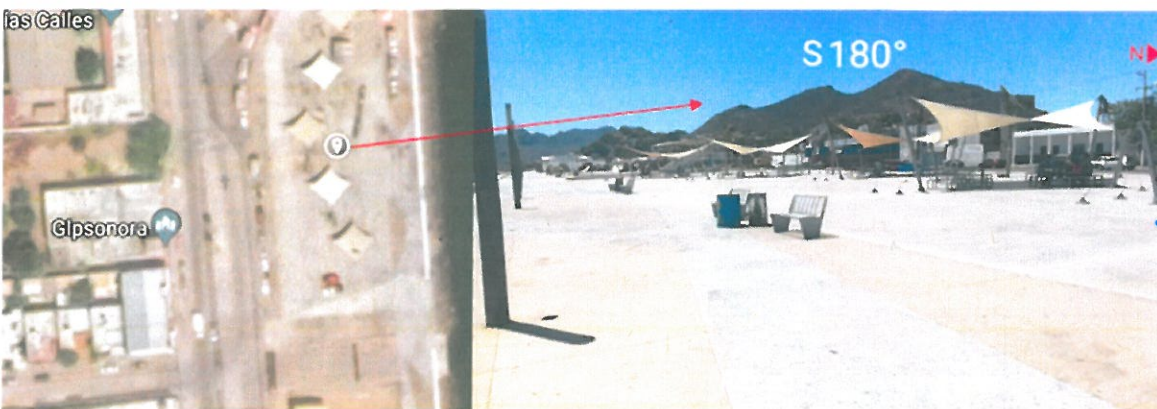

En esta fotografía se muestra el área la Construcción de Parque Malecón Turístico de la Localidad de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora.

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada, a la fecha se encuentra funcionando se están realizando las cuantificaciones para la elaboración de las acta de sitio y poder actualizar el estatus que guardan a las observaciones.

OBRA: "Rehabilitación de Plaza Principal en la Localidad de San José de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora."

Ejecutora: Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Contrato No.: SIDUR-PF-17-109

Contratista: DESARROLLO Y TECNOLOGÍA GARELLI, S.A. DE C.V.

Monto de Contrato: \$4'406,156.60

Monto Ejercido: \$4'406,156.60

Monto Cancelado: \$0.00

Anticipo otorgado: \$1'335,150.17

Anticipo Amortizado: \$1'335,150.17

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 18 de julio de 2017 al 14 de diciembre de 2017

Periodo Real: 25 de agosto de 2017 al 21 de enero de 2018.



En esta fotografía se muestra el área la Construcción de Teatro al Aire Libre en el Malecón Turístico de la Localidad de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora.

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada, a la fecha se encuentra funcionando se están realizando las cuantificaciones para la elaboración de las acta de sitio y poder actualizar el estatus que guardan a las observaciones.

OBRA: "Construcción de Teatro al Aire Libre en el Malecón Turístico de la Localidad de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora."

Ejecutora: Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Contrato No.: SIDUR-PF-17-128

Contratista: DISTRIBUCIONES REMCCA, S.A. DE C.V.

Monto de Contrato: \$3'400,635.53

Monto Ejercido: \$3'303,825.41

Monto Cancelado: \$96,809.93

Anticipo otorgado: \$1'020,190.60

Anticipo Amortizado: \$1'020,190.60

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 01 de agosto de 2017 al 28 de noviembre de 2017

Periodo Real: 01 de septiembre de 2017 al 29 de diciembre de 2017.





En estas fotografías se muestra el área la Construcción de Teatro al Aire Libre en el Malecón Turístico de la Localidad de Guaymas, Municipio de Guaymas, Sonora.

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada, a la fecha se encuentra funcionando se están realizando las cuantificaciones para la elaboración de las acta de sitio y poder actualizar el estatus que guardan a las observaciones.

Pernoctamos en la Localidad de Guaymas, Municipio de Guaymas y el día 16 de enero de 2020, nos trasladamos a la Localidad de Pueblo Yaqui, Municipio de Cajeme, se continuó con la inspección física de la siguiente obra:

Contratista: TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Monto de Contrato: \$3'979,641.97

Monto Ejercido: \$3'979,641.97

Monto Cancelado: \$0.00

Anticipo otorgado: \$1'193,953.03

Anticipo Amortizado: \$1'193,953.03

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 03 de octubre de 2017 al 30 de enero de 2018

Periodo Real: 27 de octubre de 2017 al 23 de febrero de 2018.



En estas fotografías se muestra el Centro de Salud Rural de la Localidad de Pueblo Yaqui, Municipio de Cajeme, Sonora.

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada, a la fecha se encuentra funcionando se están realizando las cuantificaciones para la elaboración de las acta de sitio y poder actualizar el estatus que guardan a las observaciones.

OBRA: "Construcción de Cancha de Futbol 7 en la Localidad de Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora."

Ejecutora: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Contrato No.: SIDUR-PF-17-157

Contratista: DCR CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Monto de Contrato: \$4'320,861.02

Monto Ejercido: \$4'320,861.02

Monto Cancelado: \$0.00


Anticipo otorgado: \$1'296,258.31

Anticipo Amortizado: \$1'296,258.31

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 06 de septiembre de 2017 al 02 de febrero de 2018

Periodo Real: 05 de octubre de 2017 al 03 de marzo de 2018.

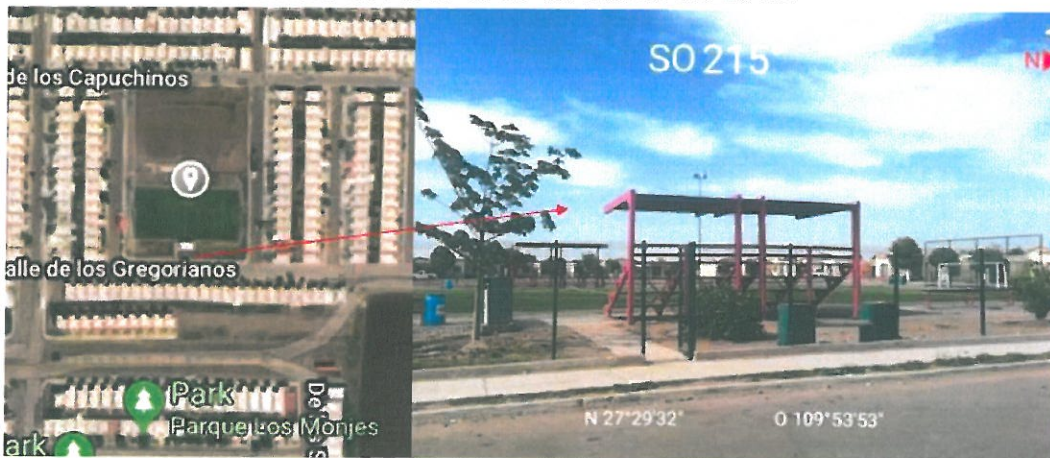

En esta fotografía se muestra la Cancha de Futbol 7 en la Localidad de Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada, a la fecha se encuentra funcionando se están realizando las cuantificaciones para la elaboración de las acta de sitio y poder actualizar el estatus que guardan a las observaciones.



OBRA: "Construcción de Cancha De Futbol 7, Modulo de Baños y Rehabilitación de Área de Gimnasio en la Localidad de Cd. Obregón Municipio de Cajeme, Sonora."

Ejecutora: Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Contrato No.: SIDUR-PF-17-159

Contratista: GRUPO MERCLA, S.A. DE C.V.

Monto de Contrato: \$6'093,880.14

Monto Ejercido: \$6'093,880.14

Monto Cancelado: \$0.00

Anticipo otorgado: \$1'828,164.05

Anticipo Amortizado: \$1'828,164.05

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 08 de septiembre de 2017 al 06 de marzo de 2018

Periodo Real: 05 de octubre de 2017 al 02 de abril de 2018



En estas fotografías se muestra la Cancha De Futbol 7, Modulo de Baños y Rehabilitación de Área de Gimnasio en la Localidad de Cd. Obregón Municipio de Cajeme, Sonora.

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada, a la fecha se encuentra funcionando se están realizando las cuantificaciones para la elaboración de las acta de sitio y poder actualizar el estatus que guardan a las observaciones.

Pernoctamos en la Localidad de Cd. Obregón, Municipio de Cajeme y el día 16 de enero de 2020, continuamos con verificación física de la siguiente obra:

OBRA: "Construcción de la Unidad de Terapia para el Adolescente en la Localidad de Providencia, Municipio de Cajeme, Sonora."

Ejecutora: Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)



Contrato No.: SIDUR-PF-17-241

Contratista: EXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.

Monto de Contrato: \$14'501,804.24

Monto Ejercido: \$14'501,804.24

Monto Cancelado: \$0.00


Anticipo otorgado: \$4'350,541.27

Anticipo Amortizado: \$4'350,541.27

Por Amortizar: \$0.00

Periodo de ejecución Contratado: 26 de diciembre de 2017 al 21 de agosto de 2018

Periodo Real: 01 de marzo de 2018 al 30 de noviembre de 2018.

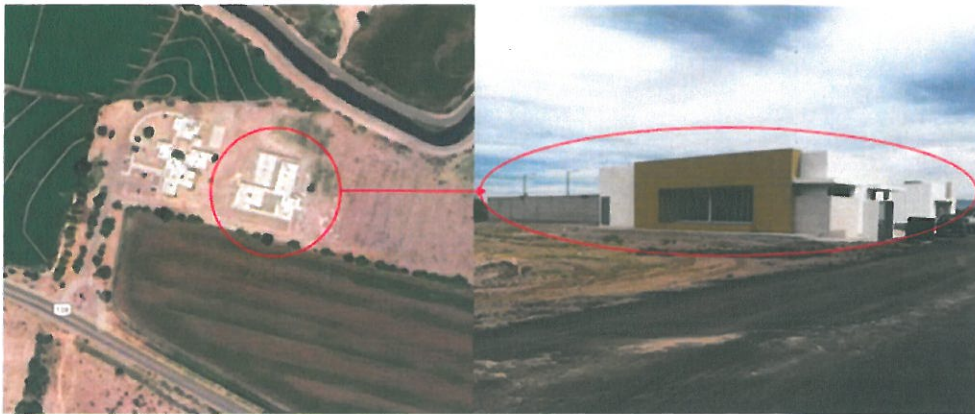

En esta fotografía se muestra la Construcción de la Unidad de Terapia para el Adolescente en la Localidad de Providencia, Municipio de Cajeme, Sonora.

El día 18 de enero de 2020, se continuó con la revisión física de la obra.

Conclusiones:

La obra no se encuentra terminada, ya que existen suministros en la bodega de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), se están realizando las cuantificaciones para la elaboración de las actas de sitio y poder actualizar el estatus que guardan a las observaciones.


Ing. Francisco Rivera Velázquez
Auditor Encargado
