

- El día 13 de septiembre de 2019, se realizó el traslado a la Localidad de Moctezuma y Ures, para realizar la inspección física de las siguientes obras:

OBRA 20: "Pavimentación de calle Sin Nombre y calle 21 de marzo en la Localidad de Moctezuma, Municipio de Moctezuma, Sonora."

Ejecutora: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Programa: Proyectos de Desarrollo Regional 2018

Contrato No.: SIDUR-PF-18-120

Contratista: CONSTRUCTORA TURICATZI, S.A. DE C.V.


Monto Contratado: \$ 6,689,318.84

Los trabajos a ejecutar consisten en: Consideran preliminares, Pavimento de concreto Hidráulico, Banquetas y Guarniciones.


Situación detectada:

De la visita realizada a la obra el día 13 de septiembre del presente año, **se detectaron deficiencias a la obra, las cuales se mencionan a continuación y se anexa un reporte fotográfico.**

VISTA GENERAL DEL TRAMO CALLE 21 DE MARZO

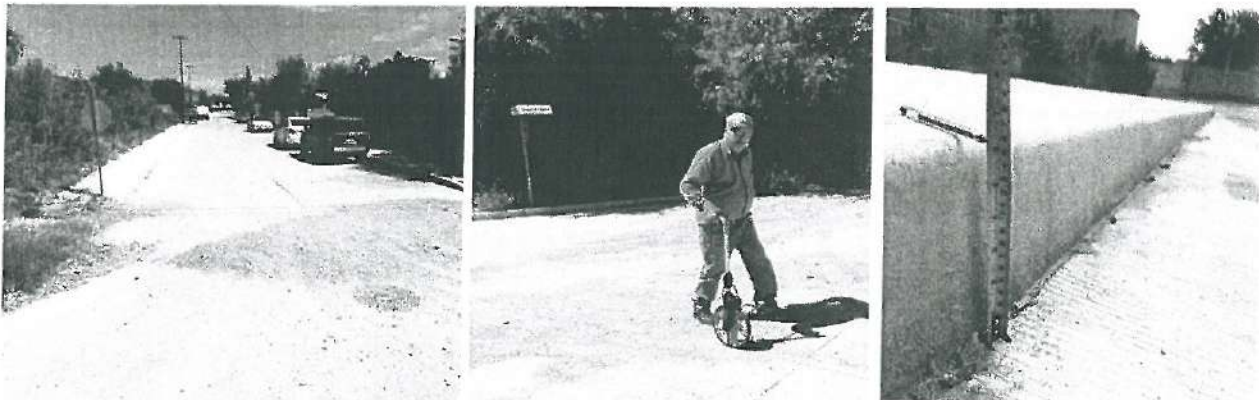

VISTA GENERAL DEL TRAMO CALLE SIN NOMBRE

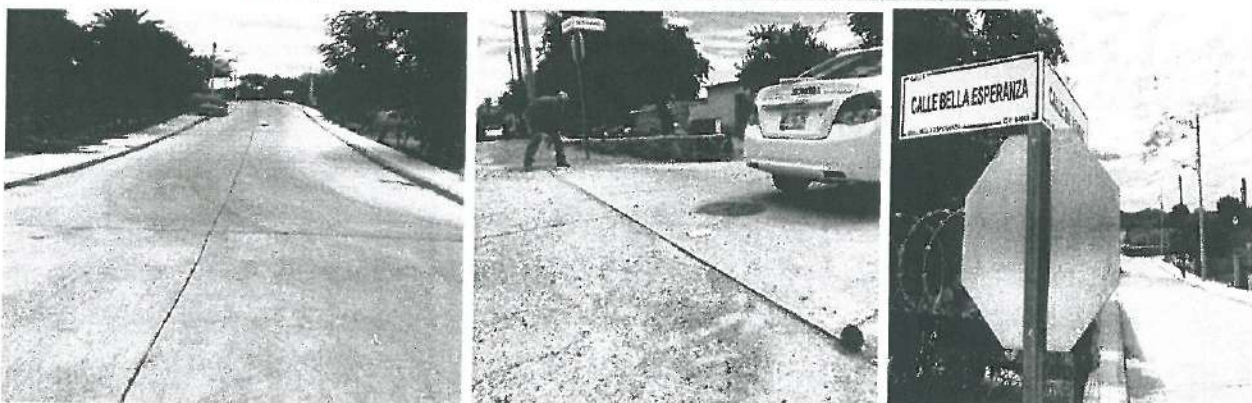

NOTA: SE ANEXA REPORTE FOTOGRÁFICO DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EN LAS CALLES.

OBRA 21: "Pavimentación de la Calle Ignacio Pesqueira En La Localidad de Heroica Ciudad de Ures, Municipio de Ures, Sonora."

Ejecutora: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Programa: Proyectos de Desarrollo Regional 2018

Contrato No.: SIDUR-PF-18-097

Contratista: PROMOTORA MAJERUS, S. DE R.L.

Monto Contratado: \$ 5,356,815.04

Los trabajos a ejecutar consisten en: Consideran preliminares, Pavimento de concreto Hidráulico, Pavimento asfáltico de un espesor de 5 centímetros, Banquetas y Guarniciones.


Situación detectada:

De la visita realizada a la obra el día 13 de septiembre del presente año, **se detectaron deficiencias a la obra, las cuales se mencionan a continuación y se anexa un reporte fotográfico.**

VISTA GENERAL DEL TRAMO CALLE ABASOLO



VISTA GENERAL DEL TRAMO CALLE PESQUEIRA

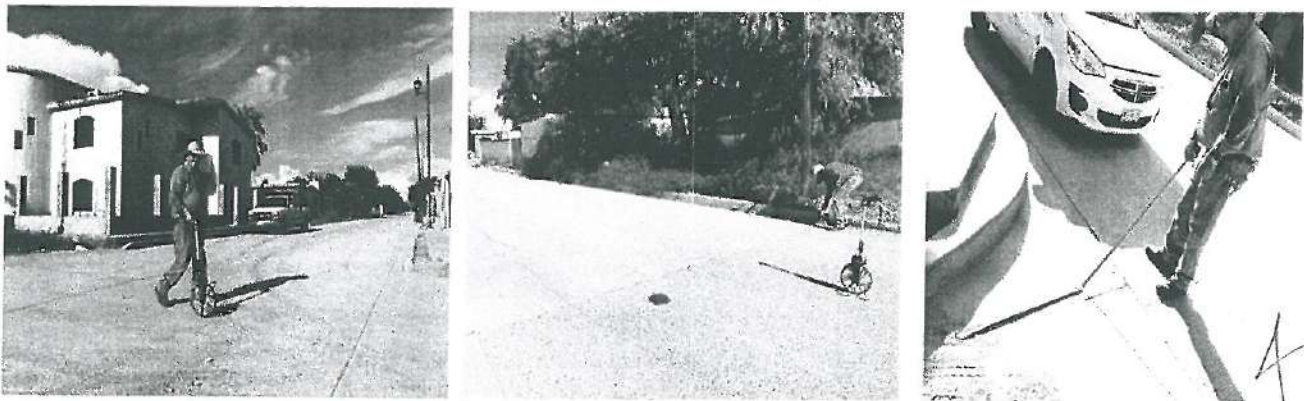

NOTA: SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EN LAS CALLES.

**OPERADO CON RECURSOS
DEL FONDO ALIENADO
EJERCICIO FISCAL 2019**

Así mismo; Se encontraron Conceptos de Obra Pagados no Ejecutados en las siguientes calles:


Concepto	Cantidad	Precio Unitario	Monto Observado 6/IVA
CONTRATO: SIDUR-PF-18-091; PAVIMENTACIÓN DE EUGENIO MARTINEZ ENTRE MONICO VALENZUELA Y MOCTEZUMA, LOCALIDAD Y MPIO. DE HUATABAMPO.			
Guarnición tipo "I" de concreto f'c=150 kg/cm2 de 110 l/m, incluye: suministro del concreto hidráulico premezclado, cimbra aparente, celotex, colado, vibrado y curado con curacreto blanco, excavación en la parte posterior para colocar cimbra, relleno compactado (se deber considerar la disminución de concreto en las entradas de cocheras).	6.00	\$398.89	\$2,393.34
Suministro e instalación de seal restrictiva (alto sr-6) de 61 x 61 cm. fab. en lámina de fierro galv. cal. 14 con acabado reflejante grado ingeniera e impresión serigráfica a dos tintas charola (sil-6).	1.00	\$2,766.92	\$2,766.92
			\$5,160.26
CONTRATO: SIDUR-PF-18-091; PAVIMENTACIÓN DE LAS AV. DEL CENZONTLE, DEL CARDENAL Y CALLE DEL TIGRE, LOCALIDAD Y MPIO. DE HUATABAMPO.			
Suministro e instalacin de seal restrictiva (alto SR-6) de 61x61 cm, fabricada en lamina galvanizada cal.16 con acabado reflejante grado ingeniera e impresin serigrafica, incluye: un poste galvanizado de alta resistencia, tuarcas, rondana, herrajes, anclaje, anclaje de lamina en poste, base de concreto F'c=150 kg/cm2 de 25x25x50cm, y todo lo necesario para su correcta terminación.	2.00	\$2,904.64	\$5,809.28
			\$5,809.28
CONTRATO: SIDUR-PF-18-091; PAVIMENTACIÓN DE LA CALLES SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA A HUATABAMPO Y CALLE SIN NOMBRE (NORTE Y SUR) LOCALIDAD DE MORONCARIT, MUNICIPIO DE HUATABAMPO.			
Pozo de visita tipo común, incluye: excavación plantilla (5 cms) y piso de concreto ambos de f'c=150 kg/cm2 l.m.a. 3/4", muro de tabique de 28 cms.	2.00	\$7,638.90	\$15,277.80
			\$15,277.80
CONTRATO: SIDUR-PF-18-096; PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES FRANCISCO VILLA ENTRE CARRETERA A HUATABAMPO Y EULALIO VAZQUEZ Y PAVIMENTACION DE CALLE EULALIO VAZQUEZ ENTRE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE EL JUPARE, MUNICIPIO DE HUATABAMPO.			
Suministro e instalacin de seal restrictiva (alto SR-6) de 61x61 cm, fabricada en lamina galvanizada cal.16 con acabado reflejante grado ingeniera e impresin serigrafica.	1.00	\$2,904.64	\$2,904.64
			\$2,904.64
CONTRATO: SIDUR-PF-18-097; PAVIMENTACIÓN DE LAS ABASOLO ENTRE ZARAGOZA Y GARCIA MORALES, LOCALIDAD Y MPIO. DE URES.			
Trazo y nivelación de terracerías, losas, carpeta asfáltica, para alineamiento vertical y horizontal. Incluye: equipo topográfico, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta instalación.	62.40	\$6.97	\$434.63
Suministro y colocación de base hidráulica de tamaño máximo de agregado de 1 1/2" con un espesor de 15 cms. Incluye suministro de material, humectación, tendido, afine, compactación al 95% de prueba Proctor y conservación de la misma	9.36	\$332.05	\$3,107.96
Compactación de plantilla "l.n." con rodillo pata de cabra para desplante de subrasante, a la cual se le aplicarán entre 10 y 12 pasadas de equipo vibratorio de compactación con peso de 8 a 10 toneladas o una energía de compactación equivalente, previamente se le aplicará un riego de 50 a a 60 lts. y todo lo necesario para su correcta terminación.	62.40	\$12.42	\$775.01
Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento tipo rl-2k a razón de 1.50 lt/m2, incluye: suministro, almacenamiento, acarreos, humedecido, bombeo, calentamiento y aplicación.	62.40	\$16.73	\$1,043.95
Suministro y colocación de carpeta asfáltica caliente del tipo ekbe-64-22, compactada al 100% de su p.v.s.m. y a una temperatura mínima de 120 c, incluye: suministro, carga, acarreos, maniobras locales, colocación con finisher, medido compacto y todo lo necesario para su correcta terminación, según especificaciones.	4.62	\$2,983.66	\$13,368.71
			\$18,730.59

Posteriormente me traslade a Hermosillo, Sonora.

Conclusiones:

Cabe señalar, que se le recomendó a la Dependencia que a través del área correspondiente atienda y subsane dichos hallazgos a la brevedad posible, y así prevenir futuras observaciones.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto.


Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel.

Asesor Técnico de OIC SIDUR
Cedula Profesional No. 028784

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019**

Hermosillo, Sonora a 17 de septiembre de 2019.



REPORTE FOTOGRAFICO DE DEFICIENCIAS TECNICAS EN LAS OBRAS

No. Contrato: SIDUR-PF-18-075 **Contratista:** LC Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
Descripción de Obra: Pavimentación de las vialidades Obelisco, Girasol, Jacinto, Alhelí, Azar, Bugambilla, Caléndula, Lila, Tulipán, Clavelina, Verbena, Mosqueta y Rosal.
Monto Contrato: \$18,679,319.46 **Avance Físico:** 100% **Fecha de Verificación:** 09-Sep-2019





Falta Limpieza en el Blvd. Brisas del Valle.

No. Contrato: SIDUR-PF-18-141 **Contratista:** Ing. Gaudencio Ramos Monteón
Descripción de Obra: Pavimentación de la calle Yucatán entre Progreso y Principal en la Localidad de Quiriego, Municipio de Quiriego, Sonora.
Monto Contrato: \$3,596,814.99 **Avance Físico:** 21% **Fecha de Verificación:** 12-Sep-2019



Mediante la visita a la obra el día 12 de septiembre de 2019, se constato que la obra se encuentra en pleno abandono, se le recomienda a la dependencia ejecutora, presentar en la carpeta del Expediente Unico la documentación de justificación, por razón que el contratista incurre al contrato SIDUR-PF-18-141 en el cual indica en su segunda cláusula el plazo de terminación 02 de noviembre del 2018, se tiene un acumulado de 314 días de atraso a la fecha de la visita a la Obra.

No. Contrato: SIDUR-PF-18-083 **Contratista:** SCJ Constructora, S.A. de C.V.
Descripción de Obra: Pavimentación de las Calles Francisco Serrano y Ramon Terán en la Localidad de Navojoa, Municipio de Navojoa, Sonora.
Monto Contrato: \$9,590,285.79 **Avance Físico:** 100% **Fecha de Verificación:** 09-Sep-2019

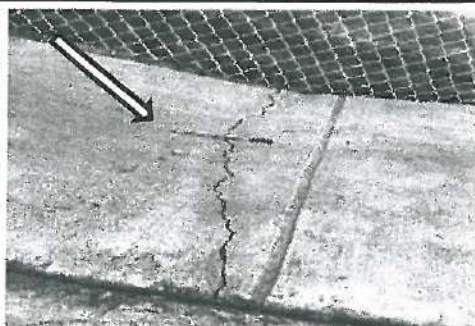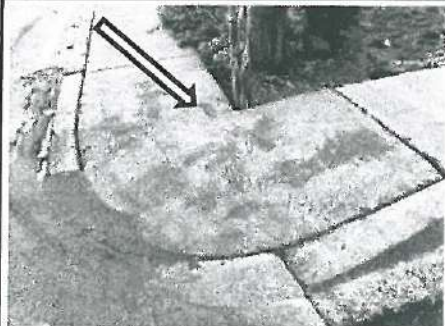

Daño en banqueta por letras plasmada en la banquetta en esquina de calle Ramon Z. Teran entre calle Venustiano Carranza

2 Grietas en Banqueta la cual tiene 1 metro lineal. C/u en la calle Ramon Teran (Frente de Iglesia)

OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2019



REPORTE FOTOGRAFICO DE DEFICIENCIAS TECNICAS EN LAS OBRAS

No. Contrato: SIDUR-PF-18-076 **Contratista:** 2K17 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.
Descripción de Obra: Rehabilitación del Blvd. Rafael J. Almada entre Leona Vicario y Jalisco en la Localidad de Navojoa municipio de Navojoa, sonora.
Monto Contrato: \$8,194,903.88 **Avance Físico:** 100% **Fecha de Verificación:** 09-Sep-2019



2 Baches de dimensiones de 2.0 x 3.00 y 0.30 x 0.30 mts en esquina de la Blvd. Almada y Calle Amadonervo.

Desgaste en vialeta doble cara amarilla en rayas de acotamiento @ 30.0 mts Blvd. Almada y calle jalisco.

No. Contrato: SIDUR-PF-18-076 **Contratista:** 2K17 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.
Descripción de Obra: Pavimentación de la Av. Jalisco entre Rafael J. Aldama y No Reelección en la Localidad de Navojoa en el Municipio de Navojoa Sonora.
Monto Contrato: \$4,004,859.76 **Avance Físico:** 100% **Fecha de Verificación:** 09-Sep-2019




Bache de dimencion de 1.20 x 0.80 mts en la calle Jalisco entre No Relección y Garcia M.

Bache de dimencion de 0.80 x 0.60 mts en esquina de la calle Jalisco y Antonio Rincon.

Bache de dimencion de 1.80 x 1.00 mts en esquina de la calle Jalisco y Garcia Morales.

No. Contrato: SIDUR-PF-18-087 **Contratista:** GIBHER Constructores S.A. de C.V.
Descripción de Obra: Pavimentación de la Av. José María Leyva entre Yavaros y Aribabi en la Localidad de Navojoa, Municipio de Navojoa, Sonora.
Monto Contrato: \$5,448,425.12 **Avance Físico:** 100% **Fecha de Verificación:** 09-Sep-2019

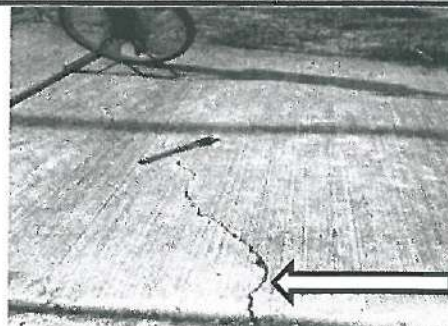

Daño en banqueta por letras plasmada en la banqueta, en esquina de calle Jose M. Leyva y Bacoachi.

Huella de Rodado de bicicleta en banqueta por plasmada en banqueta, en esquina calle Jose Leyva y Bacoachi.

Grieta en Banqueta la cual tiene 1 metro lineal, Ubicada en esquina de calle Jose M. Leyva y Bacoachi.

OPERADO CON RECURSOS
 DEL CINCO AL MILLAR
 EJERCICIO FISCAL 2019

4





REPORTE FOTOGRAFICO DE DEFICIENCIAS TECNICAS EN LAS OBRAS

No. Contrato: SIDUR-PF-18-100 Contratista: VIDEORP Inmobiliaria, S.A. de C.V.


Descripción de Obra: Pavimentación de las calles Sonora, Callejón Sin Nombre, Calle de la Angostura y Calle 2 de Abril en la Localidad de Villa Juárez, Municipio de Benito Juárez, Sonora.

Monto Contrato: \$6,340,780.95 Avance Fisico: 100% Fecha de Verificación: 11-Sep-2019

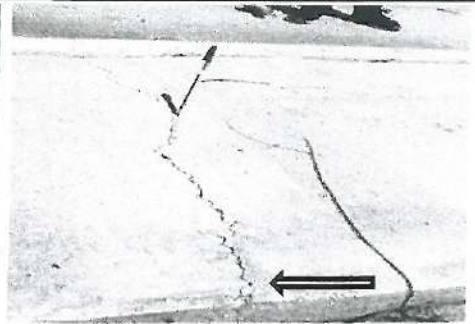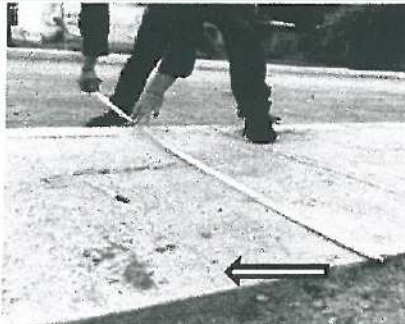

Daño en banqueta en esquina de calle niños Heroes y calle Sonora en la Localidad de Villa Juárez.


2 Grietas en Banqueta la cual tiene 1 metro lineal C/u, en la calle niños Heroes y calle Sonora en la Localidad de Villa Juárez.

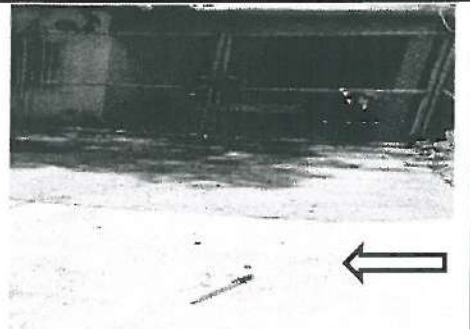

Guarnición sin acabado Final, en calle Angostura y Pino Suarez


Grieta en Guarnición Banqueta, en calle Angostura y Pino Suarez

Grieta en Banqueta la cual tiene 1 metro lineal en calle Angostura y Pino Suarez

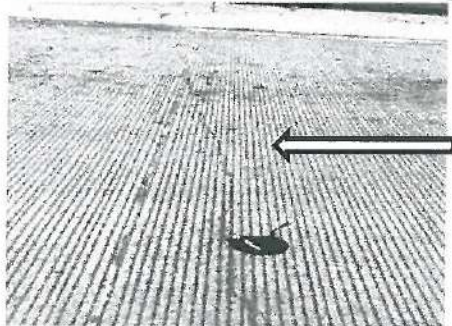

Grieta en Losa de Concreto se tiene una dimension de 4 metros, ubicada en calle Angostura, entre Pino Suarez y Fco. Madero.

La calle presenta un desnivel de 4 cm en uno costado, una dimension de 20 x 4 mts, se recomienda a la Ejecutora la reparación por un daño a futuro, que se puede presentar la losa de concreto, ubicada en calle 2 de Abril y Francisco Villa.

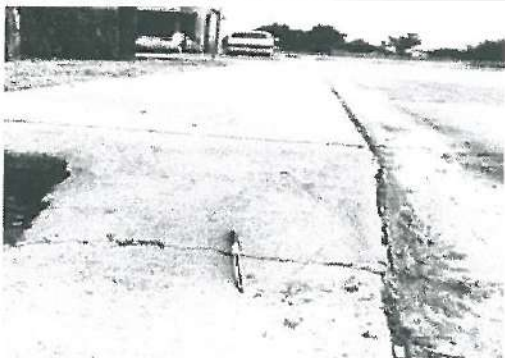

Grieta en Banqueta la cual tiene 0.50 mts metro lineal ubicada en calle 2 de Abril y Francisco Villa.

Grieta en Guarnición Banqueta, ubicada en calle 2 de Abril y Francisco Villa.

OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2019

REPORTE FOTOGRAFICO DE DEFICIENCIAS TECNICAS EN LAS OBRAS


No. Contrato: SIDUR-PF-18-113 Contratista: GIFE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

Descripción de Obra: Pavimentación de la calle Ignacio Allende y calle Pipila en la Localidad de Etchojoa, Municipio de Etchojoa, Sonora.

Monto Contrato: \$6,745,485.70 Avance Físico: 100% Fecha de Verificación: 10-Sep-2019



Bache de dimencion de 2.0 x 1.00 mts en calle Pipila entre calle Nicolas Bravo y la calle Allende.

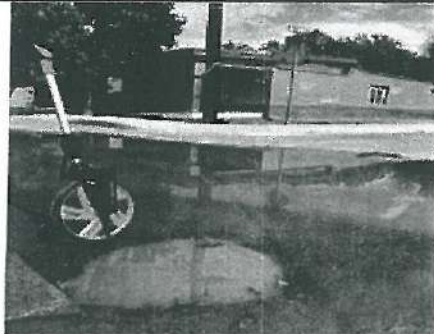

Bache de dimencion de 1.20 x 0.80 mts ubicado en esquina de la calle Pipila y la calle Allende.



Se encontro señalamiento restrictiva (alto sr-6) de 61x61 cm. en el cual se empalma con con señalamiento del Municipio, ubicada en calle allende y esquina con Guerrero.



Grieta en Banqueta, ubicada en calle Allende y casi esquina con Calle Guerrero.




Grieta en Guarnición, ubicada en calle allende y casi esquina con Calle Guerrero.



Daño en banqueta por letras plasmada en la banqueta, ubicada en calle allende y casi esquina con Calle Tosalicari.



La calle presenta un desnivel de 3 cm, se recomienda la reparación por un daño a futuro, que se puede presentar a la carpeta, se ubica al final de la calle Allende y Victor Sila Duran.

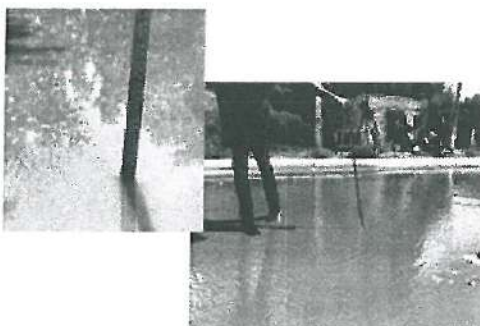

La calle presenta un desnivel de 4 cm, se recomienda la reparación por un daño a futuro, que se puede presentar a la carpeta, se ubica al final de la calle Jesus Garcia y Pipila.



4
OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019



REPORTE FOTOGRAFICO DE DEFICIENCIAS TECNICAS EN LAS OBRAS

No. Contrato: SIDUR-PF-18-091 **Contratista:** RYR CONCRETOS, S.A. DE C.V.
Descripción de Obra: Pavimentación de las calles novena, avenida 1, calle cuarta, Venustiano Carranza, Emiliano zapata, Eugenio Martínez, Benjamín Hill y fausto topete en la localidad de Huatabampo, municipio de Huatabampo, sonora.
Monto Contrato: \$9,159,616.51 **Avance Físico:** 100% **Fecha de Verificación:** 10-Sep-2019



Falta 1 señalamiento restrictiva (alto sr-6) de 61x61 cm. Arrojando un Monto faltante en Obra de \$2,766.92 S/IVA



Falta de 6 Metros de Guarnición tipo "I" de Concreto Fc=150 kg/cm2 de 110 l/m, Arrojando un Monto faltante en Obra de \$2,393.4 S/IVA

Pavimentación en Calle Novena, Avenida 1 y Calle Cuarta



La calle presenta un desnivel de 3 cm, se recomienda a la Ejecutora la reparación por un daño a futuro, que se puede presentar a la carpeta, se ubica al principio de la calle Novena y Periferico.



Bache de dimencion de 2.50 x 2.00 mts, ubicado en la calle Novena y Periferico.



Se constata que la calle se tiene un desnivel, se recomienda a la Ejecutora la reparación por un daño a futuro, que se puede presentar a la carpeta.



Bache de dimención de 16 x 3.60 mts, ubicado en la avenida 1 entre calle octava y septima.



Bache de dimencion de 2.50 x 2.00 mts, ubicado en la calle cuarta entre avenida y Periferico.

4

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019**



REPORTE FOTOGRAFICO DE DEFICIENCIAS TECNICAS EN LAS OBRAS

No. Contrato: SIDUR-PF-18-091 Contratista: RYR CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Descripción de Obra: Pavimentación de las calles sin Nombre entre Carretera a Huatabampito y calle sin Nombre (Norte) y calle Sin Nombre entre Carretera a Huatabampito y calle sin Nombre (Sur) en la Localidad de Moroncarit, Municipio de Huatabampo, Sonora.

Monto Contrato: \$5,039,658.79 Avance Fisico: 100% Fecha de Verificación: 10-Sep-2019

Carretera a Huatabampito y Calle Sin Nombre (Norte)



Grieta en Guarnición no.1




Grieta en Guarnición no.2



Daño en Losa por letras plasmadas



Grieta en Guarnición no.3

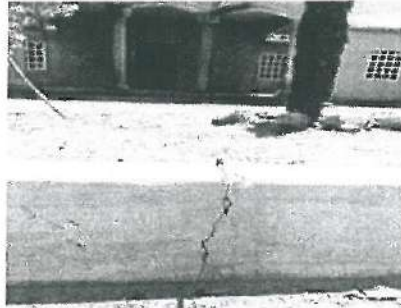

Grieta en Guarnición no.4



Grieta en Guarnición no.5

Carretera a Huatabampito y Calle Sin Nombre (Sur)



Desgaste en vialeta doble cara amarilla en rayas de acotamiento @ 30.0 mts



Grieta en Guarnición, ubicada en calle Sin Nombre.

OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2019

4



REPORTE FOTOGRAFICO DE DEFICIENCIAS TECNICAS EN LAS OBRAS


No. Contrato: SIDUR-PF-18-103 **Contratista:** Constructora Lista Blanca S.A de C.V

Descripción de Obra: Pavimentación de la calle 27 entre calle 16 de Septiembre y Avenida Reforma en la localidad de Empalme.

Monto Contrato: \$2,328,763.74 **Avance Fisico:** 100% **Fecha de Verificación:** 12-Sep-2019



Desgaste en Pintura Tráfico Blanca con Esferilla, Indicadora de Alto, ubicada en Esquina de calle Revolución y Blvd. America.

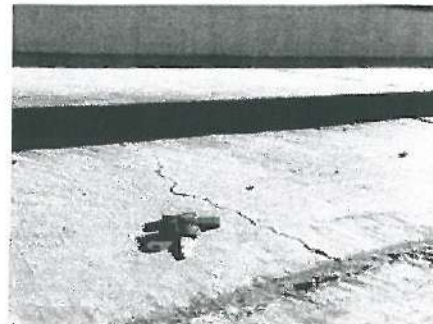

Grieta en Losa de Concreto de dimensión de 0.40 mts, en la calle Revolución entre calle 20 y calle 21.


No. Contrato: SIDUR-PF-18-119 **Contratista:** PCM Proyectos Constructivos Monarca S.A. de C.V.

Descripción de Obra: Rehabilitación del Blvd. Benito Juárez entre Blvd. Agustín García López y Lago Toronto en la Localidad de Heroica de Guaymas

Monto Contrato: \$9,649,880.60 **Avance Fisico:** 100% **Fecha de Verificación:** 13-Sep-2019



Detalles de Huellas en Losa de pavimento de Concreto Hidraulico con resistencia $F'c=250 \text{ kg/cm}^2$ TMA 40 mm

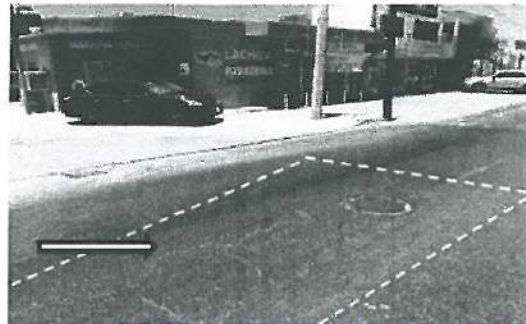

Mal corte uniforme en Losa de 20 cms de espesor en Concreto hidraulico, asi la falta de sello en la union de Junta.

Grietas en Microcarpeta de 3.0 cm de espesor. Ubicadas enfrente de Panaderia La Chida



Baches en Microcarpeta de 3.0 cm (Ubicado Enfrente Negocio de Carniceria Villarreal)



Baches en Microcarpeta de 3.0 cm (Ubicado Enfrente Negocio de Leche Yaqui)

OPERADO CON RECURSOS DE CAPITAL MILITAR EJERCICIO FISCAL 2019




REPORTE FOTOGRAFICO DE DEFICIENCIAS TECNICAS EN LAS OBRAS

No. Contrato: SIDUR-PF-18-096 **Contratista:** Luis Enrique Peña Rodrigo
Descripción de Obra: Pavimentación de las Calles Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas y Emiliano Zapata, en la Localidad de Jupare, Municipio de Huatabampo, Sonora.
Monto Contrato: \$6,760,781.59 **Avance Físico:** 100% **Fecha de Verificación:** 10-Sep-2019



Bache de dimensión de 1.50 x 0.30 mts en la esquina de las calles Emiliano Zapata y 5 Mayo.

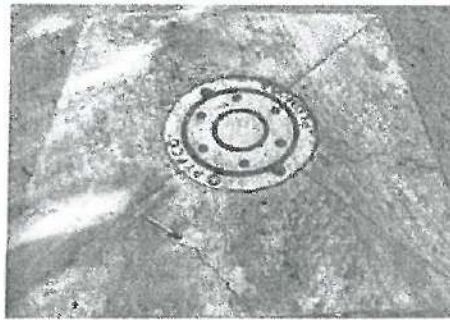

Grietas de Losa de Pozo de Vista, Ubicado en esquina de las calles Emiliano Zapata y Venustiano Carranza.



Cuenta Inclínación el poste del señalamiento restrictiva, Ubicado en Esquina de las calles Alfredo Karan y Venustiano Carranza.

No. Contrato: SIDUR-PF-18-097 **Contratista:** PROMOTORA MAJERUS, S. DE R.L.
Descripción de Obra: Pavimentación de la Calle Ignacio Pesqueira En La Localidad de Heroica Ciudad de Ures, Municipio de Ures. Sonora.
Monto Contrato: \$5,356,815.04 **Avance Físico:** 100% **Fecha de Verificación:** 13-Sep-2019

Calle Abasolo



Falta Lamina de señalamiento restrictiva (alto sr-6) de 61x61 cm. En esquina Oriente de calle Abasolo y Dr. Raúl Teran.



Falta Lamina de señalamiento restrictiva (alto sr-6) de 61x61 cm. En esquina Poniente de calle Abasolo y Dr. Raúl Teran




Falta Nomenclatura de los nombres de entre calle Abasolo y Gral. Ignacio Pesqueira.


Calle Gral. Ignacio Pesqueira



Falta 2 Lamina de señalamiento restrictiva (alto sr-6) de 61x61 cm. En esquina Poniente y Oriente de calle Abasolo y Gral. Ignacio Pesqueira.

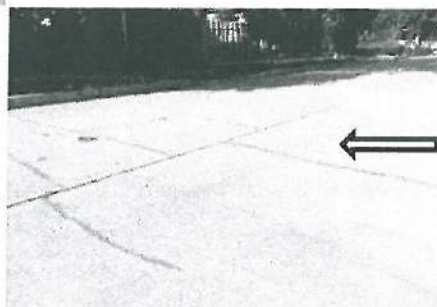

Se constato en la calle Gral. Ignacio Pesqueira se que presenta Mala calidad en la repararon de Gietas en la Losa de Concreto.

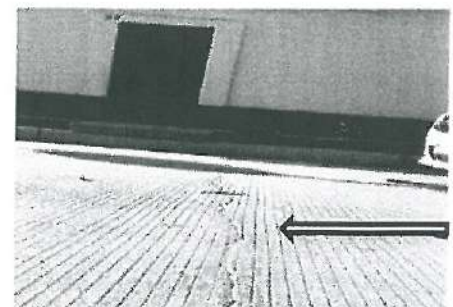

OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2019




REPORTE FOTOGRAFICO DE DEFICIENCIAS TECNICAS EN LAS OBRAS

No. Contrato: SIDUR-PF-18-120 **Contratista:** CONSTRUCTORA TURICATZI, S.A. DE C.V.


Descripción de Obra: Pavimentación de calle Sin Nombre y calle 21 de Marzo en la Localidad de Moctezuma, Municipio de Moctezuma, Sonora.

Monto Contrato: \$6,689,318.84 **Avance Fisico:** 100% **Fecha de Verificación:** 13-Sep-2019

Calle 21 de Marzo

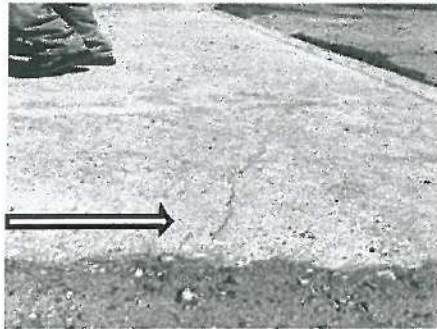


Grieta en Losa de Concreto de dimensión de 1.00 mts, en la esquina de las calles 21 de Marzo y Periferico.

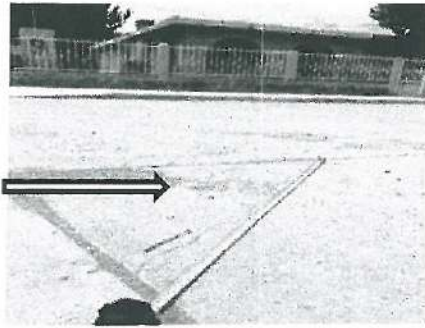

Grieta en Losa de Concreto de dimensión de 1.30 mts, en la esquina de las calles 21 de Marzo y Periferico.




Daño en Banqueta de Concreto de dimensión de 4.00 x 1.20 mts, en la calle 21 de marzo entre Sexta y Kaly Mungaray.

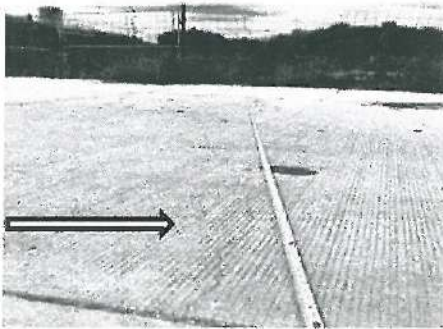


3 Grieta en Losa de Concreto de dimensión de 3.00 mts c/u, en la calle 21 de marzo entre Sexta y Kaly Mungaray.



Grieta en Guarnición, en la esquina de las calles Brea y Sin Nombre.

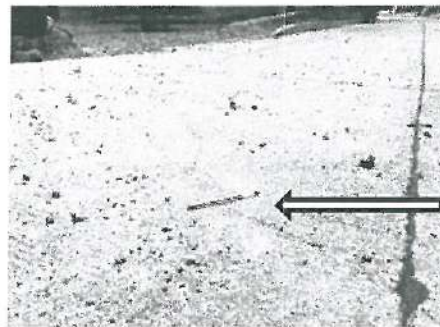

Grieta en Losa de Concreto de dimensión de 2.00 mts, en la esquina de las calles Brea y Sin Nombre.

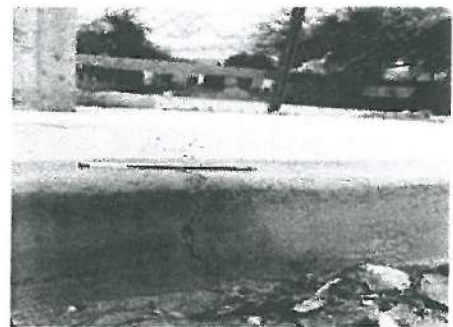

Grieta en Guarnición, en la esquina de las calles Sin Nombre y Callejon Sin Nombre.



Grieta en Losa de Concreto de dimensión de 3.00 mts, en las calles Brea y Sin Nombre.

OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2019



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:85874

Factura: 253292913

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d8f3af40-ccc0-4d90-b310-3614b130decc

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: OBR

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-21T16:35:56

Fecha de certificación: 2019-09-21T16:35:56

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

C.P : 83260

Delegación/Municipio: HERMOSILLO

Colonia: CENTENARIO

RFC: GES790913CT0

Estado: SONORA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	PEPSI KICK 500ML	10.34	1.66	10.34

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

10.34

TASA I.V.A 16%

1.66

TOTAL MXN

12.00

Sello digital del CFDI

SOjhMTBTX0k0bmzhqftC4kJMUDVNX0G1Tz0a1Yht2U7liimlOchcXDWvghTylPrJkAfc75lIFlcwr5XoYMvKKu3TSE9fiFrlZuS+Y1LJA/zo9GtloP/WDsSeJgmydoUHQRTFS93bLYuGqQazm6d2eKMvf22F7JYoK4GcdkT8vlvaTBwYSmf0D4+UVQkW2ON31G5l5Mn2TIsaRGAXGXwdBvAuTl5N2nyA+iV7YFKsdQl2B0iz4LaHqf+Po7682HSS/j0nutgFARHZik3T6cgoS9KxAf5m9v4+W7vNcqFuJtYfNcA53XcVRnGzN6q8O1ZkWPbiktO2tQnSL7b+cppA==

Sello digital del SAT

HoGBSnQ7uF1lyOWVBtywASUTOGfjgeTWXFprfZqZudk2qGgSwp/sQnXlZwAhCql/Y3Qjce5yxUF+zPHR7G7tfeoiX/aql1gYuXAdq4FYEOiI4ePIBdGgFYBGwJws8QfOzkEiB/ym8SAMwFPfb/zfrLMTI99Ge1gRHbNF1ld0jfk4c9eQO+kj4qtibzDAlxFdmwS8BP/sX0FFTONllUYXlp/zKyl9S9jV4rMCEH+gH/rSxyPTxRsCd9KR2hbXnEK8fz5VrRQ8cvmVLwsuSU4PsyfDBQXjSvpmRg4gN+5VIT/IQADEk4hFivkUZh4vQZZcGQAqSCPgwz5k/SlwBgeQ==

Cadena Original

||1.1|d8f3af40-ccc0-4d90-b310-3614b130decc|2019-09-21T16:35:56|SNF171020F3A|SOjhMTBTX0k0bmzhqftC4kJMUDVNX0G1Tz0a1Yht2U7liimlOchcXDWvghTylPrJkAfc75lIFlcwr5XoYMvKKu3TSE9fiFrlZuS+Y1LJA/zo9GtloP/WDsSeJgmydoUHQRTFS93bLYuGqQazm6d2eKMvf22F7JYoK4GcdkT8vlvaTBwYSmf0D4+UVQkW2ON31G5l5Mn2TIsaRGAXGXwdBvAuTl5N2nyA+iV7YFKsdQl2B0iz4LaHqf+Po7682HSS/j0nutgFARHZik3T6cgoS9KxAf5m9v4+W7vNcqFuJtYfNcA53XcVRnGzN6q8O1ZkWPbiktO2tQnSL7b+cppA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D8F3AF40-CCC0-4D90-B310-3614B130DECC	2019-09-21T16:35:56	2019-09-21T16:35:56	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$12.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2019
