

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General



En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DE-0457/2021, de fecha 17 de marzo de 2021, con fundamento en el Artículo 18 Fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría y en seguimiento a la Auditoría No. 01-PUENTECOLORADO17-20SIDUR/2021, se me comisiona para que en compañía de los Ings. Marcos Morales Cuén, Francisco Rivera Velázquez y David Molina Correa, efectúe la verificación física de la obra, "**Rehabilitación y Modernización de Caseta de Peaje en el puente San Luis Río Colorado**", la obra está ubicada en el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.



El día 22 de marzo de 2021, se realizó el traslado a la Localidad de San Luis Río Colorado, Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, y nos presentamos en el sitio de la obra, donde nos presentamos con el administrador de la Caseta "Puente Río Colorado" con el cual realizamos un recorrido por la obra.



F.

El día 23 de marzo de 2021, se efectuó la verificación física en las áreas exteriores, correspondientes a los conceptos de banquetas, guarniciones, vibradores cercos de malla ciclónica, topes en área de estacionamiento y alumbrado exterior.



El día 24 de marzo de 2021, se efectuó la verificación física en las áreas de las casetas de cobro, correspondientes a los conceptos de suministro de aire acondicionado e instalación, basamento de las casetas, forrado de columnas a base de panel alucobon, obstáculo de concreto, amortiguador de impacto y semáforos, rótulos informativos.



Informe No. ECOP-DE-0457/2021
Hermosillo, Sonora, a 30 de marzo de 2021

El día 25 de marzo de 2021, se continuo con la verificación física en las áreas de la planta baja como fueron el área de facturación, site, baños dentro de oficina y baños públicos, y área de escalera.



El día 26 de marzo de 2021, se efectuó la verificación física en las áreas de la planta alta como fueron el área de pasillo, terraza, oficina de gerencia, dormitorio y azotea.



A handwritten signature in blue ink.

Informe No. ECOP-DE-0457/2021
Hermosillo, Sonora, a 30 de marzo de 2021

Así como en el área de azotea, donde se verificaron los equipos de aire acondicionado, canalón, base de los equipos de aire acondicionado, e instalaciones eléctricas, chafanes, impermeabilización, colocación de malla hexagonal.

El día 27 de marzo de 2021 se elaboraron, se elaboraron las Cédulas de Inspección de Campo (documentos de trabajo), por el personal designado para la verificación por parte de la Secretaría de la Contraloría General y por parte de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) quien realizó la obra.

Conclusiones:

Se concluyó que existen conceptos pagados no ejecutados, conceptos estimados y autorizados que no se encuentran pagados y no se encuentran ejecutados y deficiencias técnicas, los cuales fueron señalados y asentados en la cédula de inspección de campo, al personal designado por la ejecutora quien realizó la obra Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR).


Ing. Fernando Escobar López
Auditor Encargado



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública. Oficio No. ECOP-DE-0457/2021 Hermosillo, Sonora, 17 de marzo del 2021. "2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

Asunto: Se le comisiona

Ing. Fernando Escobar López Auditor Encargado. Presente.-


Con fundamento en el Artículo 18 Fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría y en seguimiento a la auditoría No. 01-PUENTECOLORADO17-20SIDUR/2021 se le comisiona para que en compañía de los Ings. Marco Antonio Morales Cuen, Fernando Escobar López y David Molina Correa, efectúen la verificación física de la obra "Rehabilitación y Modernización de Caseta de Peaje en el Puente San Luis Río Colorado" la obra está ubicada en municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

Dicha comisión comprende del 22 al 27 de marzo del año en curso, para lo cual dispondrá de 5 días de viáticos y 1 día de gastos de camino con cargo a los Recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente "Sufragio Efectivo. No Reección"

Lic. Fernando Herrera Saldate Director General



FIDEICOMISO PUENTE COLORADO DAMA LA LUZ 545-6 KM 2.5 CARRETERA A MEXICALI COL DEL RIO SAN LUIS RIO COLORADO SONORA C.P. 83406 TEL 01 65353 40694 caseta_fideicomiso@outlook.com

C.c.p. Ing. Héctor González Tirado. Director General de Administración y Control Presupuestal de la SCG. Archivo minutar EIEA/LMN/GVB


Handwritten signature




Recibido F. Escobar 19/ marzo/2021

Lic. Fernando Herrera Saldade
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DE-0457/2021, de fecha 17 de marzo de 2021, con fundamento en el Artículo 18 Fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría y en seguimiento a la Auditoría No. 01-PUENTECOLORADO17-20SIDUR/2021, se me comisiona para que en compañía de los Ings. Marcos Morales Cuén, Francisco Rivera Velázquez y David Molina Correa, efectúe la verificación física de la obra, "**Rehabilitación y Modernización de Caseta de Peaje en el puente San Luis Río Colorado**", la obra está ubicada en el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.


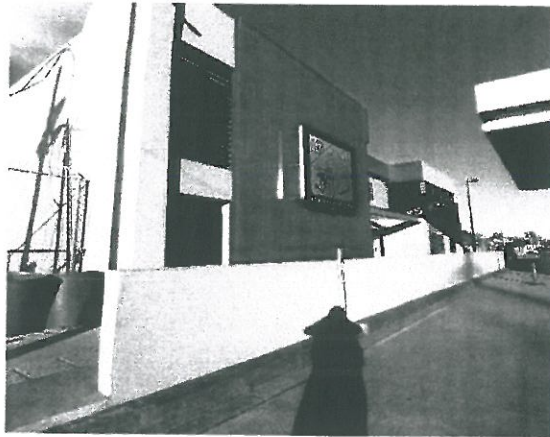


El día 22 de marzo de 2021, se realizó el traslado a la Localidad de San Luis Río Colorado, Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, y nos presentamos en el sitio de la obra, donde nos presentamos con el administrador de la Caseta "Puente Río Colorado" con el cual realizamos un recorrido por la obra.

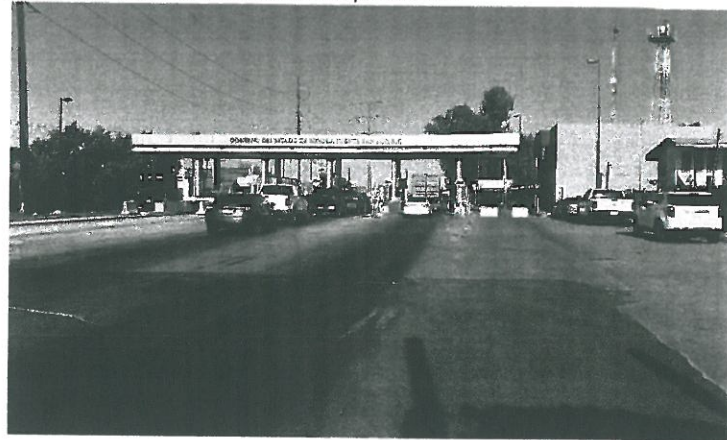

F

El día 23 de marzo de 2021, se efectuó la verificación física en las áreas exteriores, correspondientes a los conceptos de banquetas, guarniciones, vibradores cercos de malla ciclónica, topes en área de estacionamiento y alumbrado exterior.

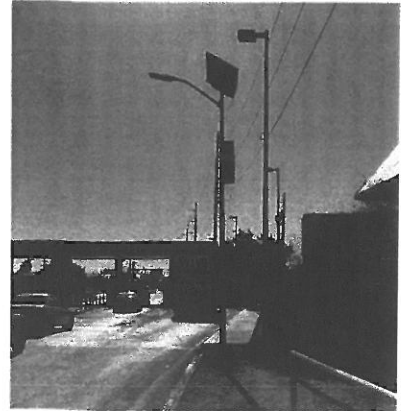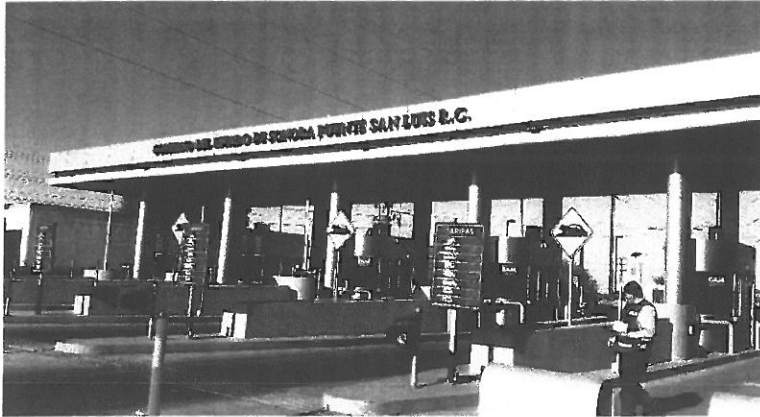

El día 24 de marzo de 2021, se efectuó la verificación física en las áreas de las casetas de cobro, correspondientes a los conceptos de suministro de aire acondicionado e instalación, basamento de las casetas, forrado de columnas a base de panel alucobon, obstáculo de concreto, amortiguador de impacto y semáforos, rótulos informativos.





A handwritten signature in black ink.

El día 25 de marzo de 2021, se continuo con la verificación física en las áreas de la planta baja como fueron el área de facturación, site, baños dentro de oficina y baños públicos, y área de escalera.



El día 26 de marzo de 2021, se efectuó la verificación física en las áreas de la planta alta como fueron el área de pasillo, terraza, oficina de gerencia, dormitorio y azotea.

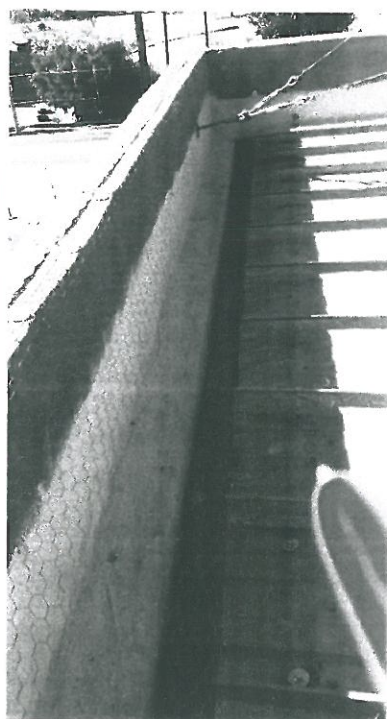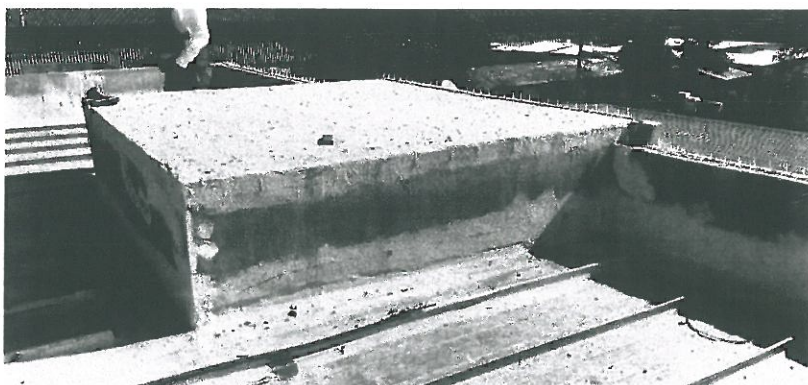

[Handwritten signature]

Informe No. ECOP-DE-0457/2021
Hermosillo, Sonora, a 30 de marzo de 2021

Así como en el área de azotea, donde se verificaron los equipos de aire acondicionado, canalón, base de los equipos de aire acondicionado, e instalaciones eléctricas, chaflanes, impermeabilización, colocación de malla hexagonal.

El día 27 de marzo de 2021 se elaboraron, se elaboraron las Cédulas de Inspección de Campo (documentos de trabajo), por el personal designado para la verificación por parte de la Secretaría de la Contraloría General y por parte de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) quien realizó la obra.

Conclusiones:

Se concluyó que existen conceptos pagados no ejecutados, conceptos estimados y autorizados que no se encuentran pagados y no se encuentran ejecutados y deficiencias técnicas, los cuales fueron señalados y asentados en la cédula de inspección de campo, al personal designado por la ejecutora quien realizó la obra Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR).


Ing. Fernando Escobar López
Auditor Encargado
