



**Lic. Fernando Herrera Saldade**  
**Director General de Evaluación y Control de Obra Pública**  
**Secretaría de la Contraloría General**

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-0624/2021, de fecha 15 de abril del 2021, se me comisiona para que en compañía del Ing. Luis Enrique Torres Federico, efectúe la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondientes a los programas crédito para Infraestructura productiva 2020 y U03 Construcción, las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Empalme y Huatabampo, Sonora.

**El día 20 de abril de 2021, se realizó el traslado a la localidad y municipio de Empalme, realizándose verificación de la siguiente obra:**

**OBRA:** "CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA DESALADORA UBICADA EN LA PLAYA DEL COCHORIT MUNICIPIO DE EMPALME".

**Ejecutora:** JCES

**Programa de Inversión:** UC03 CONSTRUCCION

**Contrato No.:** SIDUR-JCES-ED-CONST-AD-21-001

Avance que presenta los trabajos al momento de la visita



SE APRECIA SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUBRASANTE CON SOBRETAMAÑO



TRABAJOS EN CAPA DE TERRAPLEN



TOMA DE MUESTRA DE CAPA SUBRASANTE, PARA DETERMINAR SU CALIDAD





REALIZACION DE CALAS EN CAPA DE TERRAPLEN, PARA DETERMINAR SU GRADO DE COMPACTACION.

SE PERNOCTO EN NAVOJOA.

El día 21 de abril de 2021, se realizó el traslado a la localidad y municipio de Huatabampo, realizándose verificación de las siguientes obras:

**OBRA:** "REMODELACION DE PLAZA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA"

**Ejecutora:** SIDUR

**Programa de Inversión:** CREDITO PARA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 2020

**Contrato No.:** SIDUR-PF-20-164



COLOCACION DE LADRILLO PARA DAR NIVEL A LOSA DE AZOTEA Y EN PRETIL, EN LOCALES COMERCIALES.



ENJARRE EN INTERIORES DE LOCAL # 2.





AVANCE QUE PRESENTA EN FACHADA PRINCIPAL LOCALES COMERCIALES



PISO DE CONCRETO EN ESQUINA NORORIENTE DE PLAZA





PISO DE 10 CM DE ESPESOR, EN LADO PONIENTE DE PLAZA.



RELIZACION DE ARRIETES Y DETALLADO EN ARRIETES EXISTENTES (ENJARRE Y PINTURA)


**OBRA:** "CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE PROCURACION DE JUSTICIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA"

**Ejecutora:** SIDUR

**Programa de Inversión:** CREDITO PARA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 2020

**Contrato No.:** SIDUR-PF-20-017



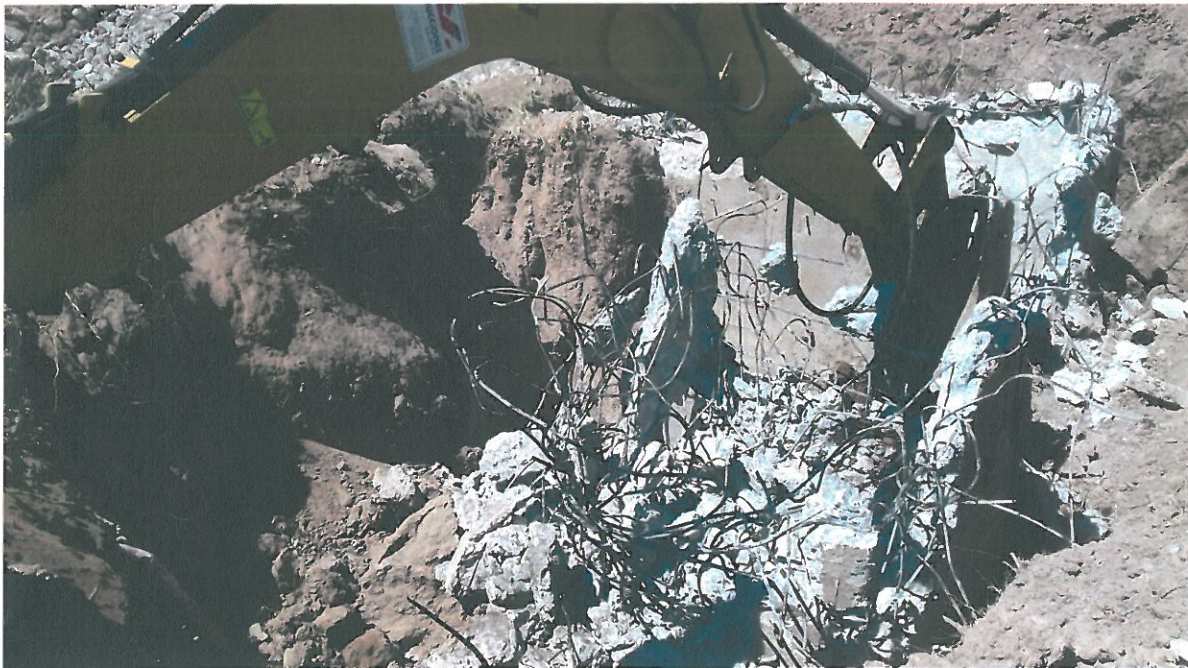



SE PUEDE APRECIAR TRABAJOS DE DEMOLICION DE PILETAS Y RETIRO DE ESCOMBRO.

El día 21 de abril del presente año, habiéndose concluido las actividades de verificación física de las obras, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora

Se anexa copia de oficio de comisión:

**ATENTAMENTE**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Anacleto Terrones Villasana', written over the printed name.

**Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana**





Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.  
Oficio No. ECOP-DV-0624/2021  
Hermosillo, Sonora 15 de abril del 2021.  
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

Asunto: Se le comisiona

**Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana**  
**Auditor Supervisor**  
Presente.

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Luis Enrique Torres Federico, realicen la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondientes a los programas Crédito para Infraestructura Productiva 2020 y U03 Construcción, las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Empalme y Huatabampo, Sonora.

Dicha comisión comprende los días 20 y 21 de abril del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viáticos y 1 día de gastos de camino con cargo a los Recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Toyota Hilux con número de placas VB-71-399, recorriendo 850 kms de carretera pavimentada, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 20 de abril a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**Atentamente**  
**Sufragio Efectivo. No Reelección.**

**Lic. Fernando Herrera Saldate**  
**El Director General**



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION  
Y CONTROL DE OBRA PUBLICA  
HERMOSILLO, SONORA.

C.c.p. Ing. Héctor González Tirado, Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente.  
Lic. Ángela Beatriz Beltrán Figueroa, Director de Recursos Financieros y materiales. Presente.  
Archivo  
RGF/LMN/GVB

**SONORA**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General

**SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS**

<b>FECHA:</b> 15 de abril del 2021		<b>CLAVES PRESUPUESTARIAS:</b> 1060000900 1304E501O02133A1 375011 2111EM13 1060000900 1304E501O02133A1 375021 2111EM13	
<b>ADSCRIPCIÓN:</b> Secretaría de la Contraloría General			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública			
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b> 1304E501O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P			
<b>NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO:</b> Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana NIVEL: 8B No. DE EMPLEADO 37116			
<b>PUESTO FUNCIONAL:</b> Auditor Supervisor			
<b>DESTINO:</b> Empalme y Huatabampo, Sonora.			
<b>MOTIVO:</b> Se le comisiona para en compañía del Ing. Luis Enrique Torres Federico, realicen la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondientes a los programas Crédito para Infraestructura Productiva 2020 y U03 Construcción, las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Empalme y Huatabampo, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DV-0624/2021.			
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN:</b> 20 y 21 de abril de 2021		<b>POR INSTRUCCIONES DE:</b> Lic. Fernando Herrera Saldate Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.	
<b>NÚMERO DE DÍAS</b>	<b>COSTO POR DÍA</b>	<b>TOTAL, POR DÍA</b>	
<b>VIÁTICOS:</b> 1 día	\$ 700.00	\$ 700.00	
<b>GASTOS DE CAMINO:</b> 1 día	\$ 300.00	\$ 300.00	
<b>SUMA TOTAL:</b>		\$ 1,000.00	
<b>OBSERVACIONES:</b> Con cargo a los recursos del 2 al millar estatal.			
<b>RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE:</b> \$ 1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N)			
<b>SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO</b>    <b>ING. ANACLETO IGNACIO TERRONES VILLASANA</b> RFC TEVA610713DV9	<b>SOLICITA – RECIBE</b>  <b>ING. HECTOR GONZALEZ TIRADO</b> DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	<b>AUTORIZA</b>    <b>LIC. FERNANDO HERRERA SALDATE</b> DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA	

8





ANEXO AL OFICIO ECOP-DV-0624/2021

SIDUR(ruta sur)

DIA DE LA VERIFICACION	OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	MONTO	PROGRAMA
20 y 21 DE ABRIL DEL 2021	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA DESALADORA UBICADA EN LA PLAYA DEL COCHORIT MUNICIPIO DE EMPALME.	EMPALME	SIDUR-JCES-ED-CONST-AD-21-001	\$5,000,000.00	UC03 CONSTRUCCION
	REMODELACIÓN DE PLAZA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	HUATABAMPO	SIDUR-ED-20-164	\$2,548,070.62	CREDITO PARA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 2020
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. (PRIMERA ETAPA)	HUATABAMPO	SIDUR-ED-21-017	\$17,294,636.49	CREDITO PARA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 2020
