


Lic. Fernando Herrera Saldate  
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública  
Secretaría de la Contraloría General



En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-1439/2021, de fecha 10 de agosto del 2021, se me comisiona para que, en compañía del Ing. Luis Enrique Torres Federico, efectúe la verificación física de la obra anexa a este oficio, Pavimentación con concreto Hidráulico de 15 centímetros de espesor en el Bulevar Mariano Abasolo entre calle Sin Nombre y La Casona, la obra se encuentra en el municipio de Mazatán, Sonora

El día 13 de agosto del 2021, se realizó el traslado a la localidad y municipio de Mazatán, realizándose verificación de la siguiente obra:

**OBRA:** "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN EL BULEVAR MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LA CASONA".

**Ejecutora:** SIDUR

**Programa de Inversión:** "FINANCIAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA 2020"

**Contrato No.:** SIDUR-ED-21-014


AVANCE QUE PRESENTA LOS TRABAJOS AL MOMENTO DE LA VISITA, DEL BULEVAR MARIANO ABASOLO.



CIMBRA DE GUARNICION



EJECUCION DE REGISTRO SANITARIO

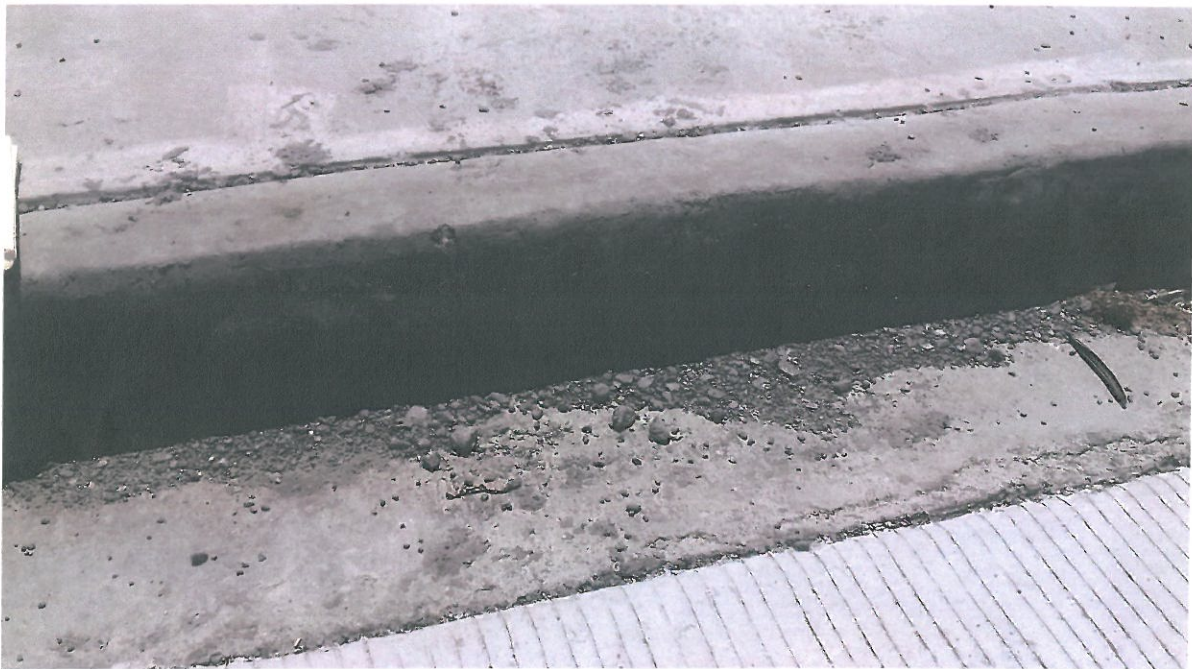

GUARNICION CON ACABADO IRREGULAR



VISTA PANORAMICA DEL BLVD. MARIANO ABASOLO

El día 09 de junio del presente año, habiéndose concluido las actividades de verificación física de la obra, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora

Se anexa copia de oficio de comisión:

**ATENTAMENTE**

**ING. ANACLETO IGNACIO TERRONES VILLASANA**



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.  
Oficio No. ECOP-DV-1439/2021  
Hermosillo, Sonora 10 de agosto del 2021.  
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

Asunto: Se le comisiona

**Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana**  
**Auditor Supervisor**  
Presente.

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que en compañía del Ing. Luis Enrique Torres Federico, realicen la verificación física de la obra "Pavimentación con Concreto Hidráulico de 15 centímetros de espesor en el Bulevar Mariano Abasolo entre calle Sin Nombre y La Casona en la Localidad y Municipio de Mazatán, Sonora", correspondiente al programa Financiamiento Para Infraestructura 2020, la obra se encuentra ubicada en el municipio de Mazatán, Sonora.

Dicha comisión comprende el día 12 de agosto del año en curso para lo cual dispondrá de 1 día de gastos de camino con cargo a los Recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Toyota Hilux con número de placas VB-71-399, recorriendo 200 kms de carretera pavimentada, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 12 de agosto partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.


Atentamente  
Sufragio Efectivo. No Reelección.

  
Lic. Fernando Herrera Saldate  
El Director General



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA  
HERMOSILLO, SONORA.

C.c.p. Ing. Héctor González Tirado. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente.  
Lic. Ángela Beatriz Beltrán Figueroa. Director de Recursos Financieros y materiales. Presente.  
Archivo  
RGF/LMN/GVB





**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MAS

Centro de Gobierno Edificio Hermosillo segundo piso entre Blvd Paseo Río Sonora, Col. Vado del Río, C.P. 83280.  
Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / [www.sonora.gob.mx](http://www.sonora.gob.mx)



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General

**SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS**

<b>FECHA:</b> 10 de agosto del 2021		<b>CLAVES PRESUPUESTARIAS:</b> 1060000900 1304E501O02133A1 375021 2111EM13	
<b>ADSCRIPCIÓN:</b> Secretaría de la Contraloría General			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública			
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b> 1304E501O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P			
<b>NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO:</b> Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana NIVEL: 8B No. DE EMPLEADO 37116			
<b>PUESTO FUNCIONAL:</b> Auditor Supervisor			
<b>DESTINO:</b> Mazatán, Sonora.			
<b>MOTIVO:</b> Se le comisiona para que en compañía del Ing. Luis Enrique Torres Federico, realicen la verificación física de la obra "Pavimentación con Concreto Hidráulico de 15 centímetros de espesor en el Bulevar Mariano Abasolo entre calle Sin Nombre y La Casona en la Localidad y Municipio de Mazatán, Sonora", correspondiente al programa Financiamiento Para Infraestructura 2020, la obra se encuentra ubicada en el municipio de Mazatán, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DV-1439/2021.			
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN:</b> 12 de agosto de 2021		<b>POR INSTRUCCIONES DE:</b> Lic. Fernando Herrera Saldate Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.	
<b>NÚMERO DE DÍAS</b>	<b>COSTO POR DÍA</b>	<b>TOTAL, POR DÍA</b>	
<b>GASTOS DE CAMINO:</b> 1 día	\$ 300.00	\$ 300.00	
<b>SUMA TOTAL:</b>		\$ 300.00	
<b>OBSERVACIONES.</b> Con cargo a los recursos del 2 al millar estatal.			
<b>RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE:</b> \$ 300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N)			
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO   <b>ING. ANACLETO IGNACIO TERRONES VILLASANA</b> RFC TEVA610713DV9	SOLICITA – RECIBE   <b>ING. HECTOR GONZALEZ TIRADO</b> DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	AUTORIZA   <b>LIC. FERNANDO HERRERA SALDATE</b> DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.	

*D*  
*10/08/21*

