



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

**NOMBRE Y NOMBRE DEL PROGRAMA** (0AO) **Infraestructura y Equipamiento Educacion Media Superior**

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO** **Infraestructura y Equipamiento Educacion Media Superior**

**CLAVE PROGRAMÁTICA** **211112317D02252510AO**

**ENTIDAD RESPONSABLE** **Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa**

**UNIDAD EJECUTORA** **Direccion General**

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** **Construccion, rehabilitacion, mantenimiento y equipamiento para escuelas de nivel medio superior, con la finalidad de contribuir a ofrecer una educacion de calidad que responda a las**

**RESULTADO ESPERADO** **Lograr un cumplimiento del 100 % del programa de trabajo en las escuelas de nivel medio superior**

SUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	46,488,206	28,686,252	28,686,252	28,458,869	18,235,541	17,646,092	97	18,235,541	17,646,092	97

**TIPO DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador** **Espacio Educativo** **Tipo** **Estrategico**

**Fórmula de cálculo** **(Numero de planteles escolares de educacion media superior atendidos / total de planteles de educacion media superior a atender)\*100**

**Definición de la prestación** **Medir el cumplimiento del programa de trabajo de los planteles de educacion media superior atendidos con infraestructura fisica educativa**

**Unidad de medida del indicador** **Eficiencia** **Sentido (descendente o ascendente)** **Ascendente**

**Carácter (acumulable o no acumulable)** **Acumulable** **Frecuencia de medición** **Trimestral**

**PERÍODO DEL INDICADOR** **Trimestre** **Primero 2015**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Espacios Educativos a atender	Espacios Educativos	15	5	16	320	5	16	320	107	🔴
Espacios Educativos atendidos										

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
	Espacios Educativos							15	

**Descripción del factor de comparación:**

**Criterios de semaforización**

**Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

**Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

**TIPO Y NOMBRE DEL PROGRAMA (0AO) Infraestructura y Equipamiento Educación Media Superior**



**TÍTULO DEL PROYECTO O** Infraestructura y Equipamiento Educación Media Superior

**CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112317D02252510AO

**UNIDAD RESPONSABLE** Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

**UNIDAD EJECUTORA** Dirección General

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES**

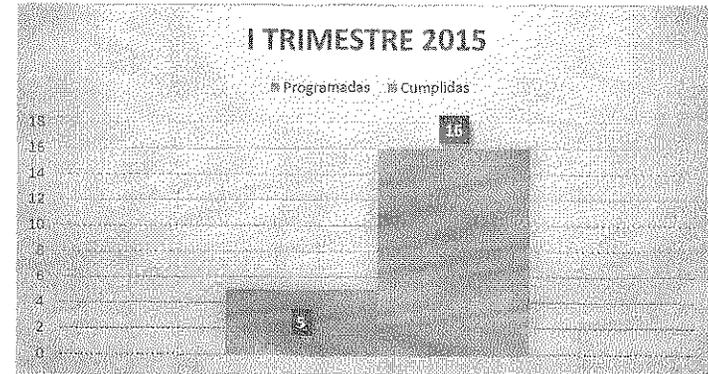

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Debido a que la generación de dictámenes y Actas de Entrega-Recepción para el presente Trimestre superó por amplio margen lo programado se cumplió en más del 100% con esta Meta. Se hace la aclaración que siempre nuestra programación de Dictámenes Técnicos, Supervisión de Obras y Actas de Entrega-Recepción estamos condicionados a la Programación Original del Anteproyecto de Obras de la Secretaría de Educación y Cultura la cual constantemente sufre modificaciones.

**CONCLUSIÓN**

De acuerdo al Avance mostrado en el Primer Trimestre de este ejercicio 2015 se prevé alcanzar al 100 % el cumplimiento de esta meta al finalizar el ejercicio

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Espacios Educativos Media Superior	Espacios Educativos	5	16
Espacios Educativos básica	Espacios Educativos	115	362
Espacios Educativos Superior	Espacios Educativos	5	16

ING. Luis Felipe Romero López  
 Coordinador Ejecutivo

ING. José Guadalupe Beltrán Urquijo  
 Director General de Finanzas y  
 Administración

C.P. Carmen Patricia Santacruz Ríos  
 Dirección de Contabilidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

MER Y NOMBRE DEL PROGRAMA (0AP) Infraestructura y Equipamiento Educacion Superior

NOMBRE DEL PROYECTO O INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCACION SUPERIOR CLAVE PROGRAMÁTICA 211112317D02252510AP

ENTIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UNIDAD EJECUTORA Direccion General

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento para escuelas de nivel superior, con la finalidad de contribuir a ofrecer una educación de calidad que responda a las necesidades de

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	115,128,274	71,069,543	71,069,543	70,506,208	45,178,143	43,717,795	97	45,178,143	43,717,795	97

TIPO DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Espacio Educativo Tipo Estrategico

FÓRMULA DE CÁLCULO (Numero de planteles escolares de educacion superior atendidos / total de planteles de educacion superior a atender)\*100

INTERPRETACIÓN Medir el cumplimiento del programa de trabajo de los planteles de educacion superior atendidos con infraestructura fisica educativa

SENSIBILIDAD DEL INDICADOR Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

PERÍODO (ACUMULABLE O NO ACUMULABLE) Acumulable Frecuencia de medición Trimestral

PERÍODO DEL INDICADOR Trimestre Primero 2015


Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Espacios Educativos a atender	Espacios Educativos	20	5	16	320	5	16	320	80	🟡
Espacios Educativos atendidos										

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
	Espacios Educativos							20	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

**Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
**Critico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

MERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA (0AP) Infraestructura y Equipamiento Educacion Superior

MBRE DEL PROYECTO O Infraestructura y Equipamiento Educacion Superior

CLAVE PROGRAMÁTICA



211112317D02252510AP

DAD RESPONSABLE Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

UNIDAD EJECUTORA

Direccion General

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

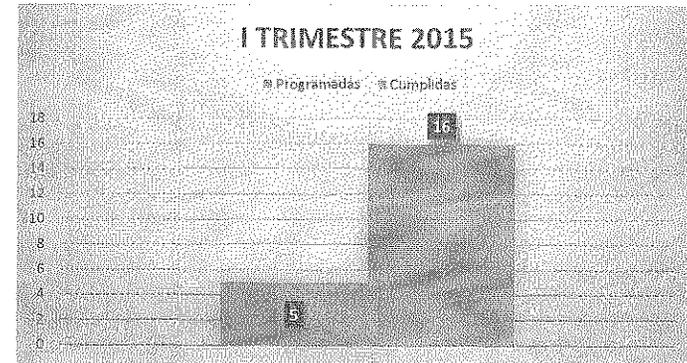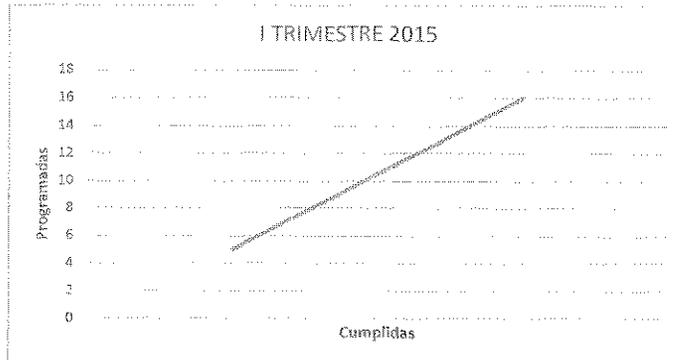

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ido a que la generación de dictámenes y Actas de Entrega-Recepcion para el presente Trimestre superó por amplio margen lo programado se cumplió en mas del 100% con ésta Meta. Se hace la aclaración que siempre en nuestra programación de Dictámenes Técnicos, Supervisión de Obras y Actas de Entrega-Recepción estamos condicionados a la Programación Original del Anteproyecto de Obras de la Secretaría de Educación y Cultura la cual stantemente sufre modificaciones.

OSPECTIVA

ase al Avance mostrado en el Primer Trimestre de este ejercicio 2015 se prevee alcanzar al 100 % el cumplimiento de esta meta al finalizar el ejercicio

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Espacios Educativos Superior	Espacios Educativos	5	16
Espacios Educativos Media Superior	Espacios Educativos	5	16
Espacios Educativos Básica	Espacios Educativos	115	362

ING. Luis Felipe Romero López  
 Coordinador Ejecutivo

ING. José Guadalupe Beltrán Urquijo  
 Director General de Finanzas y  
 Administración

C.P. Carmen Patricia Santacruz Ríos  
 Dirección de Contabilidad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

**TÍTULO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** (014) Coordinación de la gestión y administración de los recursos

**TÍTULO DEL PROYECTO O PROCESO** Coordinación de la gestión y administración de los recursos **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112317D0225251014

**UNIDAD RESPONSABLE** Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa **UNIDAD EJECUTORA** Dirección General

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** Coordinar y conducir el funcionamiento del instituto garantizando que se de cumplimiento a la planeación, gestión, organización, coordinación y análisis de los recursos asignados para el cumplimiento de los programas de trabajo de ejecución de obra

**RESULTADO ESPERADO** Lograr un cumplimiento del 100 % de la gestión de recursos para el desarrollo del programa de trabajo de ejecución de obra

SUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	12,536,589	2,889,985	2,889,985	2,889,185	2,888,880	2,325,343	80	2,888,880	2,325,343	80

**DETALLES DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador** Recursos Financieros **Tipo** De Gestión

**Fórmula de cálculo**  $(\text{Recursos recibidos para la ejecución de obra} / \text{recursos autorizados}) * 100$

**Descripción** Medir la eficiencia de gestión de recursos para el programa de trabajo de la ejecución de obra

**Unidad del indicador** Eficiencia **Sentido (descendente o ascendente)** Ascendente

**Carácter (acumulable o no acumulable)** Acumulable **Frecuencia de medición** Trimestral

**PERÍODO DEL INDICADOR** Trimestre **Primer trimestre 2015**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Recursos Autorizados	Recursos Financieros	100	20	20	100	20	20	100	20	
Recursos Recibidos										

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
	Recursos Financieros							100	

**Descripción del factor de comparación:**

**Criterios de semaforización**

- Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
- Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
- Critico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

TIPO Y NOMBRE DEL PROGRAMA (014) Coordinación de la gestión y administración de los recursos

NOMBRE DEL PROYECTO O SUBPROYECTO Coordinación de la gestión y administración de los recursos

CLAVE PROGRAMÁTICA


211112317D0225251014

UNIDAD RESPONSABLE Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se hace al cumplimiento de casi el 100 % de las metas del Organismo de Control y Desarrollo Administrativo de no ser porque solo se realizaron 2 informes de Auditorías Directas de los 3 Programados, así como también se cumplió de manera total de las Metas Programadas por la Dirección de Finanzas y Administración y debido a que la generación de dictámenes y Actas de Entrega-Recepción para el presente Trimestre superó por amplio margen lo programado se cumplió en más del 100% con esta Meta. Se hace la aclaración que siempre en nuestra programación de Dictámenes Técnicos, Supervisión de Obras y Actas de Entrega-Recepción estamos condicionados a la Programación del Anteproyecto de Obras de la Secretaría de Educación y Cultura la cual constantemente sufre modificaciones.

PERSPECTIVA

Se hace al Avance mostrado en el Primer Trimestre de este ejercicio 2015 se prevé alcanzar al 100 % el cumplimiento de esta meta al finalizar el ejercicio

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Recursos Financieros	Recursos Financieros	20	20
Organismo de Control y Desarrollo Administrativo	Informes	15	14

ING. Luis Felipe Romero López  
 Coordinador Ejecutivo

ING. José Guadalupe Beltrán Urquijo  
 Director General de Finanzas y  
 Administración

C.P. Carmen Patricia Santacruz Ríos  
 Dirección de Contabilidad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

**TIPO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** (09M) Infraestructura y Equipamiento Educación Basica

**TÍTULO DEL PROYECTO O PROCESO** Infraestructura y Equipamiento Educación Basica

**CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112317D022525109M

**UNIDAD RESPONSABLE** Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

**UNIDAD EJECUTORA** Direccion General

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** Construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento para escuelas de nivel basico, con la finalidad de contribuir a ofrecer una educacion de calidad que responda a las necesidades d

**RESULTADO ESPERADO**

SUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	675,443,356	417,113,610	417,113,610	413,807,345	265,154,628	256,583,712	97	265,154,628	256,583,712	97

**UNIDADES DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador** Espacio Educativo **Tipo** Estrategico

**Fórmula de cálculo** (Numero de planteles escolares de educacion basica atendidos / total de planteles de educacion basica a atender)\*100

**Descripción** Medir el cumplimiento del programa de trabajo de los planteles de educacion basica atendidos con infraestructura fisica educativa

**Dimensión del indicador** Eficiencia **Sentido (descendente o ascendente)** Ascendente

**Carácter (acumulable o no acumulable)** Acumulable **Frecuencia de medición** Trimestral

**PERÍODO DEL INDICADOR** Trimestre Primero 2015

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Espacios Educativos a atender	Espacios Educativos	515	115	362	315	115	362	315	70	🟡
Espacios Educativos atendidos										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
	Espacios Educativos							515	

**Descripción del factor de comparación:**

**Criterios de semaforización**

**Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

**Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

PROYECTO Y NOMBRE DEL PROGRAMA (09M) Infraestructura y Equipamiento Educación Basica

TÍTULO DEL PROYECTO O

Infraestructura y Equipamiento Educación Basica

CLAVE PROGRAMÁTICA

211112317D022525109M



UNIDAD RESPONSABLE

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

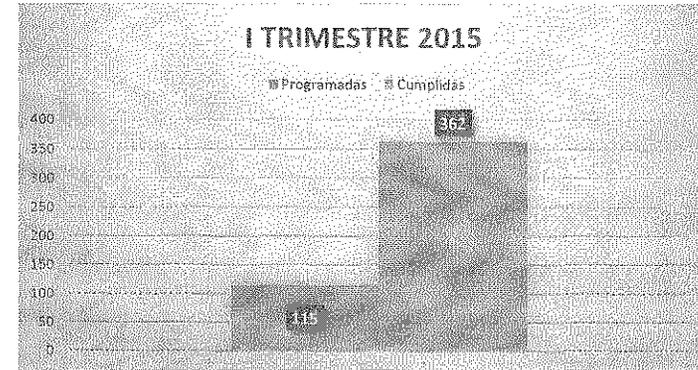

ANÁLISIS CUALITATIVO

Debido a que la generación de dictámenes y Actas de Entrega-Recepcion para el presente Trimestre superó por amplio margen lo programado se cumplió en mas del 100% con ésta Meta. Se hace la aclaración que siempre en toda programación de Dictámenes Técnicos, Supervisión de Obras y Actas de Entrega-Recepción estamos condicionados a la Programación Original del Anteproyecto de Obras de la Secretaría de Educación y Cultura la cual anteriormente sufre modificaciones.

PERSPECTIVA

Basado en el Avance mostrado en el Primer Trimestre de este ejercicio 2015 se prevee alcanzar al 100 % el cumplimiento de esta meta al finalizar el ejercicio

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Espacios Educativos Básico	Espacios Educativos	115	362
Espacios Educativos Media Superior	Espacios Educativos	5	16
Espacios Educativos Superior	Espacios Educativos	5	16

ING. Luis Felipe Romero López  
 Coordinador Ejecutivo

ING. José Guadalupe Beltrán Urquijo  
 Director General de Finanzas y  
 Administración

C.P. Carmen Patricia Santacruz Ríos  
 Dirección de Contabilidad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

**PROYECTO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** (09V) Coordinación del Desarrollo de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Sonora

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA** Coordinación del desarrollo de la infraestructura física educativa del estado de Sonora

**CLAVE PROGRAMÁTICA** 211112317D022525109V

**RESPONSABLE** Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

**UNIDAD EJECUTORA** Dirección General

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** Coordinar la construcción, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos y culturales en el estado de Sonora, para cumplir con las expectativas de la comunidad a

**RESULTADO ESPERADO** Lograr un cumplimiento del 100 % del programa de trabajo

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	23,002,648	2,412,120	2,412,120	2,379,619	2,379,619	1,997,487	84	2,379,619	1,997,487	84

**DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador** Espacio Educativo **Tipo** Programático

**Fórmula de cálculo** (Numero de espacios educativos atendidos/numero de espacios educativos a atender)\*100

**Descripción** Medir el cumplimiento del programa de trabajo para desarrollar la infraestructura física educativa del estado de Sonora

**Medición del indicador** Eficiencia **Sentido** (descendente o ascendente) Ascendente

**Carácter (acumulable o no acumulable)** Acumulable **Frecuencia de medición** Trimestral

**PERÍODO DEL INDICADOR** Trimestre Primero 2015


Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Espacios Educativos a atender	Espacios Educativos	300	100	315	315	100	315	315	105	🟡
Espacios Educativos atendidos										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
	Espacios Educativos							300	

**Descripción del factor de comparación:**

**Criterios de semaforización**

- Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
- Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
- Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

PROYECTO Y NOMBRE DEL PROGRAMA (09V) Coordinación del Desarrollo de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Sonora



TÍTULO DEL PROYECTO O PROGRAMA Coordinación del desarrollo de la infraestructura física educativa del estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA 211112317D022525109V

RESPONSABLE Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

UNIDAD EJECUTORA Dirección General

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

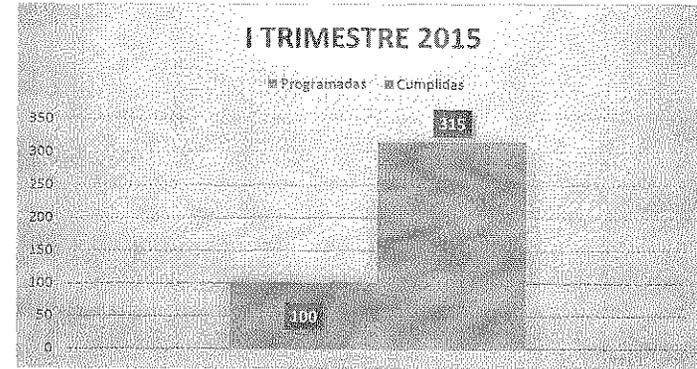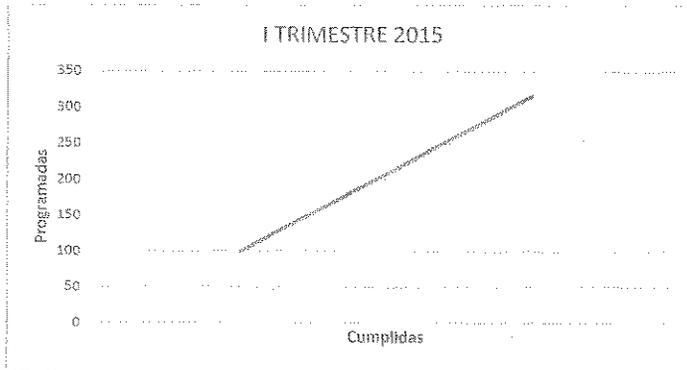

ANÁLISIS CUALITATIVO

Se cumplió al 100 % las Metas Programadas por la Unidad de Informática, así como las de la Coordinación Ejecutiva esto aunado a que la generación de dictámenes y Actas de Entrega-Recepción para el presente Trimestre superó el 100% del margen lo programado se cumplió en mas del 100% con ésta Meta. Se hace la aclaración que siempre en nuestra programación de Dictámenes Técnicos, Supervisión de Obras y Actas de Entrega-Recepción estamos alineados a la Programación Original del Anteproyecto de Obras de la Secretaría de Educación y Cultura la cual constantemente sufre modificaciones.

CONCLUSIÓN

De acuerdo al Avance mostrado en el Primer Trimestre de este ejercicio 2015 se prevé alcanzar al 100 % el cumplimiento de esta meta al finalizar el ejercicio

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Espacios Educativos	Espacios Educativos	100	315
Unidad de Informática	SopORTE Técnico	6	6

ING. Luis Felipe Romero López  
 Coordinador Ejecutivo

ING. José Guadalupe Beltrán Urquijo  
 Director General de Finanzas y  
 Administración

C.P. Carmen Patricia Santacruz Rios  
 Dirección de Contabilidad
