



COMISIÓN ESTAT. DEL AGUA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA
HOJAS GENERADORAS DE CONCEPTOS



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

CASTCO DE MEXICO S. A. DE C. V.
LEOCADIO SALCEDO 17-A, COL. JESUS GARCIA
C.P 83140 HERMOSILLO, SONORA
TEL: (662) 215-79-92

No. DE CONTRATO: **CEA-PROSSAPYS-IHU-OB-14-034**

ESTIMACION 2

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) EN VARIAS LOCALIDADES, MPIO. DE HUATABAMPO, EN EL ESTADO DE SONORA.

| PARTIDA: | DEDUCTIVAS | UNIDAD DE MEDIDA: | PZA | | | | |
|-------------|--|-------------------|------|-----------------------|--------------|-------------|--|
| SUBPARTIDA: | CAJA DE CONTROL BACHANTAHUJI (LA ESCALERA-LA SABIJA): MANO DE OBRA | | | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | CANTIDAD | UNID | TOTAL | | | |
| B284E | INSTALACION DE JUNTA MECÁNICA DE 102 MM (4") A 152 MM. (6") DE DIAMETRO. COMPLETA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, AGARREROS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 0.00 | PZA | 0.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | SUMA = | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | ESTIMACION 1 = | 2.00 | PZA | |
| | | | | DEDUCTIVA = | -2.00 | PZA | |

CROQUIS :

| | | | |
|--|--|------------------------|---|
| REPRESENTANTE LAE LUIS FERNANDO VARGAS CÁRDENAS | SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN ING. MARCOS MARQUEZ MUÑOZ | SUPERVISOR DE OBRA | RESIDENTE DE OBRA ING. JORGE LUIS FERNAN BARCELO |
|--|--|------------------------|---|



COMISION ESTADAL DEL AGUA

COMISION ESTADAL DEL AGUA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA
 HOJAS GENERADORAS DE CONCEPTOS

CASTCO DE MEXICO S. A. DE C. V.
 LEOCADIO SALCEDO 17-A, COL. JESUS GARCIA
 C.P 83140 HERMOSILLO, SONORA
 TEL: (662) 215-79-92

No. DE CONTRATO: CEA-PROSSAPYS-IHU-OB-14-034

DESCRIPCION DE LA OBRA :

CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) EN VARIAS LOCALIDADES, MPIO. DE HUATABAMPO, EN EL ESTADO DE SONORA.

ESTIMACION

PARTIDA : DEDUCTIVAS

SUBPARTIDA:

CLAVE

UNIDAD DE MEDIDA : PZA


VAEAS EN LINEA DE CONDUCCION DE POZO BUAYUMS A REBOMBEO UNION

CONCEPTO

H019B3 SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION. EXPULSION DE AIRE DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO. MARCA FERNANDEZ O SIMILAR, BRIDADA, CON BRIDAS SEGUN ANSH-B16, CLASE 17.5 KG/CM2 (250 PSI).

| CONCEPTO | CANTIDAD | UNID | TOTAL |
|---------------------------------------|----------|----------------|-----------|
| VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE 4" | 4.00 | PZA | 4.00 |
| | | SUMA = | 4.00 |
| | | ESTIMACION 1 = | 5.00 PZA |
| | | DEDUCTIVA = | -1.00 PZA |

CROQUIS :

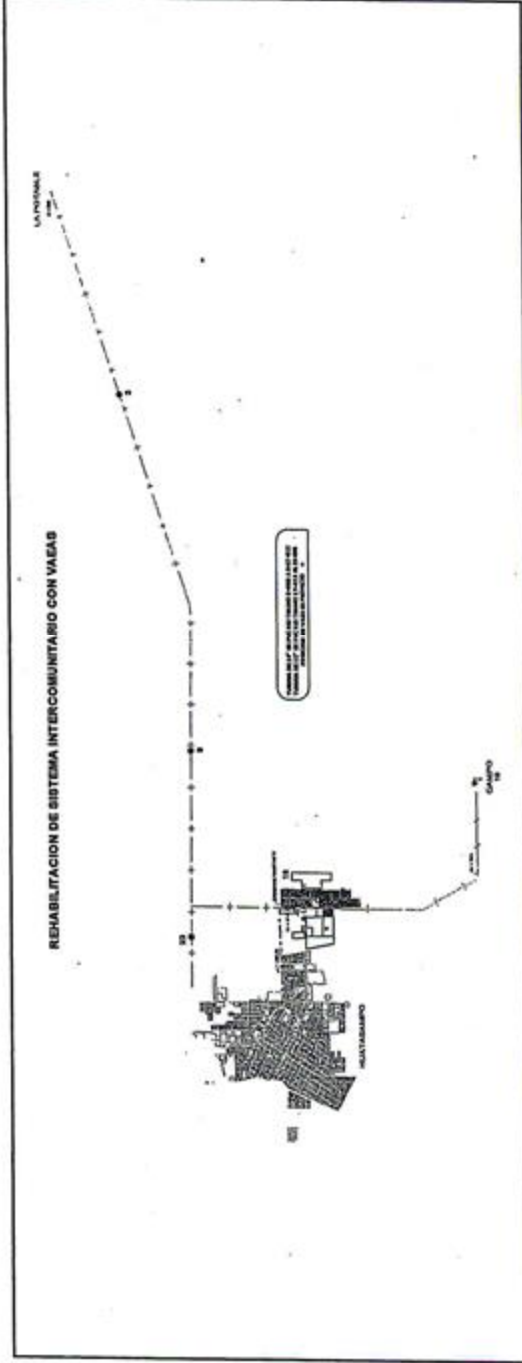

REPRESENTANTE

LAETLUIS FERNANDO VARGAS CARDENAS

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. MARCOS MARQUEZ MUÑOZ

SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]

RESIDENTE DE OBRA

[Signature]

LAETLUIS FERNANDO VARGAS CARDENAS

ING. MARCOS MARQUEZ MUÑOZ

ING. JORGE LUIS VEGAN BARCELO



COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA
HOJAS GENERADORAS DE CONCEPTOS



No. DE CONTRATO: CEA-PROSSAPYS-IHU-OB-14-034

CASTCO DE MEXICO S. A. DE C. V.
LEOCADIO SALCEDO 17-A, COL. JESUS GARCIA
C.P 83140 HERMOSILLO, SONORA
TEL: (662) 215-79-92

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE AGUA POTABLE (ZDA. ETAPA) EN VARIAS LOCALIDADES, MPIO. DE HUATABAMPO, EN EL ESTADO DE SONORA.

ESTIMACION

| PARTIDA: | SUBPARTIDA: | CLAVE | DEDUCTIVAS | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA: | | CANTIDAD | UNID | | TOTAL |
|----------|-------------|-------|------------|---|---|----------|----------|--------|-------|-------|
| | | | | | VAEAS EN LINEA DE CONDUCCION DE POZO BUAYUMS A REBOMBEO UNION | CONCEPTO | | PZA | PZA | |
| H068E2 | | | | SUMINISTRO DE NIPLE DE Fo.Go. DE 102 MM (4") DE DIAMETRO X 0.20 M. DE LONGITUD. | | PZA | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | | | ESTIMACION 1 = | | | SUMA = | 5.00 | PZA |
| | | | | | DEDUCTIVA = | | | | -5.00 | PZA |

CROQUIS:

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| REPRESANTANTE | SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION | SUPERVISOR DE OBRA | RESIDENTE DE OBRA |
| | | | |
| LAE LUIS FERNANDO VARGAS CARDENAS | ING. MARCOS MARQUEZ MUÑOZ | | ING. JORGE LUIS... |



COMISION ESTADAL DEL AGUA

COMISION ESTADAL DEL AGUA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA
HOJAS GENERADORAS DE CONCEPTOS



CASTCO DE MEXICO S. A. DE C. V.
LEOCADIO SALCEDO 17-A, COL. JESUS GARCIA
C.P 83140 HERMOSILLO, SONORA
TEL: (662) 215-79-92

No. DE CONTRATO: CEA-PROSSAPYS-IHU-OB-14-034

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) EN VARIAS LOCALIDADES, MPIO. DE HUATABAMPO, EN EL ESTADO DE SONORA.

ESTIMACION

PARTIDA:

SUBPARTIDA:

CLAVE

DEDUCTIVAS

VAEAS EN LINEA DE CONDUCCION DE POZO BUAYUMS A REBOMBEO UNION

CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA:

PZA

H022D SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA CON VÁSTAGO FIJO Y RESILIENTE DE 102 MM DE (4") DE DIAMETRO. MARCA FERNÁNDEZ O SIMILAR. PARA PRESION DE TRABAJO ESTÁNDAR (150 PSI). BRIDADA.

CONCEPTO

CANTIDAD

UNID

TOTAL

VALVULA DE COMPUERTA DE 4"

4.00

PZA


4.00

SUMA = 4.00

ESTIMACION 1 = 5.00 PZA

DEDUCTIVA = -1.00 PZA

CROQUIS:

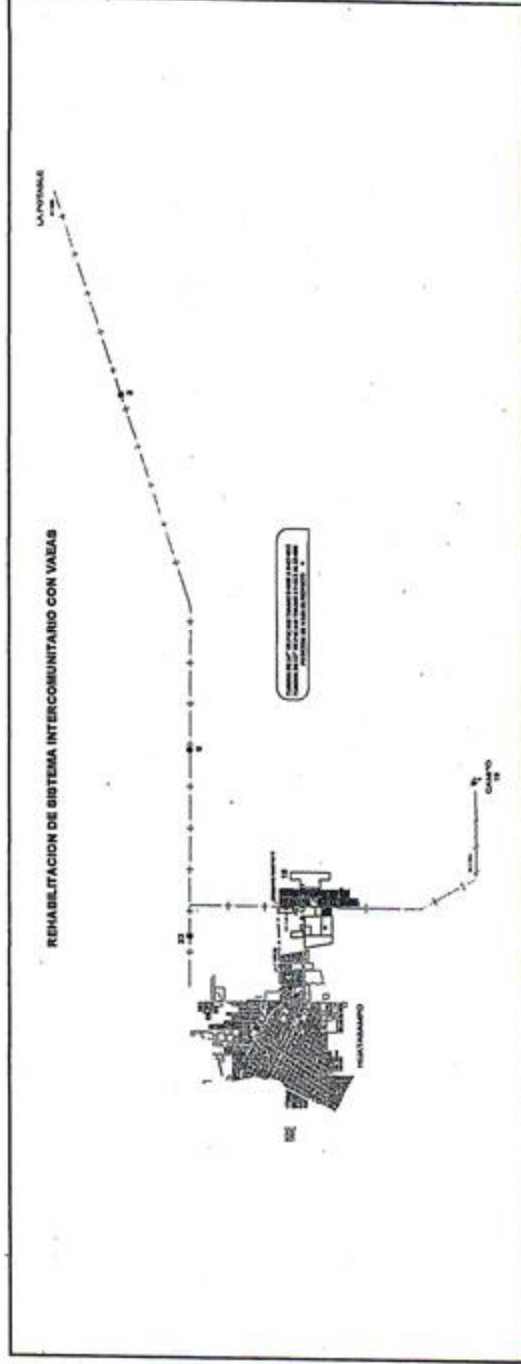

REPRESENTANTE

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

[Signature]
LAE LUIS FERNANDO VARGAS CARDENAS

[Signature]
ING. MARCOS MARQUEZ MUÑOZ

[Signature]
ING. JORGE LUIS TERAN BARCELO



COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA
HOJAS GENERADORAS DE CONCEPTOS



COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

CASTCO DE MEXICO S. A. DE C. V.
LEOCADIO SALCEDO 17-A, COL. JESUS GARCIA
C.P 83140 HERMOSILLO, SONORA
TEL: (662) 215-79-92

No. DE CONTRATO: CEA-PROSSAPYS-IHU-OB-14-034


DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) EN VARIAS LOCALIDADES, MPIO. DE HUATABAMPO, EN EL ESTADO DE SONORA.

ESTIMACION

| PARTIDA: | DEDUCTIVAS | UNIDAD DE MEDIDA: | PZA |
|-------------|---|-------------------|-----------|
| SUBPARTIDA: | VAEAS EN LINEA DE CONDUCCION DE POZO BUAYUMS A REBOMBEO UNION | | |
| CLAVE | CONCEPTO | | |
| H091E2 | SUMINISTRO DE TEE PARTIDA DE ACERO INOXIDABLE DE 14" X 4" (366 MM X 102 MM) DE DIAMETRO | | |
| | | CANTIDAD | UNID |
| | | 4.00 | PZA |
| | | | TOTAL |
| | | | 4.00 |
| | | SUMA = | 4.00 |
| | | ESTIMACION 1 = | 5.00 PZA |
| | | DEDUCTIVA = | -1.00 PZA |

CROQUIS:

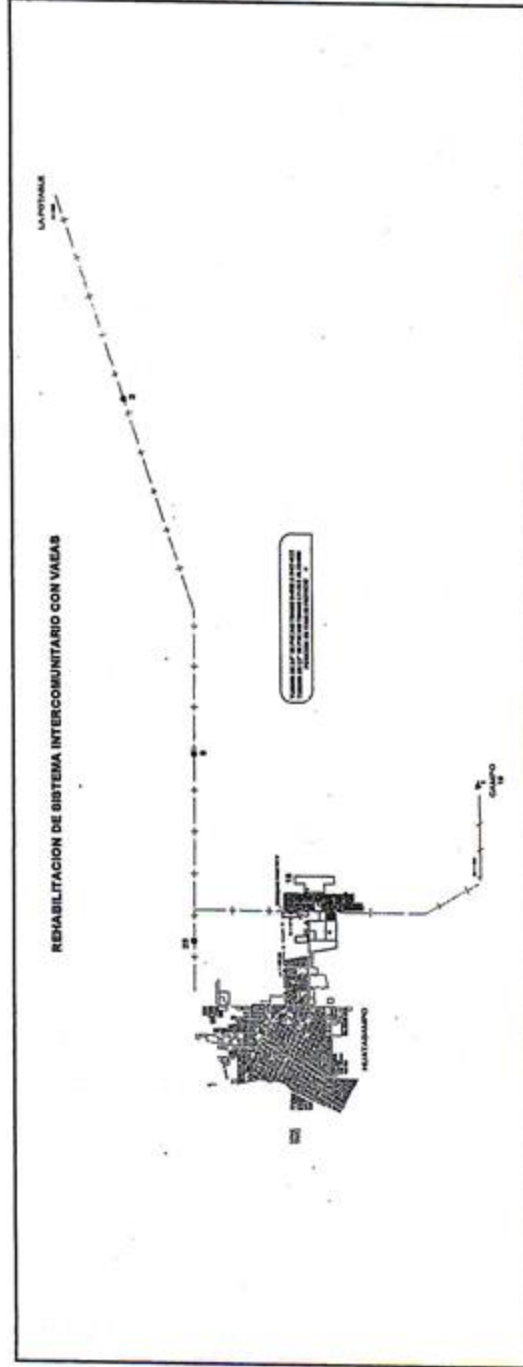

REPRESENTANTE

LAE LUIS FERNANDO VARGAS CARDENAS

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. MARCOS MARQUEZ MUÑOZ

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

ING. JORGE LUIS FERRER BARCELO



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

C. LIC. GUILLERMO PADRES ELIAS
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE ESTADO
DE SONORA

C. ING. HÉCTOR ORTIZ CISCOMANI
SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA,
RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA

LIC. RENE FRANCISCO LUNA SUGICH
ENCARGADO DE VOCALIA EJECUTIVA
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LOCALIZACION



HUATABAMPO

LOCALIDAD: VARIAS
MUNICIPIO: HUATABAMPO, SONORA
PROYECTO:
Construcción de Sistema
Intercomunitario de Agua Potable
(2da. etapa)

PLANO DE: OBRA TERMINADA
VAEAS Y DESFOGUES BAYUMS
ESCALA: FECHA: ACOTACIONES:
ESCALA INDICADA: FEB-2015 METROS
ARCHIVO:
PLANO No. 5

LIC. RENE FRANCISCO LUNA SUGICH
Enc. Despacho de Vocalia Ejecutiva

ING. LUIS HERMAN VALENZUELA SALAS
Director General de Infraestructura
Hidráulica Urbana

PLANO ELABORADO POR:
CASTRO DE MEXICO S. A. DE C. V.
LIC. LUIS FERNANDO VARGAS CARDENAS.
REPRESENTANTE LEGAL.

SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION.

ING. MARCOS MARQUEZ NUÑOZ

ING.

Bitácora Electrónica de Obra Pública

Organismo: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE SONORA

Área: DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
URBANA

Contrato: CEA-PROSSAPYS-IHU-OB-14-034 (14-034)

Obra: CONSTRUCCION DE SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE AGUA
POTABLE (2DA ETAPA) EN LOCALIDADES VARIAS DEL
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, EN EL ESTADO DE SONORA

Lugar: LOCALIDADES VARIAS EN HUATABAMPO, SONORA.

No. de nota: 1

Fecha: 2014-12-08 14:35:02.0

Tipo Nota: Apertura

Referencia:

| Contratista | | Dependencia | |
|-------------------------|---|--------------------|--|
| Nombre del Contratista: | CASTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Nombre: | DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA |
| Domicilio: | LEOCADIO SALCEDO NUMERO 17 A COLONIA JESUS GARCIA | Centro de Trabajo: | COMISION ESTATAL DEL AGUA |
| Teléfono: | 016622157992 | Domicilio: | OCAMPO NO. 49 COLONIA CENTENARIO |
| | | Teléfono: | 2895700 |

Datos particulares del contrato

| | | | |
|--|--|-------------------|------------|
| Número del Contrato: | CEA-PROSSAPYS-IHU-OB-14-034 | Proyecto: | NC1-583 |
| Partida Presupuesta: | 1215E12K008A1261303A00001.0098 | | |
| Objeto del contrato: | CONSTRUCCION DE SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, EN EL ESTADO DE SONORA | | |
| Plazo: | 31 Días naturales. | Fecha de inicio: | 01/12/2014 |
| | | Fecha de Término: | 31/12/2014 |
| Monto: | 4,972,067.70 MN | | |
| Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos: | LOCALIDADES VARIAS EN HUATABAMPO, SONORA. | | |
| Localización de la residencia de la obra: | HUATABAMPO, SONORA | | |

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

| |
|--|
| Superintendente de construcción |
| Nombre: MARQUEZ MUÑOZ MARCOS |
| Profesión: INGENIERO CIVIL |
| Identificación oficial : MAMM760425524 |
| Domicilio: CERRADA NUEVA VICTORIA ORQUIDIA No. ext.449 |
| Teléfono: 6622157992 |
| Correo electrónico: castco@prodigy.net.mx |

| |
|--|
| Residente |
| Nombre: TERAN BARCELO JORGE LUIS |
| Profesión: INGENIERO |
| Identificación oficial : 0580023253964 |
| Domicilio: CENTENARIO OCAMPO No. ext.49 |
| Teléfono: 2895700 |
| Correo electrónico: TERANBARCELO@HOTMAIL.COM |
| Ficha: 365 |

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

Firmada por:

MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 2

Fecha: 2014-12-15
11:12:45.0

Tipo Nota: Validación

Referencia:

Horarios para Asentar Notas

Se podran asentar notas en el siguiente horario:
00:01 a 23:59 lunes, martes, miercoles, jueves,viernes, sabado, domingo
La bitácora se podra consultar las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas:8 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los número generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Mensual

Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al contrato , establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:
La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)

No. de nota: 3

Fecha: 2014-12-15
11:31:20.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2014 SE INICIA LA OBRA CON DESMONTE Y LIMPIA DEL TRAZO DE LA LINEA DE CONDUCCION HACIA EL EJIDO ECHEVERRIA. .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)

No. de nota: 4

Fecha: 2015-04-22
14:19:00.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA DEL 1ro. DE DICIEMBRE DEL 2014; SE REALIZO UNA REVISION FISICA EN COMPAÑIA DEL SUPERVISOR DEL CEA, EN LA CUAL SE OBRSERVO QUE EN EL TRAZO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL TRAMO EJIDO CAMPO 19 AL EJIDO ECHEVERRIA, ES NECESARIO REALIZAR ALGUNOS CRUCES DE CANALES Y DRENES QUE NO VIENEN CONTEMPLADOS EN PROYECTO (PLANOS Y CATALOGO DE CONCEPTOS), POR LO QUE SE SOLICITA NOS DETALLE COMO SE HARAN ESTOS CRUCES PARA SU ANALISIS DE COSTOS.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 5

Fecha: 2015-04-22
14:28:34.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA DEL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014; SE SOLICITA SUPERVISION LA UBICACIÓN EXACTA DE LAS VAEAS A CONSTRUIR SOBRE LA LINEA DE 14 DIAM. YA QUE GRAN PARTE DE ELLAS SE ENCUENTRAN EN TERRENOS AGRICOLAS ACTUALMENTE EN CULTIVO, POR LO QUE SERIA CONVENIENTE REUBICARLAS..

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 6

Fecha: 2015-04-22
14:31:33.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA DEL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014; SE SOLICITA SUPERVISION SE REVISE LO RELATIVO A LA UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS (MOTORES ELECTRICOS) EXPECIFICATOS EN PROYECTO, ADEMAS ACLARAR QUE EL PROYECTO NO CONTEMPLA LA COLUMNA DONDE SE COLOCARA LA BOMBA DEL POZO No. 2 (BAYUMS)..

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 7

Fecha: 2015-04-22
14:40:23.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014: EN REUNION CELEBRADA EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES, SUPERVISION DE OBRA, SE ESTABLECIO QUE LA UBICACION DE LAS VAEAS Y DESFOGES SOBRE LA LINEA DE 14 Y 12 DE DIAM. SERAN UBICADAS POR PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO A SI COMO DE OMAPAS DEL MUNICIPIO, POR LO QUE SE ESTA EN ESPERA DE ESTA ACTIVIDAD PARA DEFINIR CON EXACTITUD LA UBICACION DE LAS MISMAS Y LA CANTIDAD A CONSTRUIR. .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (J.LTERBAR) (RESIDENTE)
MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)

No. de nota: 8

Fecha: 2015-04-22
14:44:21.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014: SE INFORMA A SUPERVISION QUE YA SE ESTA TRABAJANDO EN LA EXCAVACION, PLANTILLA, TENDIDO DE TUBERIA Y RELLENOS DE LINEA DE CONDUCCION DE 6 DIAM. DE CAMPO 19 A ECHEVERRIA. Y QUE LA DEPENDENCIA OOMAPASH DE HUATABAMPO, SUGIERE SE CAMBIE LA TRAYECTORIA EN EL PUNTO DONDE ESTA ENTRA AL EJEIDO ECHEVERRIA Y QUE DICHA LINEA SE CONECTE EN OTROS PUNTOS, YA QUE DE ESTA FORMA ES MAS FUNCIONABLE PARA TAL ORGANISMO OPERADOR.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (J.LTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 9

Fecha: 2015-04-22
14:47:04.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014: SE INFORMA A SUPERVISION QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN LA NOTA ANTERIOR Y QUE SE ENCONTRO EN ALGUNOS TRAMOS EL NIVEL FREATICO MUY SUPERFICIAL POR LO QUE SE TENDRA QUE ACHICAR CON EQUIPO DE BOMBEO DONE DE SE REQUIERA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (J.LTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 10

Fecha: 2015-04-22
15:00:58.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2014 CON OFICIO NO. PM-622-2014 ELABORADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO DIRIGIDA AL VOCAL EJECUTIVO LIC. RENE FRANCISCO LUNA SUGICH EN DONDE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA POSIBILIDAD DE REINICIAR LAS OBRAS DE V.A.E.A.S Y DESFOGES PARA EL PROXIMO MES DE ENERO, YA QUE EN ESTAS FECHAS DECEMBRINAS SE INCREMENTA CONSIDERABLEMENTE LOS CONSUMOS DE AGUA DEBIDO AL ALTO NUMERO DE PERSONAS QUE VISITAN LA CIUDAD Y EL MUNICIPIO; Y LA CONSTRUCCION DE LAS VAEAS Y DESFOGES IMPLICA CORTAR EL SUMINISTRO DE AGUA POR PERIODOS PROLONGADOS. .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (J.LTERBAR) (RESIDENTE)
MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)

No. de nota: 11

Fecha: 2015-04-22
15:14:05.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2014 DE OFICIO NO. CEA-2014/0466 DIRIGIDA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUATABAMPO (M.V.Z. RAMON ANTONIO DIAZ NIEBLAS) REFERENTE AL OFICIO NO. PM-622-2014 DONDE HACE MENCION DE INTERRUMPIR LOS TRABAJOS Y QUE LOS MISMOS SE CONTINUEN EL PROXIMI MES DE ENERO DEL 2015 YA QUE NO DESEA QUE EL SERVICIO SE VEA INTERRUMPIDO; SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL CIERRE DEL CONTRATO Y DE LOS RECURSOS FEDERALES ES POR NORMATIVIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO, QUE SERIA EL PROXIMO 31 DE DICIEMBRE DE 2014 POR LO QUE NO ES POSIBLE ATENDER DE MANERA SATISFACTORIA DICHA SOLICITUD, YA QUE TENDRIAMOS QUE DEJAR LA OBRA INCONCLUSA Y LOS RECURSOS SIN EJERCER. .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (J.LTERBAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (J.LTERBAR) (RESIDENTE)
MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)

No. de nota: 12

Fecha: 2015-04-22
15:22:48.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014 SE DIRIGE OFICIO CON NUMERO 12 AL VOCAL EJECUTIVO LIC. RENE FRANCISCO LUNA SUGICH DE PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO DONDE SOLICITAN DE MANERA MAS ATENTA QUE SEA REUBICADA LA LINEA HIDRAULICA DE 4 DE DIAMETRO EN LA LOCALIDAD DE EL RIITO LA CUAL SEGUN PLANO DE PROYECTO ESTA IBA A SER INSTALADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA HUATABAMPO - HUATABAMPITO CON UNA LONGITUD DE 250.0 M.L. .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (J.LTERBAR) (RESIDENTE)
Firmada por: MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (J.LTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 13

Fecha: 2015-04-23
13:26:03.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014 SE HAN INSTALADO 3,020 M.L. DE TUBERIA HIDRAULICA DE 6 PULGADAS EN LA LINEA DE CONDUCCION ECHEVERRIA, 4.0 CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS CON SUS CONTRAMARCOS Y MARCOS Y TAPAS DE FO.FO., 4.0 VALVULAS DE ADMISION Y EXPLUSION DE AIRE DE 1 PULGADA DE DIAMETRO. EN UNION CAMPESINA YA SE INSTALARON 790.0 M.L. DE TUBERIA HIDRAULICA DE 4 DE DIAMETRO. .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)

No. de nota: 14

Fecha: 2015-04-23
13:35:27.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 22 DE DICIEMBRE SE RECIBE OFICIO POR PARTE DEL ORGANISMO OPERADOR DE HUATABAMPO DONDE MANIFIESTA QUE SE REUBIQUE LA LINEA DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO EN LA LOCALIDAD DE EL RITO LA CUAL SEGUN PLANO DE PROYECTO ESTA IBA A SER INSTALADA AL LADO DERECHO DE LA CARRETERA HUATABAMPO-HUATABAMPITO CON UNA LONGITUD DE 250.0 M.L. YA QUE SE REALIZARON SONDEOS POR PARE DE ESTA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SE PUDO VERIFICAR QUE LA LINEA YA ES EXISTENTE LA CUAL CORROBORO EL ING. HILARIO LAM MENDOZA (DIRECTOR TECNICO DEL ORGANISMO OPERADOR DE HUATABAMPO).

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 15

Fecha: 2015-04-23
13:52:34.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

SE INFORMA A SUPERVISION QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE 6 Y 4 PULGADAS DE DIAMETRO EN LINEA DE CONDUCCION ECHEVERRIA Y UNION CAMPESINA ADEMAS SE LE COMENTA QUE EN EL TRAYECTO DE LA LINEA DE CONDUCCION ECHEVERRIA, ESTA ATRAVIESA POR UNA AREA FANGOSA, POR LO QUE SE RECOMIENDA HACER UN RELLENO A UN COSTADO DE LA CARRETERA PARA PROTEGER DICHA TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO. EL TRAMO A CONSIDERAR ES DE 131.0 MTS.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 16

Fecha: 2015-04-23
13:56:53.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

SE LE INFORMA A SUPERVISION QUE LA NOTA NO. 15 ES CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2014 YA QUE POR ERROR NO SE INDICO DICHA FECHA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 17

Fecha: 2015-04-23
14:04:17.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA DE 23 DE DICIEMBRE DE 2014 SE LE INFORMA A LA SUPERVISION DE QUE YA SE TERMINARON DE FABRICAR LOS CRUCES DE CANALES AGRICOLAS Y DRENES CON TUBERIA DE ACERO DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO Y SE PROCEDERA A REALIZAR LA INSTALACION SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION ECHEVERRIA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARCOS MARQUEZ MUÑOZ (MARQUEZ14034) (CONTRATISTA)
JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

No. de nota: 18

Fecha: 2015-04-23
14:32:57.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2014 EL H. AYUNTAMIENTO ENVIA OFICIO NO. PM-624-2014 DIRIGIDO AL VOCAL EJECUTIVO DE LA CEA DONDE INDICA QUE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 14 PULGADAS DE DIAMETRO CON 750.0 M.L. DE TUBERIA HIDRAULICA P.V.C. C-7 SEAN DESTINADOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL POZO 2 DE LOS BUAYUMS. . .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 19

Fecha: 2015-04-23
14:37:58.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 24 DE DICIEMBRE EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR C.P. CARLOS RAFAEL ESCALANTE RUIZ ENVIA OFICIO AL VOCAL EJECUTIVO DE LA CEA LIC. RENE FRANCISCO LUNA SUGICH EN DONDE SOLICITA LA MODIFICACION DE LA ALIMENTACION ELECTRICA PARA LOS POZOS 2 Y 3 EN LA ZONA DE CAPTACION LA POTABLE (LOS BUAYUMS). .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)
Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 20

Fecha: 2015-04-23
14:43:41.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2014 LA CONTRATISTA ENTREGA A ESTA SUPERVISION SOLICITUD DE PRECIOS UNITARIOS FUERA DE PRESUPUESTO PARA SU REVISION Y APROBACION Y PROCEDE. SE ELABORA MEMORANDUM DIHU-536/14 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2014 DONDE SE SOLICITAN LOS PRECIOS UNITARIOS A LA DIRECCION DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS PARA SU REVISION Y APROBACION SI PROCEDE; SE ANEXAN LOS PRECIOS UNITARIOS..

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 21

Fecha: 2015-05-12
14:49:06.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON OFICIO NO. DCCC-727-14 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2014 DIRIGIDO AL M.C. LUIS HERMAN VALENZUELA SALAS POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS REFERENTE A LA AUTORIZACION DE PRECIOS SOLICITADOS POR MEMORANDUM DIHU-536/14 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2014; ES RECIBIDO CON FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2014. ESTA SUPERVISION ENVIA COPIA DE LA RELACION DE LOS PRECIOS YA AUTORIZADOS A LA CONTARTISTA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 22

Fecha: 2015-05-12
15:00:53.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 27 DE DICIEMBRE LA CONTRATISTA HACE ENTREGA A ESTA SUPERVISION DE LA PRIMERA ESTIMACION LA CUAL COMPRENDE UN PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 POR UN IMPORTE DE RECURSO ESTATAL DE \$1,423,709.92 NO INCLUYE I.V.A. Y POR \$1,423,709.92 SIN I.V.A. DE RECURSO FEDERAL, PRTESENTANDO UN AVANCE DE 70% FISICO Y 65.85% FINANCIERO. QUEDANDO UN SALDO TOTAL DE \$1,438,845.42 SIN I.V.A..

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 23

Fecha: 2015-05-12
15:29:42.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 LA CONTRATISTA LLEVA INSTALADO 4,025.50 M.L. DE TUBERIA HIDRAULICA P.V.C. C-7 DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO REFERENTE A LA LINEA DE CONDUCCION AL EJIDO ECHEVERRIA. YA SE INSTALO Y SE REALIZO EL RECUBRIMIENTO CON PINTURA LA TUBERIA DE ACERO LISO DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO EN LOS CRUCES DE LOS DRENES Y CANALES, SE CONSTRUYERON EN TOTAL 6.0 CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS T-2, SE INSTALARON 6.0 CONTRAMARCOS DE 1.10 M. CON CANAL DE 102 MM. Y 6.0 MARCOS Y TAPAS DE FO.FO. SE HAN INSTALADO 5.0 VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1 PULGADA DE DIAMETRO Y 2.0 VALVULAS DE COMPUERTA DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO. LA CONTRATISTA YA INSTALO LOS 250.0 M.L. DE TUBERIA HIDRAULICA P.V.C. RD-41 DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO EN LA LOCALIDAD DE EL RIITO. EN LA LINEA DE CONDUCCION A UNION CAMPESINA YA SE INSTALARON 1,054.0 M.L. DE TUBERIA HIDRAULICA RD-41 P.V.C. DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO, SE INSTALO 1.0 VALVULA DE COMPUERTA DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO Y SE CONSTRUYO 1.0 CAJA DE VALVULA T-9, SE INSTALARON 2.0 CONTRANMARCOS DE 1.40 M. CON CANAL DE 102 MM. Y 2.0 MARCOS Y TAPAS DE FO.FO. LA CONTRATISTA YA REALIZO LAS CONEXIONES CORRESPONDIENTES EN LOS CRUCEROS DE ECHEVERRIA Y UNION CAMPESINA LAS CUALES YA ESTAN CONECTADAS A LA RED EXISTENTE DE CADA COMUNIDAD. CABE INDICAR QUE LA CONTRATISTA YA CUENTA CON LA MAYOR PARTE DE LOS SUMINISTROS DE LOS MATERIALES EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 24

Fecha: 2015-05-12
20:49:21.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2014 LA CONTRATISTA ESTA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS EN LAS LINEAS DE CONDUCCION EXISTENTES DEL POZO BUAYUMS A REBOMBEO UNION.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 25

Fecha: 2015-05-13
12:25:50.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2014 LA CONTRATISTA LLEVA LOS SUMINISTROS DE MATERIALES A LA ZONA DE CAPTACION LA POTABLE (LOS BUAYUMS) Y SE ESTA COORDINANDO CON EL DIRECTOR TECNICO DEL ORGANISMO OPERADOR DE HUATABAMPO (ING. HILARIO LAM MENDOZA) PARA PROGRAMAR EL CIERRE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EMPEZAR A PROGRAMAR LA INSTALACION DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE YA QUE LA CONTRATISTA INFORMA A ESTA SUPERVISION QUE ACELERARA EL RITMO DE TRABAJO.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

Firmada por: JORGE LUIS TERAN BARCELO (JLTERBAR) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.

05/ENERO/2015
Luis Fernando Vargas

CASTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
KFC C.A.E. 020111-JN3
CALLE LEOCADIO SALCEDO 17 A ENTRE CLAYTON Y CALLE UNO
COL. SAN BENITO C.A. 83190 HERMOSILLO, SON.
TEL: 52 52 79 91 e-mail: castco@proadigital.com

Oficio No. CEA-0014/15
Hermosillo, Sonora, a 05 de Enero del 2015
ASUNTO: Se notifica sanción por atraso.

CASTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CALLE LEOCADIO SALCEDO 17 A
COL. SAN BENITO C.P. 83190
HERMOSILLO, SONORA.
P R E S E N T E.

AT'N: LUIS F. VARGAS CARDENAS
En su carácter de representante Legal de la empresa

Con relación a la obra: **"Construcción del Sistema Intercomunitario de Agua Potable (2da. Etapa), en Varias Localidades, Municipio de Huatabampo, en el Estado de Sonora"** que se tiene en proceso de construcción con esa empresa según contrato No. CEA-PROSSAPYS-IHU-OB-14-034, por este conducto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos en este frente tienen fecha de terminación al 31 de Diciembre del 2014, según la programación pactada en el contrato, y al día del presente aún no se concluyen los trabajos, por lo que se le está requiriendo nos informe por este mismo conducto, de las acciones que se llevarán a cabo para concluir las actividades a la brevedad posible, toda vez que desde el día primero del mes ya está incurriendo en sanción según se establece en la Normatividad para estos casos y de acuerdo a los términos y condiciones pactadas en su contrato de obra.

Es muy importante que al término de los trabajos nos informe vía oficio de la conclusión de los mismos, para efecto del cierre documental y en su caso, la notificación del alcance de la sanción acorde a su fecha de término.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL ENCARGADO DEL DESPACHO
DE VOCALIA EJECUTIVA

LIC. RENE FRANCISCO LUNA SUGICH

C.c.p. M.C. Luis Herman Valenzuela Salas, Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana de la CEA.
C.c.p. Ing. Guillermo Martínez Nieblas, Director de Supervisión y Construcción de la DGIHU.
C.c.p. Expediente
RFLS/LHVS/GMN/ELL



COMISION ESTATAL DEL AGUA
Solventación de Observaciones a la Segunda Revisión a los Informes
Trimestrales del Ejercicio 2014 relativos a Obra Pública

Anexo Observación 14

HERMOSILLO, SONORA, MAYO DE 2015

Bitácora Electrónica de Obra Pública

Organismo: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE SONORA

Área: DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
URBANA

Contrato: CEA-APAZU-IHU-OB-14-027 (14-027)

Obra: REHABILITACION DE COLECTOR AV P ENTRE CALLE 2 Y VIA
DE FERROCARRIL H EN LA LOCALIDAD DE CABORCA
MUNICIPIO DE CABORCA EN EL ESTADO DE SONORA

Lugar: CABORCA

No. de nota: 1

Tipo Nota: Apertura

Referencia:

Fecha: 2015-01-15 10:01:07.0

| Contratista | Dependencia |
|--|--|
| Nombre del Contratista: CONSTRUCTORA 54 S.A. DE C.V. | Nombre: DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA |
| Domicilio: GUADALUPE VICTORIA 106 | Centro de Trabajo: COMISION ESTATAL DEL AGUA |
| Teléfono: 2102383 | Domicilio: OCAMPO 49 |
| | Teléfono: 2895700 |

Datos particulares del contrato

| | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| Número del Contrato: CEA-APAZU-IHU-OB-14-027 | Proyecto: AL | |
| Partida Presupuestal: LO-926008990-N21-2014 | | |
| Objeto del contrato: REHABILITACION DE COLECTOR AV P ENTRE CALLE 2 Y VIA DE FERROCARRIL H EN LA LOCALIDAD DE CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA EN EL ESTADO DE SONORA | | |
| Plazo: 38 Días naturales. | Fecha de Inicio: 24/11/2014 | Fecha de Término: 31/12/2014 |
| Monto: 4,627,388.85 MN | | |
| Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos: CABORCA | | |
| Localización de la residencia de la obra: CABORCA | | |

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

| |
|--|
| Superintendente de construcción Nombre: SALAZAR HOLGUIN DAGOBERTO Profesión: INGENIERO Identificación oficial : 048063181896 Domicilio: ALDAMA 182 Teléfono: 3022498 Correo electrónico: CONSTRUCTORA54@HOTMAIL.COM |
| Residente Nombre: CHAVEZ TORRES MANUEL HIRAM Profesión: INGENIERO CIVIL Identificación oficial : 0532063393336 Domicilio: CENTENARIO OCAMPO No. ext.49 Teléfono: (662)2895700 Correo electrónico: hiram.chavez@ceasonora.gob.mx Ficha: 213 |
| No tiene ningún archivo adjunto |

Nota Creada por:

MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)

Firmada por:

MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)
DAGOBERTO SALAZAR HOLGUIN (DAGSAL) (CONTRATISTA)

No. de nota: 2

Tipo Nota: Validacion

Referencia:

Fecha: 2015-01-21 11:46:32.0

Horarios para Asentar Notas

Se podran asentar notas en el siguiente horario:
00:01 a 23:59 lunes, martes, miercoles, jueves,viernes, sabado, domingo
La bitácora se podra consultar las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas:3 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los número generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Semanal

Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al contrato, establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:
La contratista deberá solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto.

Nota Creada por: MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)
DAGOBERTO SALAZAR HOLGUIN (DAGBAL) (CONTRATISTA)

No. de nota: 3

Fecha: 2015-01-21
11:55:29.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

Por medio de esta nota se informa que los trabajos iniciaron el día 25 de diciembre del 2014. Se hace la apertura de la bitácora electrónica con esta fecha por no contar el contratista con la fiel correcta mente, se informa que se encuentra la obra con un avance de 35 por ciento el cien por ciento de la tubería de 24 así como los 12 pozos de visita y los brocales ya en obra.

No tiene ningún archivo adjunto.

Nota Creada por: MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)
Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 4

Fecha: 2015-01-21
12:03:02.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

EL OOMAPAS CABORCA POR MEDIO DE EL ING. EDGARDO BERNAL DIRECTOR DE PROYECTOS HICÓ LA PETICIÓN POR ESCRITO DE QUE SE BAJE LA PLANTILLA DE LA TUBERÍA DE 24 A INSTALAR PARA EN UN FUTURO PODER SEGUIR AMPLIANDO ESTA LÍNEA A LAS COLONIAS ALEDAÑAS, SEGÚN PERFIL QUE SACÓ EL MISMO DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE OOMAPAS CABORCA CON SU EQUIPO DE TOPÓGRAFOS, HACIÉNDOLES LA ACLARACIÓN QUE LA OBRA NO CUENTA CON MÁS RECURSOS Y QUE SE TENDRÁ QUE RECORTAR METAS PARA PODER HACER ESTE AJUSTE COMO LO ESTÁN SOLICITANDO.

No tiene ningún archivo adjunto.

Nota Creada por: MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES (MHCHATOR) (RESIDENTE)
Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, Inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.



REPORTE FOTOGRÁFICO Y DE SUPERVISIÓN

NOOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE COLECTOR AV. "P" ENTRE CALLE 2 Y VIA DE FERROCARIL "H" EN LA LOCALIDAD DE CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA, EN EL ESTADO DE SONORA.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA 54 S.A. DE C.V.

NUMERO DE CONTRATO: CEA-APAZU-IHU-OB-14-027
25/12/2015

CON ESTE DÍA SE DA INICIO A LA OBRA, EL DIRECTOR DE OOMAPAS CABORCA HACE LA PETICIÓN DE INSTALAR LA TUBERÍA MAS DEBAJO DE LO QUE INDICA EL PROYECTO POR LO QUE SE LE PIDE QUE NOS HAGA LA PETICIÓN POR ESCRITO PARA PODER HACER CAMBIO DE PROYECTO, SE TIENE EL 50 POR CIENTO DE LA TUBERÍA P.V.C. SANITARIO DE 24" EN EL ÁREA DE LOS TRABAJOS Y ESTÁ POR LLEGAR EL OTRO 50% EN UN DÍA MAS

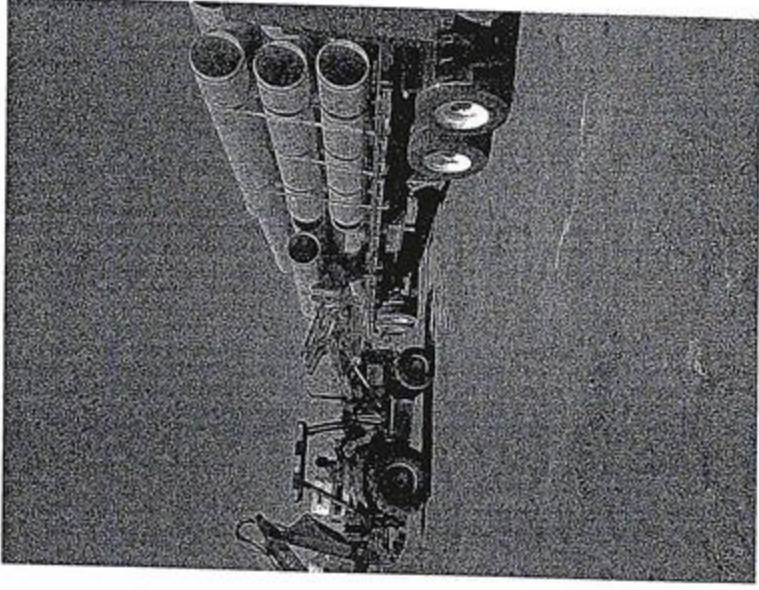
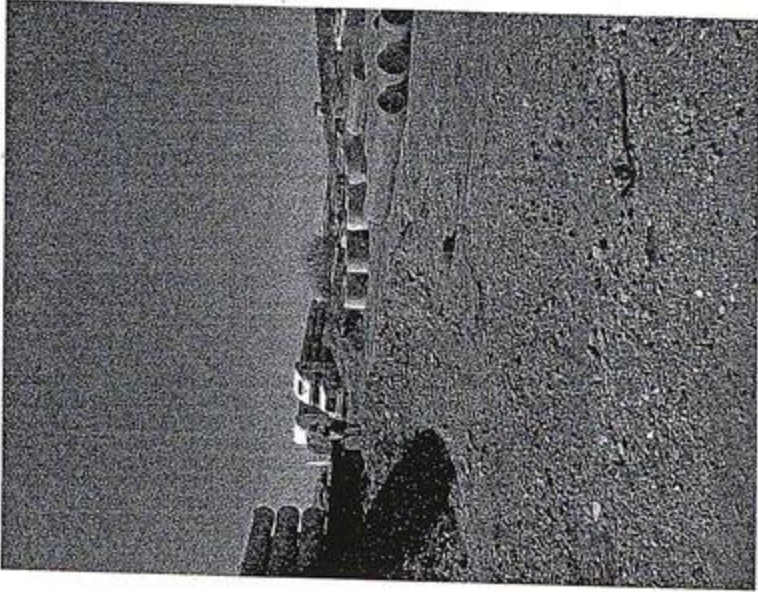


Ing. Manuel Hiram Chavez Torres

REPORTE FOTOGRÁFICO Y DE SUPERVISIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: REHEABILITACION DE COLECTOR AV. P^{ta} ENTRE CALLE Z Y VIA DE FERROCARRIL "H" EN LA LOCALIDAD DE GABORGA MUNICIPIO DE CABORCA, EN EL ESTADO DE SONORA.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA 54 S.A. DE C.V.
NUMERO DE CONTRATO: CEA-APAZU-IHU-OB-14-027
27/12/2015

SE INICIAN LAS EXCAVACIONES, SONDEO PARA VERIFICAR LAS PROFUNDIDADES Y CORTES CON DISCO EN LA CALLE P Y DOS HASTA CALLEJÓN KINO SE TRABAJARA PARALELO AL EXISTENTE, YA SE TIENE EL TOTAL DE LA TUBERÍA DE 24" PARA COLECTOR EN SITIO DE LA OBRA.

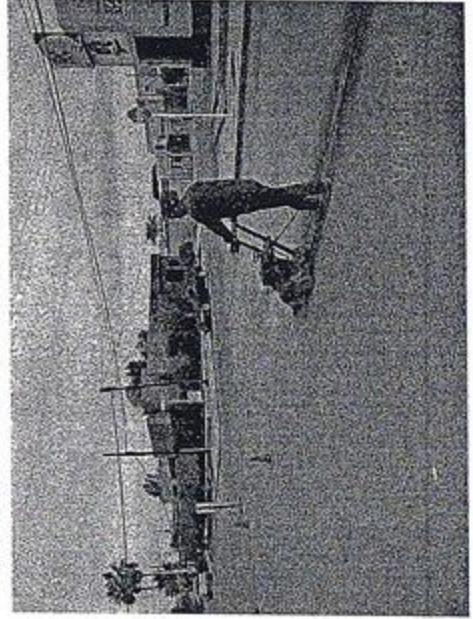
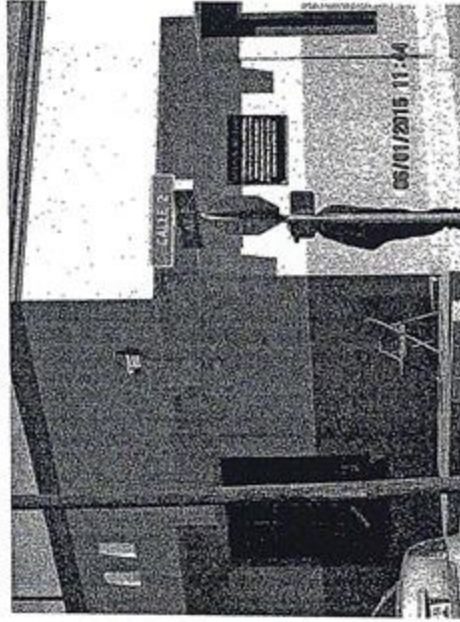


Ing. Manuel Hiram Chávez Torres

REPORTE FOTOGRÁFICO Y DE SUPERVISIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE COLECTOR AV. "P" ENTRE CALLE Z Y VIA DE FERROCARRIL "H" EN LA LOCALIDAD DE CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA, EN EL ESTADO DE SONORA.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA 54 S.A. DE C.V.
NUMERO DE CONTRATO: CEA-APAZU-IJU-OB-14-027
29/12/2015

A LA FECHA SE TIENEN INSTALADOS 1,129 ML DE TUBERÍA DE 24" Y 10 POZOS DE VISITA CON UN AVANCE DE 80%

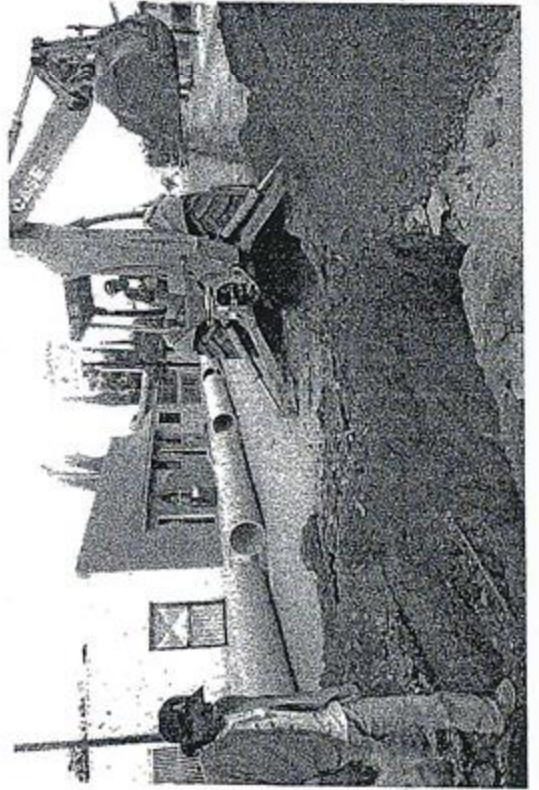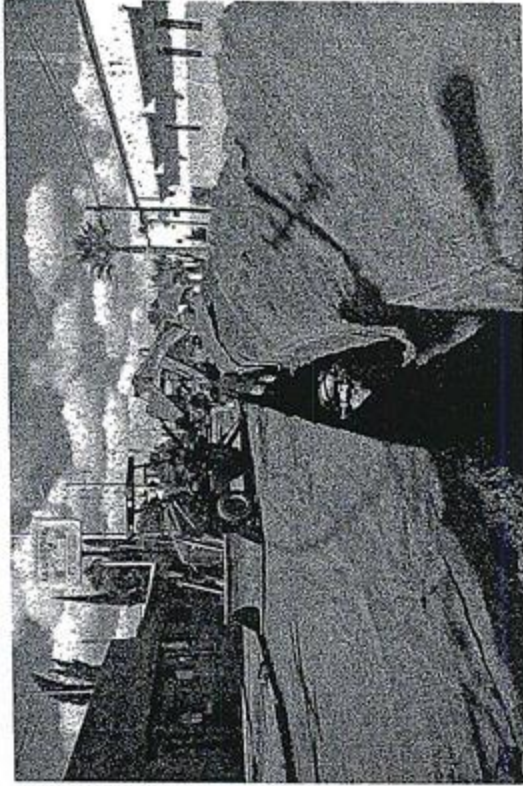

Ing. Manuel Hiram Chavez Torres



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ACTA DE ENTREGA
CEA-APAZU-IHU-OB-14-027



PROGRAMA APAZU

SUB-PROGRAMA Alcantarillado

Acta de entrega - recepción de: **REHABILITACIÓN DE COLECTOR AV. "P" ENTRE CALLE 2 Y VIA DEL FERROCARRIL "H" EN LA LOCALIDAD DE CABORCA EN EL ESTADO DE SONORA**

Fecha Acta: 16/02/15 Hora: 14:00
 Localidad: Caborca Municipio: Caborca
 Estado: Sonora

1. Servicio y tipo de obra realizada:

| Obra | Tipo de Obra | | | | |
|----------------|--------------|----------|----------------|--------------|------------|
| | Estudio | Proyecto | Rehabilitación | Construcción | Ampliación |
| Alcantarillado | | | x | | |

5. Nombre de la Dependencia Ejecutora: Comisión Estatal del Agua

6. Inversión:

| Ejercida | Total | Federal | Estatal | Municipio |
|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | 4,627,388.85 | 2,776,433.31 | 1,850,955.54 | 0.00 |

7. Descripción breve y clara de la obra realizada por tipo de servicio

Bienes: Alcantarillado

Descripción general de los bienes: se instalaron 1125 ml de tubería sanitaria de 24" y 11 pozos de visita así como el recarpeteo no se instalaron las descargas domiciliarias como pedía el proyecto por cambios del mismo por parte de Oomapas Caborca.

Se hace constar que la Comisión Estatal del Agua le hace entrega al H. Ayuntamiento de Caborca de la obra para su operación y mantenimiento en lo subsecuente, así como los planos correspondientes a la construcción final, las Normas y Especificaciones que fueron aplicadas durante se ejecución, los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

9. Nombre de las localidades y municipios que se beneficiaron con las obras:

Caborca, Municipio de Caborca, en el Estado de Sonora

10. Nombre de la dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra:

Federal () Estatal () Municipal (x)

H. Ayuntamiento de Caborca

11. Fecha de entrega-recepción de los bienes: 16/02/15

A *11*

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ACTA DE ENTREGA

CEA-APAZU-IHU-OB-14-027



PROGRAMA

APAZU

SUB-PROGRAMA

Alcantarillado


Acta de entrega -
recepción de:

REHABILITACIÓN DE COLECTOR AV. "P" ENTRE CALLE 2 Y VIA DEL FERROCARRIL "H"
EN LA LOCALIDAD DE CABORCA EN EL ESTADO DE SONORA

Entrega:

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

VOCAL EJECUTIVO DE LA CEA


C.LIC. RENÉ FRANCISCO LUNA SUGICH

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
URBANA


M.C. LUIS HERMAN VALENZUELA SALAS

Recibe:

DIRECTOR GENERAL OOMAPAS CABORCA


ING. HUMBERTO ENRIQUE CELAYA LÓPEZ

