

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-0998/2019, de fecha 17 de mayo del 2019, se me comisiona para que en compañía del ing. Jorge Rene Rodríguez Moreno efectúe la verificación física de las obras anexas a este oficio las obras están ubicadas en los municipios de, Álamos, Huatabampo y Navojoa, Sonora.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:


El día 20 de mayo del 2019, se realizó el traslado a la localidad de Masiaca municipio de Navojoa, para la inspección física y/o visita de laboratorio a la siguiente obra:

Nombre de la Obra: REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD MASIACA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.

N° de Contrato: SRSSA001735

Ejecutora: CECOP

No de Obra Asignada: 19-RCS-066



Al momento de la visita se encontró personal responsable de la ejecución de los trabajos que se estaban llevando a cabo. Se encontraron trabajos en proceso de relleno en muro en cuarto de medicina preventiva.



Rellenos en muros, donde se retiraron los aires acondicionados.

El día 22 de mayo del presente año, habiéndose concluido las actividades de verificación física de las obras, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora

Se anexa copia de oficio de comisión:

ATENTAMENTE


Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana

Nombre de la Obra: REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD AGIABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.


N° de Contrato: SRSSA002440

Ejecutora: CECOP


No de Obra Asignada: 19-RCS-035

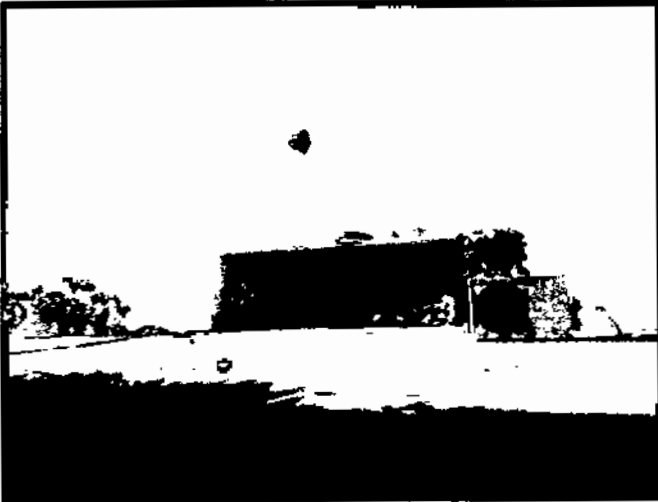


Al momento de la visita no se encontró personal responsable de la ejecución de los trabajos, sin embargo, se aprecia trabajos de Impermeabilización de losa de azotea y rampa de acceso.

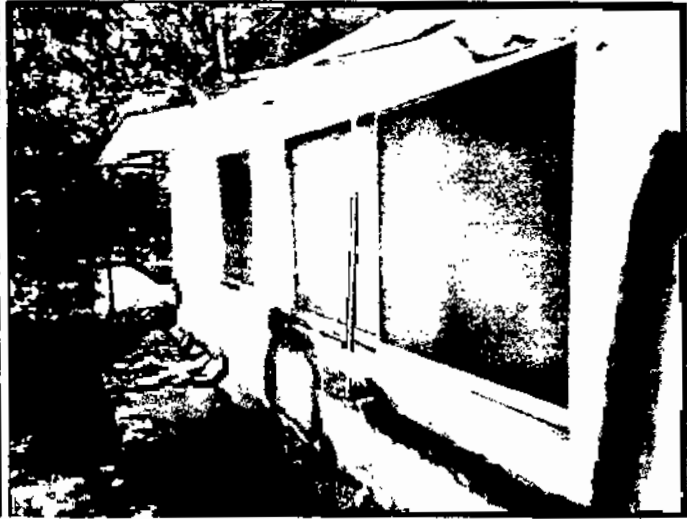


Retiro de cerco perimetral, y relleno y detallado en muro.




En estas tres fotografías se aprecia la ruta de evacuación de los residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI).




Baño para personas con capacidades distintas.




En la primera imagen se aprecia impermeabilización en losa de azotea y la instalación de compresores del sistema de refrigeración y en la segunda mini Split ya en función, los cuales se encontraron instalados 5 piezas, de 3 que se especificaba en el catálogo de conceptos.

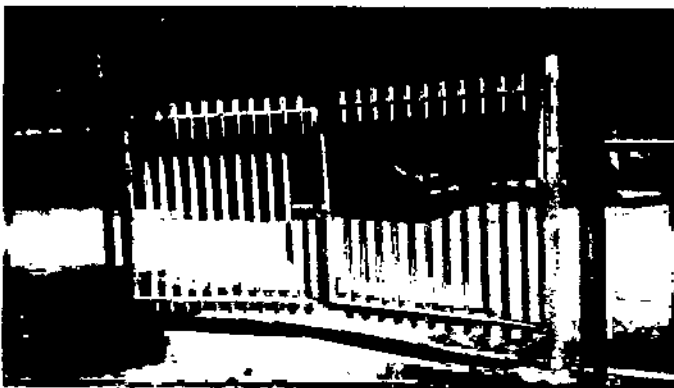

Portón de acceso a estacionamiento y cisterna (bomba y filtro de agua).





La luminaria tipo Led solo se encontró 13 piezas de 14 indicadas en catálogo, así como la luminaria en muro de la segunda fotografía se contabilizó 4 físicamente, de 6 especificadas en catálogo.





Cuarto del médico y fachada posterior de inmuebles.




Bastidor de puerta en baño en cuarto de medico se encuentra deteriorado.

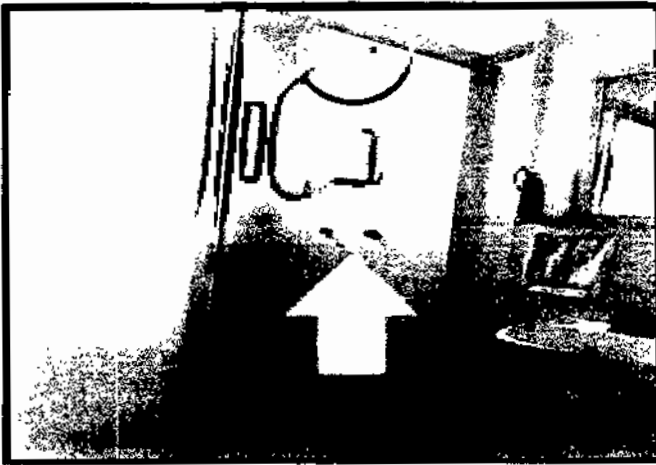

En ambas fotografías se aprecia la falta de regadera en baños de personal y cuarto del médico, así como la falta de maneral en regadera del baño de personal.

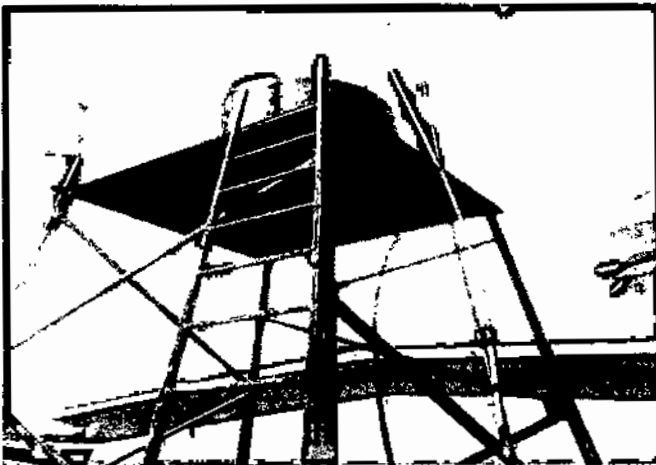

Según el personal que labora en el centro médico, comentaron que el sistema de control es deficiente, ya que el tinaco se vacía, en la segunda fotografía solo se pudo contabilizar 5 contactos dúplex, de 17 especificados en catálogo. La obra presenta pintura en exterior e interior, por lo que se desconoce si se va a seguir trabajando.



En la primera foto se aprecia orificios en muro debido a cartelones informativos que han pegado y en la segunda, situación que guarda cerco perimetral.

El día 22 de mayo del 2019, se realizó el traslado al municipio de Huatabampo, para la inspección física y/o visita de laboratorio a las siguientes obras:

Nombre de la Obra: REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.

N° de Contrato: SRSSA001513

Ejecutora: CECOP

No de Obra Asignada: 19-RCS-042





Fachada principal, donde se puede apreciar los trabajos que se realizaron tales como: colocación de cartel informativo, cerco perimetral, pintura en fachada, puerta y en herrería, rampa y pasamanos para personas con capacidades distintas.

Nombre de la Obra: REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.


N° de Contrato: SRSSA001390

Ejecutora: CECOP

No de Obra Asignada: 19-RCS-068

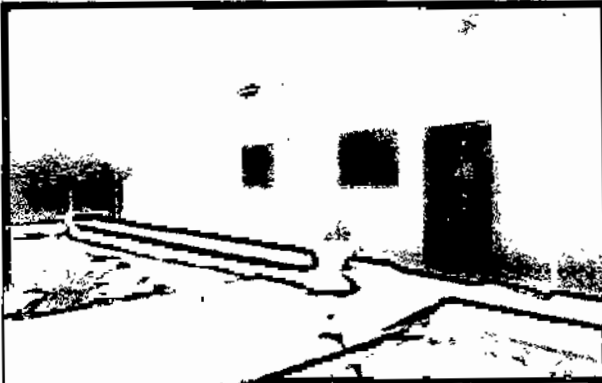

Fachada principal, en esta obra aún no se han iniciado las actividades, en la segunda fotografía se aprecia pintura desprendiéndose en techo y filtraciones de humedad.




En la primera foto se aprecia alero en techo dos aguas deteriorado y en la segunda desprendimiento de pintura en muro en área de cocina.

Nombre de la Obra: REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD MAQUIPO, MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA.


N° de Contrato: SRSSA000142

Ejecutora: CECOP


No de Obra Asignada: 19-RCS-048

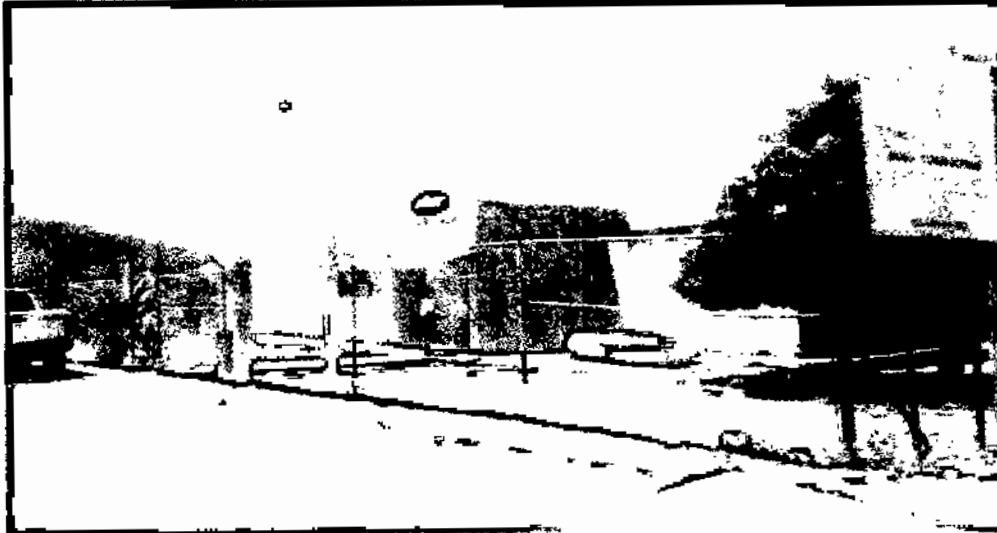

Fachada principal, en esta obra aún no se han iniciado las actividades.



Pintura desprendiéndose en muro y enjarre agrietado.



Situación que guarda baño y aplanado en muro agrietado.


El día 21 de mayo del 2019, se realizó el traslado a los municipios de Álamos y Huatabampo, para la inspección física y/o visita de laboratorio a las siguientes obras:

Nombre de la Obra: REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA.



N° de Contrato: SRSSA000236

Ejecutora: CECOP



No de Obra Asignada: 19-RCS-050



Fachada principal, en esta obra aún no se han iniciado las actividades, en la segunda fotografía se aprecia en costado norte pintura desprendida en muro.

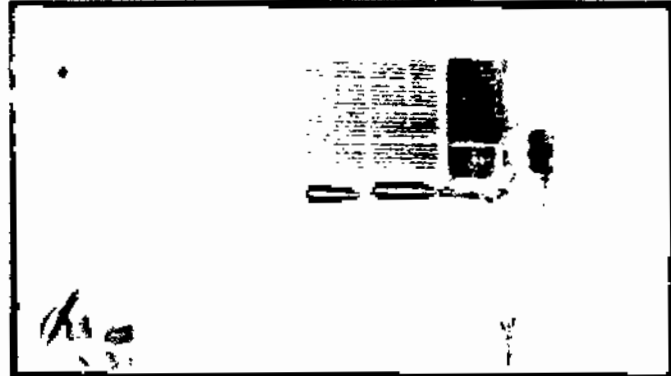


Lámpara y refrigeración que serán sustituidos, por una nueva y un mini Split

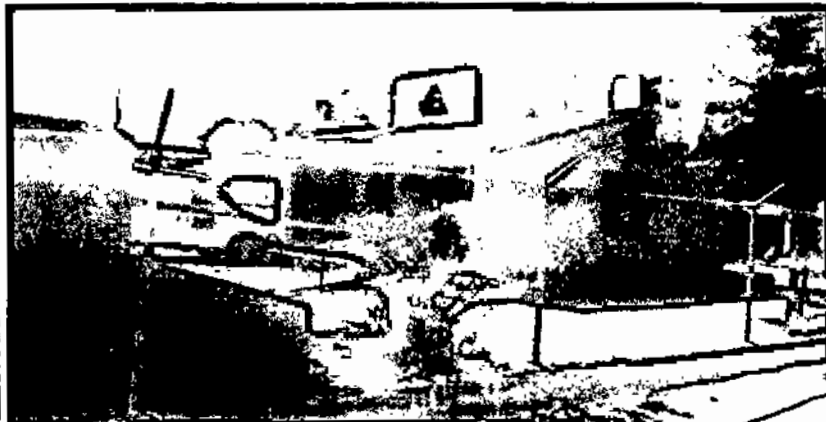

Se observa tinaco en la primera foto y en la segunda vista lateral del centro de salud.



colocación de ladrillo en área de baño y colocación de muebles sanitarios en baño del personal.



Deterioro en cadena y muro, además se observa trabajos de demolición de banquetta, en la segunda fotografía se aprecia detalle en muro (desprendimiento de pintura) en área de espera.
