



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio.- No. ECOP-DEC-1003/2019.

Hermosillo, Sonora, 21 de mayo del 2019
2019: Año del combate a la corrupción
"2019: Año de la megarregión Sonora-Arizona".

Asunto: Se le comisiona

C. Timoteo De Jesús Melquiades
Auditor Supervisor
Presente.

Con fundamento en el Artículo 18 Fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que en compañía del Ing. Ismael Soto Piri realice la verificación física de las obras anexas a este oficio, las obras están ubicadas en los municipios de Villa Pesqueira, San Pedro de la Cueva, Bacanora, Arivechi, Yecora y Rosario, Sonora.

Dicha comisión comprende del 27 al 29 de mayo del año en curso para lo cual dispondrá de 2 días viáticos y 1 día de gastos de camino con cargo a los Recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"



Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

C.c.p. Ing. Héctor González Tirado. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente.
Lic. Edgar Prendas Sandoval. Director de Recursos Financieros y Materiales. Presente.
Archivo
LMN/EIEA/GVB

Handwritten signature and initials



ANEXO AL OFICIO ECOP-DEC-1003/20019

NO DE OBRA ASIGNADA	CLUES	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
19-RCS-008	SRSSA002353	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI GRANDE	NACORI GRANDE	VILLA PESQUEIRA
19-RCS-012	SRSSA002131	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA
19-RCS-056	SRSSA000352	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BACANORA	BACANORA	BACANORA
19-RCS-055	SRSSA000270	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ARIVECHI	ARIVECHI	ARIVECHI
19-RCS-058	SRSSA000282	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TARACHI	TARACHI	ARIVECHI
19-RCS-047	SRSSA002370	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MAYCOBA	MAYCOBA	YECORA
19-RCS-029	SRSSA002015	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NURI	NURI	ROSARIO

3

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-1003/2019, de fecha 21 de Mayo del 2019, con motivo de la verificación física de las obras ubicadas en los municipios de Villa Pesqueira, San Pedro de la Cueva, Bacanora, Arivechi, Yecora, y Rosario, Sonora.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:


El día 27 de Mayo del 2019, se realizó el traslado y revisión de las obras ubicada en las localidades de Nácori Grande, municipio de Villa Pesqueira, San Pedro de la Cueva, municipio de San Pedro de la Cueva y Bacanora, municipio de Bacanora.

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI GRANDE.

N° de Contrato: SRSSA002353

Ejecutora: SECOP

No. De Obra Asignada: 19-RCS-008

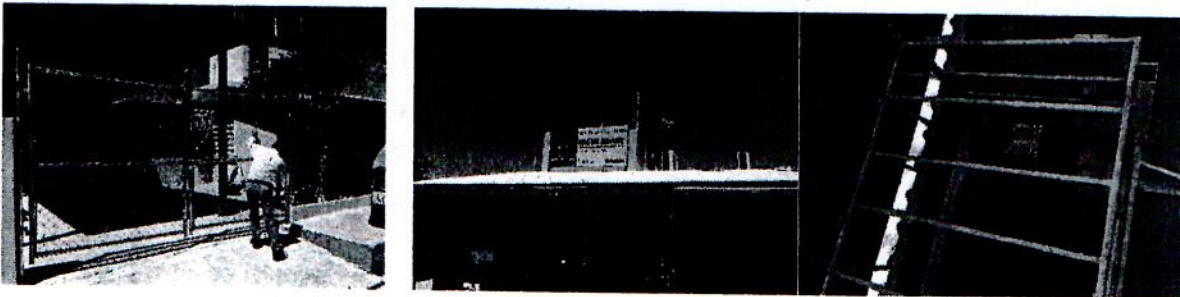

Al momento de la visita, no se encontró personal responsable de la ejecución de los trabajos que se estaban llevando acabo. La rehabilitación del centro de salud se encuentra con un avance aproximado del 95% faltando aun algunos conceptos por ejecutar.


Personal del Centro de Salud manifiesta que no se realizó el desmontaje de un aparato de aire acondicionado de ventana y la reparación del muro, concepto que no se entra contemplado dentro del Catálogo de Conceptos.

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LA CUEVA.

N° de Contrato: SRSSA002131

Ejecutora: CECOP

No. De Obra Asignada: 19-RCS-012

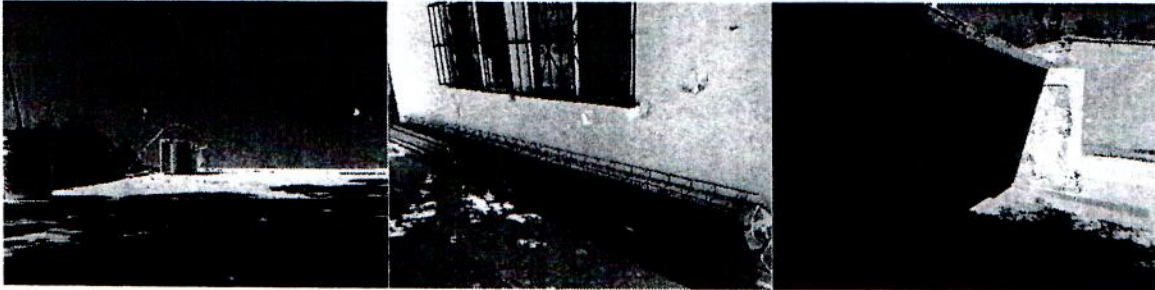

Al momento de la visita, no se encontró personal responsable de la ejecución de los trabajos de rehabilitación. La presidente municipal comentó que las actividades se suspendieron aproximadamente dos semanas atrás, con el objetivo de preparar la techumbre del tejaban.

Los trabajos de rehabilitación ejecutados son: construcción de la losa de concreto para la Caseta de Protección para los Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos, Rampa para personas con Capacidades Diferentes, Impermeabilización de Cubierta (losa de azotea) a base elastomérico Thermotec, construcción de pasillo, construcción de zapatas aisladas para tejaban, Desmontaje barandal de herrería.

Los trabajos de rehabilitación en interiores como lo son: baños, plafones, puertas, drenaje y pintura en general no se han iniciado.

Los trabajos se encuentran con un avance aproximado del 15%.

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BACANORA.

N° de Contrato: SRSSA000352

Ejecutora: CECOP

No. De Obra Asignada: 19-RCS-056



Al momento de la visita, los trabajos de rehabilitación aún no se habían iniciado.


El día 28 de Mayo del 2019, se realizó el traslado y revisión de las obras ubicada en las localidades de Arivechi y Tarachi ambos en el municipio de Arivechi y Maycoba, municipio de Yecora.

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ARIVECHI.

N° de Contrato: SRSSA000270

Ejecutora: CECOP

No. De Obra Asignada: 19-RCS-055

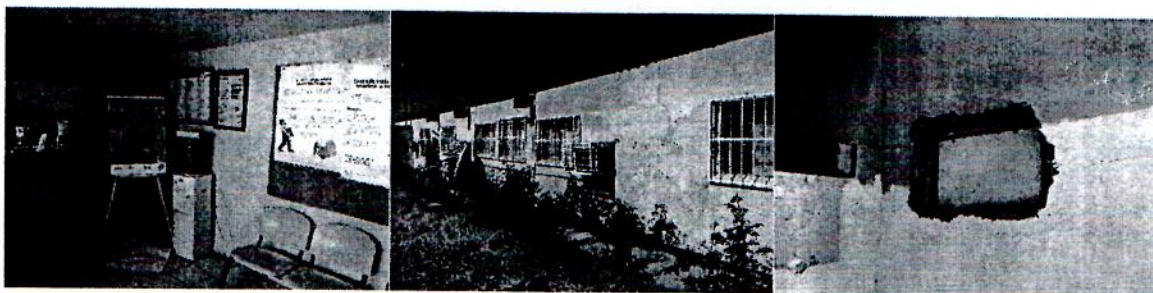

Al momento de la visita, los trabajos de rehabilitación aún no se habían iniciado.

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TARACHI.

N° de Contrato: SRSSA000282

Ejecutora: CECOP

No. De Obra Asignada: 19-RCS-058



Al momento de la visita, los trabajos de rehabilitación aún no se habían iniciado.


[Handwritten signature]

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MAYCOBA.

N° de Contrato: SRSSA002370

Ejecutora: CECOP

No. De Obra Asignada: 19-RCS-047

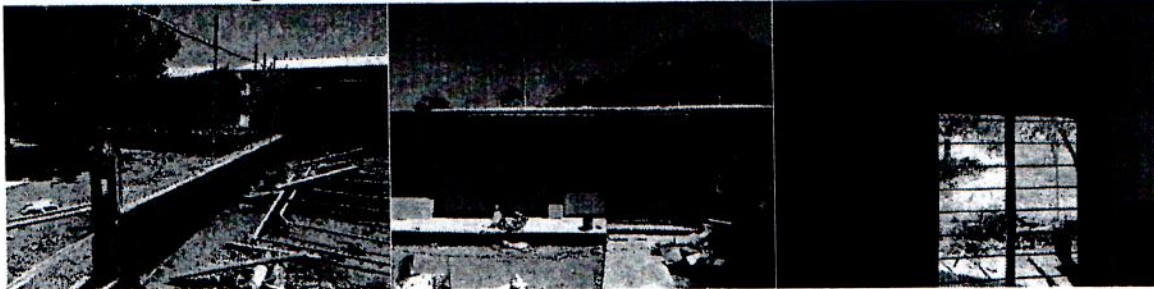

Al momento de la visita se estaba realizando los trabajos de rehabilitación de los siguientes conceptos: Construcción de cadena de remate inferior de cerco, construcción de puerta peatonal a base de malla ciclónica de 1.20X2.00 metros, puerta para vehículos a base de malla ciclónica de 1.20X2.00 metros

Los trabajos de rehabilitación ejecutados son: Cambios de luminarias, cambios de contactos y apagadores, Impermeabilización, cancelería y ventanas, cerco de malla ciclónica, muro de tabla roca, rehabilitación de lavabo, muebles sanitarios y accesorios para baños.

Los trabajos se encuentran con un avance aproximado del 75%.

El día 29 de Mayo del 2019, se realizó el traslado y revisión de las obras ubicada en las localidades de Nuri de Rosario.

Nombre de la Obra: HABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NURI.

N° de Contrato: SRSSA002213

Ejecutora: CECOP

No. De Obra Asignada: 19-RCS-029



Al momento de la visita, no se encontró personal responsable de la ejecución los trabajos de rehabilitación.

Los trabajos de rehabilitación ejecutados son: Rampas para personas con capacidades diferentes, impermeabilización de losa de azotea, protección para puertas a base de perfil P.T.R, protección para ventanas a base de cuadrado de 1/2", rehabilitación de cisterna, suministro e instalación de equipo hidroneumático, caseta de protección para residuos peligrosos biológicos infecciosos, accesorios para baños
Los trabajos se encuentran con un avance aproximado del 90%.

Habiéndose concluido las actividades de verificación física de obras, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Se anexa copia de oficio de comisión.

ATENTAMENTE



Timoteo De Jesús Melquiades
