



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública  
Oficio - No. ECOP-DC-0051/2020.  
Hermosillo, Sonora, 13 de enero del 2020

Asunto: Se le comisiona

Ing. David Molina Correa  
Auditor Encargado.  
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 18 fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que en compañía del Ing. Diego Alberto Vázquez Montijo realice la verificación física de las obras anexas a este oficio correspondientes al programa (PROAGUA), las obras están ubicadas en el municipio de Bacum, Sonora.

Dicha comisión comprende los días 20 y 21 de enero del año en curso para lo cual dispondrá de 1 día de viáticos y 1 día de gastos de camino con cargo a los Recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en un vehículo pick up Dodge con placas VB-71-396, recorriendo aproximadamente 350 kms de carretera pavimentada cruzando 4 casetas, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 20 de enero partir de las 8:00 horas, entregándolo al término de la comisión de acuerdo a las instrucciones giradas por esa unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente  
"Sufragio Efectivo. No Reelección."

Lic. Fernando Herrera Saldate  
El Director General

C.c.p. Ing. Héctor González Tirado. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente  
Lic. Edgar Prendas Sandoval. Director de Recursos Financieros y Materiales. Presente.  
Archivo.  
JSGS/LMN/GVB



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION  
Y CONTROL DE OBRA PUBLICA  
HERMOSILLO, SONORA



ANEXO AL OFICIO ECOP-DC-0051/2020

CONTRATO	EJECUTORA	LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	PROGRAMA	TIPO DE RECURSO
CEA-APAURAL-IHU-OB-19-051	CEA	BACUM	CONSTRUCCION (REPOSICION POR DAÑO DEL HURACAN NEWTON) DE TANQUE METALICO DE 100 M3 DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), MUNICIPIO DE BACUM, ESTADO DE SONORA.	RS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	\$3,065,222.20	PROAGUA	FEDERAL
CEA-APAURAL-IHU-OB-19-052	CEA	BACUM	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO METALICO DE 30 M3 DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA (CAMPO 104), MUNICIPIO DE BACUM ESTADO DE SONORA.	RS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	\$1,681,269.93	PROAGUA	FEDERAL



lmm

**Lic. Fernando Herrera Saldade**  
**Director General de Evaluación y Control de Obra Pública**  
**Secretaría de la Contraloría General**

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DC-0051/2020, de fecha 13 de enero de 2020, se me comisiona para que en compañía del Ing. Diego Alberto Vázquez Montijo, se efectúe la verificación física de las obras correspondiente al programa PROAGUA, ejercicio presupuestal 2019; las obras cuya ejecución es responsabilidad de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

**OBRA:** "Construcción de tanque elevado metálico de 30 m<sup>3</sup> de capacidad, en la Localidad de Ejido Independencia (Campo 104), Municipio de Bácum, Estado de Sonora"

**Ejecutora:** CEA.


**Contrato No.:** CEA-APAURAL-IHU-OB-19-052


**Contratista:** RS Infraestructura, S. A. de C. V.

**Monto de Contrato:** \$1,681,269.93

**Monto Ejercido:** \$624,499.84.

**Periodo de ejecución Contratado:** 07 de octubre al 25 de diciembre de 2019.

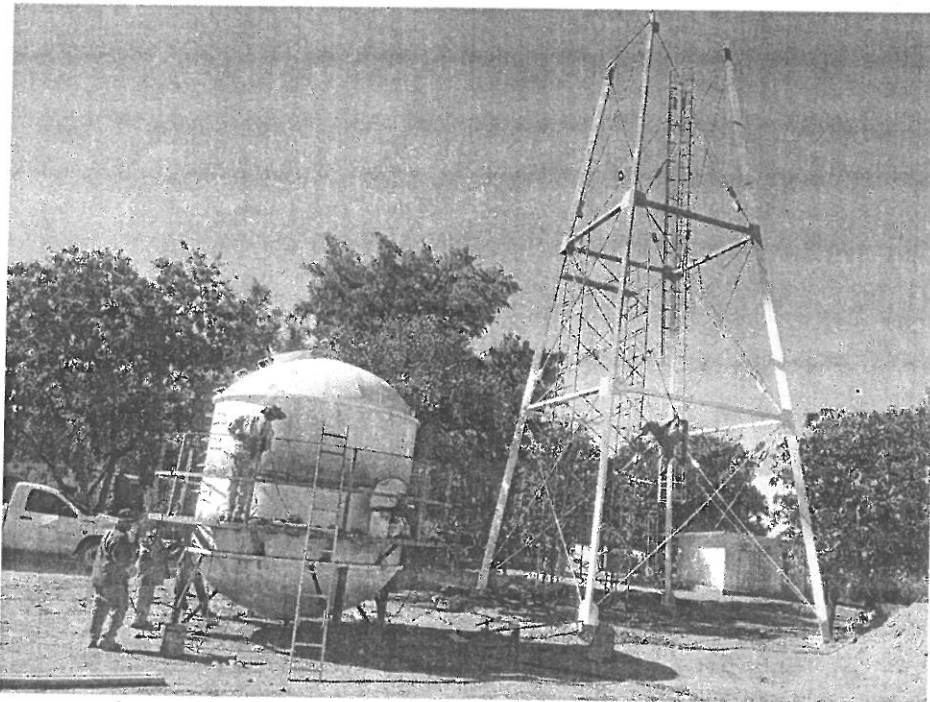

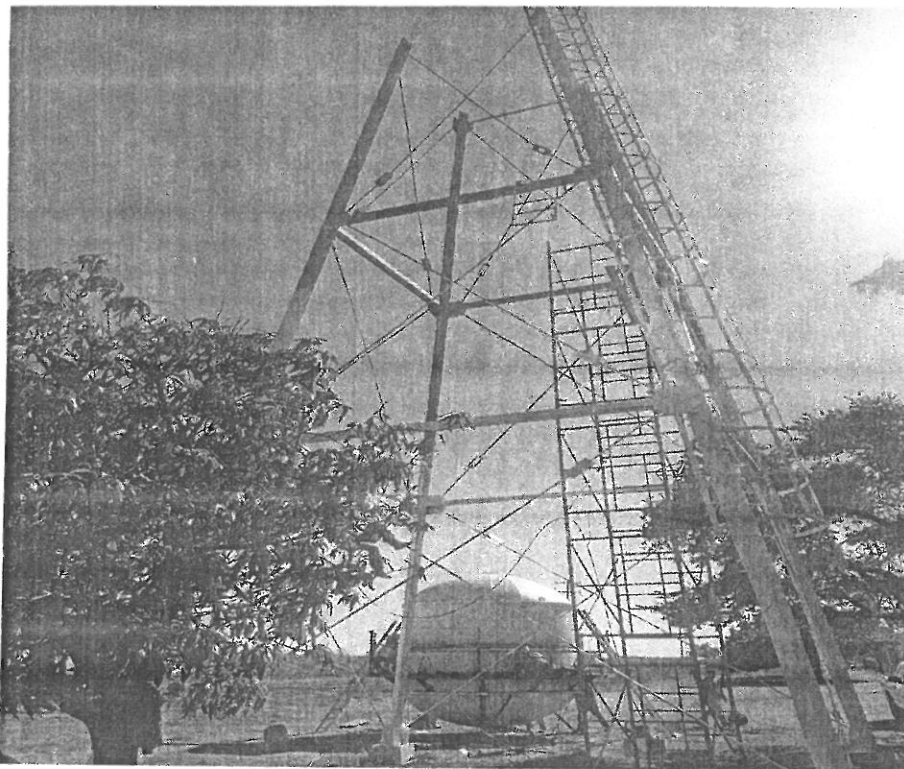

**OBRA:** "Construcción (reposición por daños del Huracán Newton) de tanque elevado metálico de 100 m<sup>3</sup> de capacidad, en la Localidad Primero de Mayo (Campo 77), Municipio de Bécum, Estado de Sonora"

**Ejecutora:** CEA.

**Contrato No.:** CEA-APAURAL-IHU-OB-19-051



**Contratista:** RS Infraestructura, S. A. de C. V.


**Monto de Contrato:** \$3,065,222.20

**Monto Ejercido:** Sin estimar a la fecha.

**Periodo de ejecución Contratado:** 07 de octubre al 25 de diciembre de 2019.



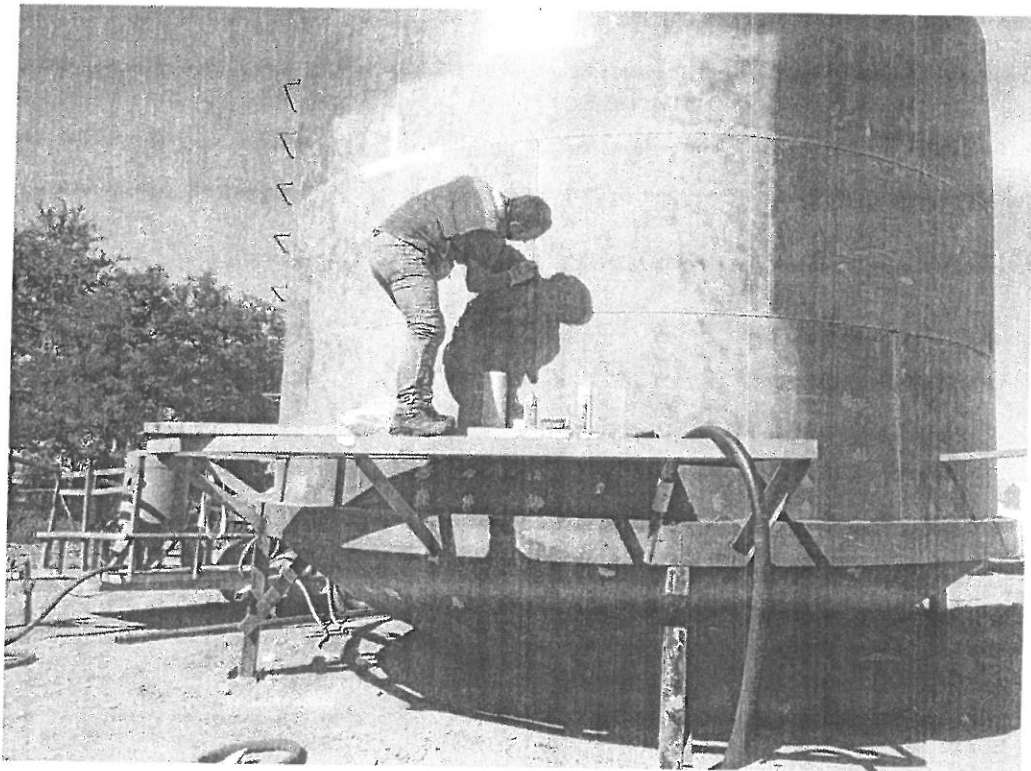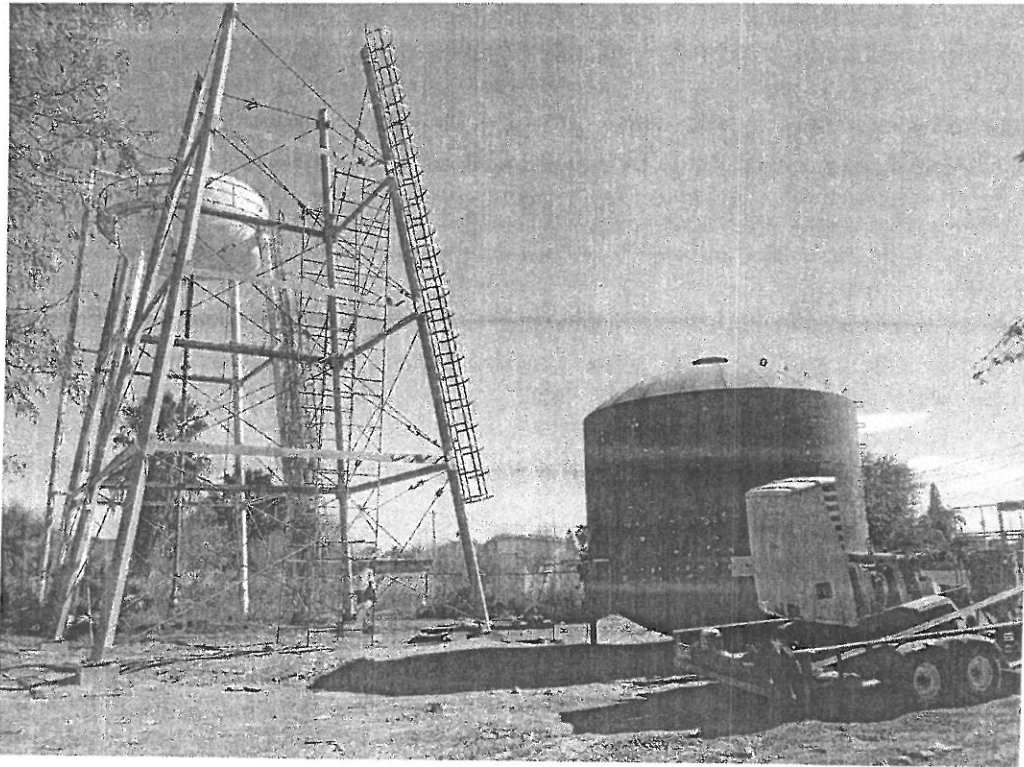

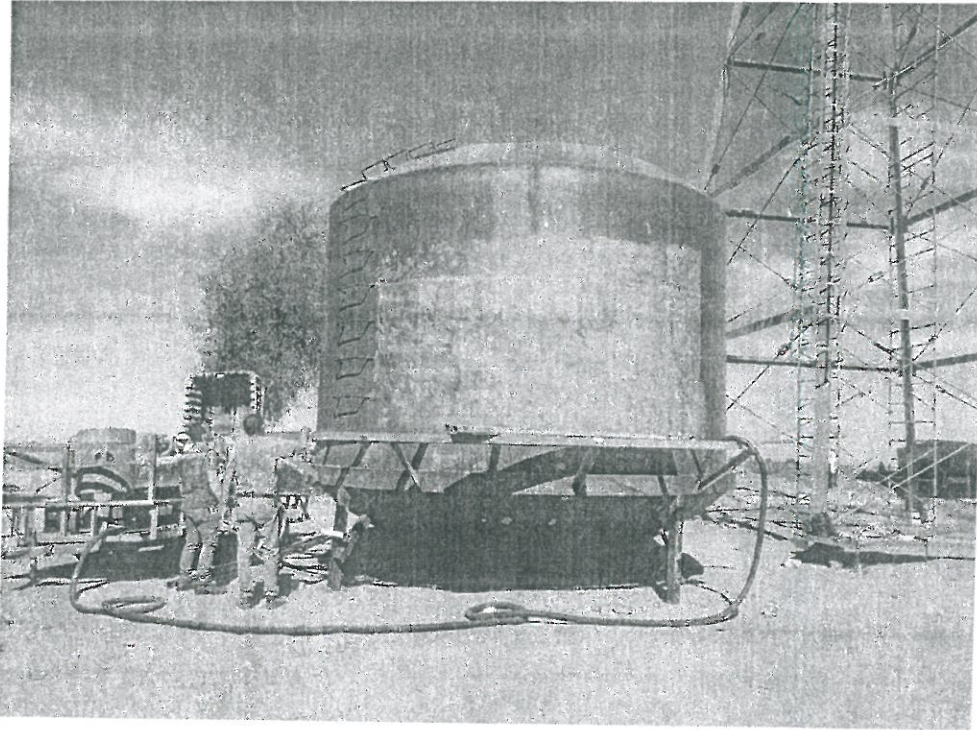

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 20 de enero del 2020, se realizó el traslado a la Ciudad de Bécum, Sonora, para la verificación física a las obras antes mencionadas.

El día 20 y 21 de enero de 2020 se realizó verificación física, inspección de líquido penetrante y visual a soldadura; el recorrido fue en compañía del Ing. Diego Alberto Vázquez Montijo.

Al término de la revisión se realizó el traslado a Hermosillo, Sonora.

**Conclusiones:**

La obra no está en funcionamiento, faltan conceptos por realizar para que este al 100% y funcione; (obra atrasada).

**Ing. David Molina Correa**  
**Auditor Supervisor**
