



No. DE OFICIO: CEA-092-2014

**HERMOSILLO, SONORA, A 05 DE MARZO DEL 2014.
"2014, Año de la Salud Masculina".**

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DE AVANCES PROGRAMA APAZU

**ING. LEOVIGILDO REYES FLORES
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y ALCANTARILLADO DEL ORGANISMO DE
CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA
P R E S E N T E.-**

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I.-01/13) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED DOS TANTOS EN ORIGINAL DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ENLISTA A CONTINUACIÓN:

- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.
- PRECIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL VOCAL EJECUTIVO.**


C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO

C.C.P. LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.
M.C. LUIS HERMAN VALENZUELA SALAS, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.
EXPEDIENTE.
EAMP/LHVS/CARMEN



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Ocampo No. 49 ENTRE JOSÉ MARÍA AVILA Y MICHEL | TELÉFONOS: +52 (662) 212-0449 Y 213-1005
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.ceasonora.gob.mx



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
2014 AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

RESUMEN DE AVANCE APAZU I.-01/13
INFORME DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: NOGALES

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2013/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL: 18,133,658

ESTATAL: 18,200,520

MUNICIPAL y/o OTRO: 0

TOTAL: 36,334,179


(montos sin indirectos)

IMPORTE CONTRATADO: 36,334,179 100%

IMPORTE TOTAL FISICO: 34,517,470 95%

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: 13,815,537 38%

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

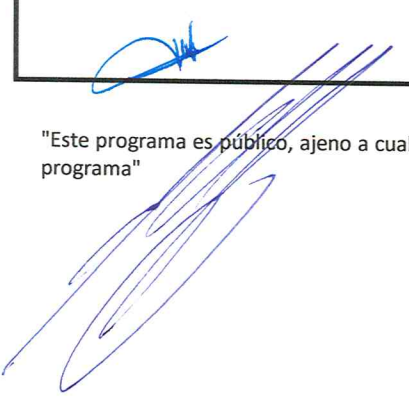

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (I-01/13)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
 (PESOS)

ESTADO DE: SONORA

ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL Ó MODIFICATORIO)

DE FECHA: 23 DE AGOSTO DEL 2013

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO


ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado					Ejercido al año anterior		Radicado		Inversión					Avance Físico (%)	Metas por Indicador									
			Clave INEGI	Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Avance	Suma	Federal		Estatal	Mpio.	O.Op.	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	Observaciones			
30	CEA	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA FV PARA ALIMENTACIÓN DE PTAR LOS ALISOS	26 043 0001	NOGALES	NOGALES	IT	2013	SANEAMIENTO	31-dic-13	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	0	0	17,100,043	0	Autorizado	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	95%	HAB. MEJ.	220,292	0						
Licitado	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0																													
Contratado	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0																													
Físico	34,517,470	17,226,975	17,290,494	0	0																													
Financiero	13,815,537	13,815,537	0	0	0																													

SITUACIÓN DE LA OBRA
 IT Inicio y Terminación
 IC Inicio y Continuación
 CC Continuación, Continuación
 CT Continuación y Terminación


GRAN TOTAL	OBRA	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	0	0	17,100,043	0	TOTAL AUTORIZADO	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	
	Ind. Ejec	1,017,357	507,742	509,615	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL LICITADO	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0
	Ind. Nom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL CONTRATADO	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0
	TOTAL	37,351,536	18,641,401	18,710,135	0	0	0	0	17,100,043	0	TOTAL FISICO	34,517,470	17,226,975	17,290,494	0	0	
											TOTAL FINANCIERO	13,815,537	13,815,537	0	0	0	

NOTA: A LA FECHA AÚN NO SE HAN RADICADO EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, FALTANDO POR RADICAR LA CANTIDAD DE \$19'234,135.62, DE LOS CUALES CORRESPONDEN 1'033,615.14 REC. FEDERAL Y 18'200,520.48 A REC. ESTATAL

ELABORÓ:
 EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.O.J.H.U. DE LA C.E.A.

 ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS

REVISÓ
 EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

 ING. GILBERTO CELAYA REINA

Vo.Bo.
 EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 ING. LEOVIGILDO REYES FLORES

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (I.-01/13)
DETALLE DE PAGOS
(PESOS)

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Diciembre del 2013

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Incluye IVA)					PAGOS					PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatad	Mpio.	O.Op.	No. de Factura	Anticipo; Estimaciones; Indirectos	Fecha (Póliza de Pago)	IMPORTE DE FACTURA C/IVA	MONTO ACUMULADO EJERCIDO	DEL	AL	
30	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA FV PARA ALIMENTACIÓN DE PTAR LOS ALISOS	NOGALES	NOGALES	CEA-NC-IHU-OB-12-048	SOLARSCAPE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	294	Estimación 6	21-nov-13	2,709,917	13,815,537	16-jun-13	30-jun-13	
											295	Estimación 8	21-nov-13	7,680,266		31-jul-13	29-ago-13	
											296	Estimación 4	02-dic-13	30,375		16-abr-13	15-may-13	
											297	Estimación 5	02-dic-13	1,029,406		16-may-13	14-jun-13	
											298	Estimación 7	02-dic-13	690,217		01-jul-13	30-jul-13	
											299	Estimación 9	02-dic-13	1,311,562		30-ago-13	28-sep-13	
											302	Estimación 10	18-dic-13	363,794		29-sep-13	29-oct-13	
TOTAL CONTRATADO:						36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	TOTAL EJERCIDO:					13,815,537	13,815,537	

ELABORÓ:
EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE LA D.G.I.H.U. DE LA C.E.A.

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS

REVISÓ
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
URBANA DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

ING. GILBERTO CELAYA REINA

Vo.Bo.
EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA COMISIÓN
NACIONAL DEL AGUA

ING. LEOVIGILDO REYES FLORES
