

**ING. LEOVIGILDO REYES FLORES
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y ALCANTARILLADO DEL ORGANISMO DE
CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA
P R E S E N T E.-**

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I.-01/13) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED DOS TANTOS EN ORIGINAL DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ENLISTA A CONTINUACIÓN:

- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.
- PRECIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL VOCAL EJECUTIVO**



C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO

C.C.P. LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C. E. A.
M.C. LUIS HERMAN VALENZUELA SALAS, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C. E. A.
EXPEDIENTE.
EAMP/LHVS/CARMEN



RESUMEN DE AVANCE APAZU I.-01/13
INFORME DEL MES DE FEBRERO DEL 2014

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: NOGALES

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2013/Corese/resum avance Corese


IMPORTE ASIGNADO:

<i>FEDERAL:</i>	<u>18,133,658</u>
<i>ESTATAL:</i>	<u>18,200,520</u>
<i>MUNICIPAL y/o OTRO:</i>	<u>0</u>
TOTAL:	<u>36,334,179</u>

(montos sin indirectos)

IMPORTE CONTRATADO:	<u>36,334,179</u>	<u>100%</u>
IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>34,517,470</u>	<u>95%</u>
IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>17,100,043</u>	<u>47%</u>

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

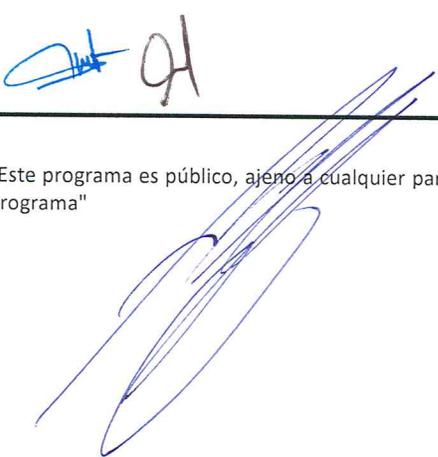

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (I.-01/13)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
(PESOS)

ESTADO DE: SONORA
ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL Ó MODIFICATORIO) DE FECHA: 23 DE AGOSTO DEL 2013
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado					Ejercido al año anterior		Radicado		Inversión					Avance Físico (%)	Metas por Indicador				
			Clave INEGI	Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Federal	Estatal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpio.		O.Op.	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	Observaciones
30	CEA	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA FV PARA ALIMENTACIÓN DE PTAR LOS ALISOS	26 043 0001	NOGALES	NOGALES	IT	2013	SANEAMIENTO	28-feb-14	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	0	0	17,100,043	0	Autorizado	36,334,179	18,133,658	18,200,520			95%	HAB. MEJ.	220,292	0	
																		Licitado	36,334,179	18,133,658	18,200,520								
																			Contratado	36,334,179	18,133,658	18,200,520							
																			Físico	34,517,470	17,226,975	17,290,494							
																			Financiero	17,100,043	17,100,043	0							

SITUACIÓN DE LA OBRA

IT Inicio y Terminación
IC Inicio y Continuación
CC Continuación, Continuación
CT Continuación y Terminación

GRAN TOTAL	OBRA	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	0	0	17,100,043	0	TOTAL AUTORIZADO	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0		
	Ind. Ejec.	1,017,357	507,742	509,615	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL LICITADO	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	
Ind. Norm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL CONTRATADO	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	100%	
TOTAL	37,351,536	18,641,401	18,710,135	0	0	0	0	17,100,043	0		TOTAL FISICO	34,517,470	17,226,975	17,290,494	0	0	95%	
											TOTAL FINANCIERO	17,100,043	17,100,043	0	0	0	47%	

NOTA: A LA FECHA AÚN NO SE HAN RADICADO EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, FALTANDO POR RADICAR LA CANTIDAD DE \$19'234,135.62, DE LOS CUALES CORRESPONDEN 1'033,615.14 REC. FEDERAL Y 18'200,520.48 A REC. ESTATAL

ELABORÓ:
EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE LA D.G.H.U. DE LA C.E.A.

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS

REVISÓ
EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

M.C. LUIS HERMAN VALENZUELA SALAS

Vo.Bo.
EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE
LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. LEOVIGILDO REYES FLORES

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (I.-01/13)
DETALLE DE PAGOS
 (PESOS)

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Período del Reporte: Del 01 al 28 de Febrero del 2014

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Incluye IVA)					PAGOS					PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	No. de Factura	Anticipo; Estimaciones; Indirectos	Fecha (Póliza de Pago)	IMPORTE DE FACTURA C/IVA	MONTO ACUMULADO EJERCIDO	DEL	AL	
30	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA FV PARA ALIMENTACIÓN DE PTAR LOS ALISOS	NOGALES	NOGALES	CEA-NC-IHU-OB-12-048	SOLARSCAPE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	294	Estimación 6	21-nov-13	2,709,917	17,100,043	16-jun-13	30-jun-13	
											295	Estimación 8	21-nov-13	7,680,266		31-jul-13	29-ago-13	
											296	Estimación 4	02-dic-13	30,375		16-abr-13	15-may-13	
											297	Estimación 5	02-dic-13	1,029,406		16-may-13	14-jun-13	
											298	Estimación 7	02-dic-13	690,217		01-jul-13	30-jul-13	
											299	Estimación 9	02-dic-13	1,311,562		30-ago-13	28-sep-13	
											302	Estimación 10	18-dic-13	363,794		29-sep-13	29-oct-13	
											326	Estimación 11	28-ene-14	1,130,445		30-oct-13	06-dic-13	
											340	Estimación 12	13-feb-14	645,171		07-dic-13	14-dic-13	
											342	Estimación 13	26-feb-14	1,508,890		15-dic-13	22-dic-13	
TOTAL CONTRATADO:						36,334,179	18,133,658	18,200,520	0	0	TOTAL EJERCIDO:					17,100,043	17,100,043	

ELABORÓ:
EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE LA D.G.I.H.U. DE LA C.E.A.

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS

REVISÓ
EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

M.C. LUIS HERMAN VALENZUELA SALAS

Vo.Bo.
EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA COMISIÓN
NACIONAL DEL AGUA

ING. LEOVIGILDO REYES FLORES
