

RESUMEN DE AVANCE APAZU I.-03/12

INFORME DEL MES DE JUNIO DEL 2012

C: resum avance Corose

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2012/Corose/resum avance Coroso

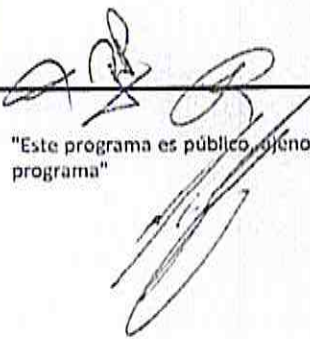
IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL:	<u>24,087,386</u>
ESTATAL:	<u>22,030,076</u>
MUNICIPAL y/o OTRO:	<u>0</u>
TOTAL:	<u>46,117,462</u>

IMPORTE CONTRATADO:	<u>20,768,915</u>	<u>45%</u>
---------------------	-------------------	------------

IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>2,222,526</u>	<u>11%</u>
-----------------------	------------------	------------

IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>439,843</u>	<u>2%</u>
-------------------------	----------------	-----------


"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZUJ-3310)
EFORTE DE FINANCIAMIENTO FISCAL FEDERAL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DATOS DE BAJA CALIFORNIA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

DE FECHA: 24 DE JUNIO DEL 2012

Nº Orden	Descripción de obras	Categoría	Lugar	Municipio	Localidad	Servicio	Fecha de entrega	Costo en Miles de Pesos				Módulos por instalarse	Módulos instalados															
								Trabajo	Equipo	Material	Instalación																	
1	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	DE AGUA POTABLE	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE	2012	1,000.000	300.000	400.000	1,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	DE AGUA POTABLE	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE	2012	200.000	60.000	80.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	DE AGUA POTABLE	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE	2012	200.000	60.000	80.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	DE AGUA POTABLE	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE	2012	100.000	30.000	40.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	DE AGUA POTABLE	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE	2012	100.000	30.000	40.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	DE AGUA POTABLE	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE	2012	100.000	30.000	40.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	DE AGUA POTABLE	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE	2012	100.000	30.000	40.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	DE AGUA POTABLE	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE	2012	100.000	30.000	40.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	DE AGUA POTABLE	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE	2012	100.000	30.000	40.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
 DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, EFICIENTE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZUJL-0371)
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

PERIODO DE EJECUCIÓN: DE FEBRERO DE 2012 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2012
 DE FOLIO: 10 DE 10

Nº de Proyecto	Descripción de la obra	CANTIDAD	UNIDAD	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje de Avance	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Avance Físico				Avance Financiero				Total de Inversión
									Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	
1	CONSTRUCCIÓN DE 21 UNIDADES DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE SAN VICENTE	21	UNIDADES	481.00	10.083	100%	1/12/12	1/12/12	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083
2	CONSTRUCCIÓN DE 21 UNIDADES DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE SAN VICENTE	21	UNIDADES	481.00	10.083	100%	1/12/12	1/12/12	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083
3	CONSTRUCCIÓN DE 21 UNIDADES DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE SAN VICENTE	21	UNIDADES	481.00	10.083	100%	1/12/12	1/12/12	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083
4	CONSTRUCCIÓN DE 21 UNIDADES DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE SAN VICENTE	21	UNIDADES	481.00	10.083	100%	1/12/12	1/12/12	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083
5	CONSTRUCCIÓN DE 21 UNIDADES DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE SAN VICENTE	21	UNIDADES	481.00	10.083	100%	1/12/12	1/12/12	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083
6	CONSTRUCCIÓN DE 21 UNIDADES DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE SAN VICENTE	21	UNIDADES	481.00	10.083	100%	1/12/12	1/12/12	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083
7	CONSTRUCCIÓN DE 21 UNIDADES DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE SAN VICENTE	21	UNIDADES	481.00	10.083	100%	1/12/12	1/12/12	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083
8	CONSTRUCCIÓN DE 21 UNIDADES DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE SAN VICENTE	21	UNIDADES	481.00	10.083	100%	1/12/12	1/12/12	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083
9	CONSTRUCCIÓN DE 21 UNIDADES DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE SAN VICENTE	21	UNIDADES	481.00	10.083	100%	1/12/12	1/12/12	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083
10	CONSTRUCCIÓN DE 21 UNIDADES DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE SAN VICENTE	21	UNIDADES	481.00	10.083	100%	1/12/12	1/12/12	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083
11	CONSTRUCCIÓN DE 21 UNIDADES DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE SAN VICENTE	21	UNIDADES	481.00	10.083	100%	1/12/12	1/12/12	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083
12	CONSTRUCCIÓN DE 21 UNIDADES DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE SAN VICENTE	21	UNIDADES	481.00	10.083	100%	1/12/12	1/12/12	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083
13	CONSTRUCCIÓN DE 21 UNIDADES DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE SAN VICENTE	21	UNIDADES	481.00	10.083	100%	1/12/12	1/12/12	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083
14	CONSTRUCCIÓN DE 21 UNIDADES DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE SAN VICENTE	21	UNIDADES	481.00	10.083	100%	1/12/12	1/12/12	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083
15	CONSTRUCCIÓN DE 21 UNIDADES DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE SAN VICENTE	21	UNIDADES	481.00	10.083	100%	1/12/12	1/12/12	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083
16	CONSTRUCCIÓN DE 21 UNIDADES DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE SAN VICENTE	21	UNIDADES	481.00	10.083	100%	1/12/12	1/12/12	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083
17	CONSTRUCCIÓN DE 21 UNIDADES DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE SAN VICENTE	21	UNIDADES	481.00	10.083	100%	1/12/12	1/12/12	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083
18	CONSTRUCCIÓN DE 21 UNIDADES DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE SAN VICENTE	21	UNIDADES	481.00	10.083	100%	1/12/12	1/12/12	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083
19	CONSTRUCCIÓN DE 21 UNIDADES DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE SAN VICENTE	21	UNIDADES	481.00	10.083	100%	1/12/12	1/12/12	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083
20	CONSTRUCCIÓN DE 21 UNIDADES DE SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE SAN VICENTE	21	UNIDADES	481.00	10.083	100%	1/12/12	1/12/12	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083	100%	10.083

[Handwritten signature]



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZU 1.4311)
REPORTE DE AVANCE FUBDO FINANCIERO

01/11/2012

ESTADO DE BONGRA
 MUNICIPIO DE BONGRA
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 ENTIDAD FINANCIERA COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

DE FECHA: 30 DE MARZO DEL 2012

Nº	Descripción de la obra	Código de obra	Localidad	Municipio	Localidad	Tipo de obra	Categoría	Fecha de inicio	Fecha de término	Costo de la obra (B. Colones)			Avance			Porcentaje			Criterio de avance		
										Total	Facturado	Ejecutado	Total	Facturado	Ejecutado	%	%	%			
1	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201101	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
2	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201102	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
3	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201103	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201104	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
5	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201105	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
6	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201106	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
7	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201107	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
8	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201108	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
9	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201109	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
10	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201110	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
11	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201111	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
12	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201112	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
13	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201113	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
14	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201114	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
15	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201115	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
16	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201116	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
17	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201117	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
18	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201118	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
19	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201119	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
20	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201120	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
21	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201121	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
22	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201122	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
23	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201123	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
24	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201124	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
25	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201125	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
26	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201126	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
27	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201127	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
28	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201128	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
29	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201129	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
30	CONSTRUCCIÓN DE UNO (1) DE COLECTOR DE FANGOS EN COL. DE SAN VICENTE	201130	GAMBA	GAMBA	OTRO	OTRO	AGUA POTABLE	01/01/11	01/01/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SENDEREACIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I-0312)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

ESTADO DE SONORA
 AGENCIA DE REGISTRO, PROGRAMACIÓN Y CONTROL
 DE FISCALÍA - 31 DE MAYO DEL 2012
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SABASEM12)
 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA DE AGUA

Código	Nombre de la obra	Lugar	Municipio	Municipio	Urbano	Rural	Superficie	Volumen	Avance físico		Avance financiero		Observaciones	Monto por pagar	Monto por cobrar	Monto por cancelar	
									%	Monto	%	Monto					
01	CONSTRUCCIÓN DE LA REJILLA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN	SAN AGUSTÍN	SONORA	SONORA	URBANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN	SAN AGUSTÍN	SONORA	SONORA	URBANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN	SAN AGUSTÍN	SONORA	SONORA	URBANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN	SAN AGUSTÍN	SONORA	SONORA	URBANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONCEPTO	MONTO
TOTAL	41,117,462
TOTAL PAGADO	24,500,306
TOTAL POR PAGAR	16,617,156

CONCEPTO	MONTO	PERCENTAJE
TOTAL	41,117,462	100%
TOTAL PAGADO	24,500,306	59.6%
TOTAL POR PAGAR	16,617,156	40.4%

NOTA: SE ANEXA EN LA COLUMNA DE EJECUCIÓN FISCAL EL REPORTE POR LINEAS DE MONEDAS QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA SU PAGO EN LA ESTEA ENTIDAD EJECUTORA.

EL DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OBRA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA POR LA CUA ORDENA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE FISCALÍA

EL DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

EL DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU1-4114)
 DETALLE DE PAGOS

ESTADO ESCUOLA: COMISIÓN GENERAL DEL AGUA

(PAGOS)

Período de Reporte: Del 01 al 30 de Junio del 2012

N°	Descripción de la obra	Localidades		N° de Contrato	Nombre del Contratista	MANTO CONTRATADO (incluye IVA)			PAGOS				PERIODO DE EJECUCIÓN (Emitidos)		Observaciones		
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Vista	O.C.	No. de Factura	Antes Emisionem. Facturas	Fecha (Fecha de Pago)	Importe Factura		Monto Acumulado Pagado	DEL
1	DE DRENAJE DEL SISTEMA COMERCIAL DE AGUAS CALIENTE EN LA ZONA INDUSTRIAL Y ELECTRONICA DE CANAHEA Y DE LA ZONA DE MANUFACTURAS DE MUCIOLA SAN CARLOS	GUAYAS	CANAHEA														
2	SANEAMIENTO E INSTALACION DE 1 MACETONEROS EN CANAHEA	GUAYAS	CANAHEA														
3	SANEAMIENTO E INSTALACION DE 1 MACETONEROS EN ENFALME (CONTINUACION)	GUAYAS	ENFALME	CEAHC-NUAP-11-08	RAFAEL DELLA GRANADOS	27,546	459,726	111,136									
4	SANEAMIENTO E INSTALACION DE 1 MACETONEROS EN GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS														
5	SISTEMA INTEGRAL DE COMUNITACION OPERATIVA PARA EL SANEAMIENTO DE LAS ZONAS DE MANUFACTURAS EN ENFALME (FASE 2B-2)	GUAYAS	ENFALME														
6	RECONSTRUCCION DE SECTORES HIDROMETROS EN LA ZONA INDUSTRIAL Y ELECTRONICA DE ENFALME (CONTINUACION)	GUAYAS	GUAYAS	CEAHC-NUAP-11-07	SEGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,103,822	2,753,328	2,753,328									
7	RECONSTRUCCION DE SECTORES HIDROMETROS EN LA ZONA INDUSTRIAL Y ELECTRONICA DE ENFALME (CONTINUACION)	GUAYAS	GUAYAS	CEAHC-NUAP-11-08	FRONTEROSA SANTA CECILIA S.A. DE C.V.	3,963,576	1,993,137	1,993,137									

[Handwritten signature]



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU-4174)

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

PERIODO

Período de Ejecución Del 01 al 30 de Junio del 2012

N°	Descripción de la obra	Localidad		Rz. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Dobles D.N)			PAGOS					PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones		
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mysa.	D.Cp.	Nº. de Facturas	Acepto. Ejecución. Inspección	Fecha (Fecha de Pago)	Presup. de PAGO (Miles de Pisos)	VOTO APORTADO EJECUCION		DEL	AL
1	RECONSTRUCCIÓN DE SECTORES METEOROLÓGICOS TERRESTRES EN LA SECCIÓN 18 Y 19 CONTRUCCION	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-NC-RJ-AP-11-132	MANUEL LOZARUELA GARCIA	4,411,400	2,205,700	2,205,700	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR SERRA CONTRUCCION	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-NC-RJ-AP-11-113	RAFAEL MILA GRANADOS	241,900	151,100	90,800	0	0	0	0	0	0	0	0	12-05-11	24-05-11
11	REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL BELLA VISTA CONTRUCCION	EMPALE	EMPALE	CEA-NC-RJ-AP-11-123	RAFAEL MILA GRANADOS	23,900	17,200	6,700	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	REPOSICION DE LINEA DE COLECCION DE N° DE DIAMETRO ADECUADO RED 185 M.L DE TURBIA DE ACERO Y 170 M.V.M DE HONDA Y EXPANSION DE PREFABRICADA	CANANGA	CANANGA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE CONTRUCCION	EMPALE	EMPALE	CEA-NC-RJ-AP-11-145	RAFAEL MILA GRANADOS	149,400	96,700	52,700	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	RECONSTRUCCION DE RED DE CAGUANO MUESTRO Y MUESTRO (CONTRUCCION)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-NC-RJ-AP-11-114	QUEVEDO DESARROLLO E INGENIERIA, S.A. DE C.V	2,571,600	1,696,140	875,460	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y CARGAMOS DE REOMEDIO CO. BELLA VISTA SUR CONTRUCCION	EMPALE	EMPALE	CEA-NC-RJ-AP-11-120	RAFAEL MILA GRANADOS	132,400	79,400	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0		

10/06/12



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZUL-0317)

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN EJECUTIVA DEL AGUA

FEEDBACK

Periodo del Reporte: Del 01 al 30 de Junio del 2012

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Proyecto y/o)					P.A.G.O.S				FECHA DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones		
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpco.	O.Pp.	Int. de Futuro	Acción Especiales/Proyectos	Fecha (Fórmula de Pago)	Importe de Factura con IVA	Monto Pagado Federo	DEL		AL	
14	RECONSTRUCCIÓN DE PUZOS EN LA ZONA DE OPTACION EN LAS ASAS (CONTRATACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS	GEA-NC-HUAP-11-02	PROYECTOS NUYAR, S.A. DE C.V.	1,744,307	887,153	857,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE F.T. SECUNDO EN COLISES MAYO, CONTRATACIÓN	GUAYMAS	GUAYMAS	GEA-NC-HUAP-11-02	GRUPO CONSTRUCTORES OCCENAC, S.A. DE C.V.	251,862	125,931	125,931	0	0	0	0	0	0	0	21,332	25,502	27-06-11	27-05-11
18	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE F.T. SECUNDO EN COLISES MAYO, SEBRANCA ETAPP, CONTRATACIÓN	GUAYMAS	GUAYMAS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	RECONSTRUCCIÓN DE REBOSADERO PRINCIPAL DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE F.T. SECUNDO EN COLISES MAYO, SEBRANCA ETAPP, CONTRATACIÓN)	GUAYMAS	SAN CARLOS	GEA-NC-HUAP-11-01	CONSTRUCCIONES VALDES, S.A. DE C.V.	1,132,374	873,329	259,045	0	0	0	0	0	0	0	207,639	257,529	28-05-11	28-05-11
20	RECONSTRUCCIÓN DE REBOSADERO PRINCIPAL DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE F.T. SECUNDO EN COLISES MAYO, SEBRANCA ETAPP, CONTRATACIÓN)	GUAYMAS	SAN CARLOS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (SECTOR 11, REGIMEN ETAPA TERMINACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (AFAZUJ 2012)
DETALLE DE PAGOS

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Junio del 2012

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Pesos M.N)				PAGOS				PERÍODO DE EJECUCIÓN (Ejecución)		Observaciones			
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mun.	D.O.P	No. de Facturas	Anterior Emisión/ Fecha de Factura	Fecha (Fecha de Pago)	Importe Facturado	No. de Acreditación Ejecución		DEL	AL	
22	IMPUESTOS DE ESTERILIZACIÓN DE CLORURO DE SODIO EN REGIÓN DE FRANJA CONTIGUA	GUAYAS	GUAYAS	CEM-2011-000-11-130	HYM RECURSOS DE S.A. DE C.V.	208,262	121,137	120,121	0	0	4,159	Factura 1 45,275	31-05-11	45,275	25-05-11	25-05-11			
23	REPARACIÓN DE PUENTE EN PUENTE DE AGUA EN REGIÓN DE FRANJA CONTIGUA EN PARAJE RESERVA EN PARAJE RESERVA	GUAYAS	GUAYAS			0	0	0	0	0	4,100	Factura 2 58,815	05-06-11	58,815	30-05-11	30-05-11			
24	CONSTRUCCIÓN DE LA SINGLA EN PARAJE RESERVA EN REGIÓN DE FRANJA CONTIGUA EN PARAJE RESERVA	PUEBLO RUISEÑOR	PUEBLO RUISEÑOR			0	0	0	0	0									
						TOTAL	227,818	121,137	120,121	0	0								
						TOTAL CONTRATADO	227,818	121,137	120,121	0	0								

TOTAL EJERCIDO: 433,810 433,810

EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.G.I.A.U. DE LA C.E.A.
MIGUEL GALLEROS MARTÍNEZ NEBLAS

EL DIRECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO URBANO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
DR. RAFAEL VALDEZ PORTILLO

REVISÓ
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA URBANA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ING. JOSÉ ROBERTO NUÑEZ ACEVEDO

V. LEZ.
EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ING. EDUARDO RIVERA GONZÁLEZ

Este programa es público. Queda prohibida su explotación económica o su programación.
