





Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.  
Oficio No. EOP-DV-0848/2021  
Hermosillo, Sonora, 01 junio del 2021.  
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

Asunto: Se le comisiona

**Ing. Eric Daniel García Ríos.**  
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a las Cláusulas Primera, Segunda, Tercera y Sexta del contrato de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios suscrito entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para en compañía del Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana, realicen la verificación física de la obra Pavimentación con Concreto Hidráulico de 15 centímetros de espesor en el Bulevar Mariano Abasolo entre calle Sin Nombre y La Casona en la Localidad y Municipio de Mazatán, Sonora, correspondiente al programa Financiamiento Para Infraestructura 2020, la obra se encuentra ubicada en el municipio de Mazatán, Sonora.

Dicha comisión comprende el día 02 de junio del año en curso para lo cual dispondrá de 1 día de gastos de camino con cargo a los Recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**Atentamente**  
"Sufragio Efectivo. No Reelección."

**Lic. Fernando Herrera Saldate**  
**El Director General**

C.c.p. Ing. Héctor González Tirado, Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente.  
Archivo  
RGFL/MNI/GVB





Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General

**SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS  
(GASTOS A COMPROBAR)**

FECHA: 01 de junio del 2021		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E501O02133A1 375021 2111EM13	
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de la Contraloría General			
UNIDAD RESPONSABLE: 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública			
UNIDAD EJECUTORA: 1304E501O02133A1 FISCAL_CTRL_EVAL_GEST.P.			
NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES COMISIONADO: Ing. Eric Daniel García Ríos.			
PUESTO FUNCIONAL: Honorarios.			
DESTINO: Mazatan, Sonora.			
MOTIVO: Se le comisiona para en compañía del Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana, realicen la verificación física de la obra Pavimentación con Concreto Hidráulico de 15 centímetros de espesor en el Bulevar Mariano Abasolo entre calle Sin Nombre y La Casona en la Localidad y Municipio de Mazatán, Sonora, correspondiente al programa Financiamiento Para Infraestructura 2020, la obra se encuentra ubicada en el municipio de Mazatán, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DV-0848/2021			
PERIODO DE LA COMISIÓN: 02 de junio del 2021			
POR INSTRUCCIONES DE: Lic. Fernando Herrera Saldate, Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.			
NÚMERO DE DÍAS	COSTO POR DÍA	TOTAL POR DÍA	
GASTOS DE CAMINO: 1 día	\$ 300.00	\$ 300.00	
SUMA TOTAL:		\$ 300.00	
OBSERVACIONES: Con cargo a los recursos del 2 al millar estatal.			
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$ 300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N)			
PERSONAL COMISIONADO	SOLICITA - RECIBE	AUTORIZA	
 ING. Eric Daniel Garcia Rios RFC GARE980204LE5	ING. HECTOR GONZALEZ TIRADO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	LIC. FERNANDO HERRERA SALDATE DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.	

8



# BBVA

## COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Cuenta de origen

•83626

Importe

\$ -300.00

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Motivo de pago

BNET 0101598031 DEVOLUCION BIATICO

Fecha de operación

7 junio 2021, 11:09:00 h

Fecha de aplicación

6 junio 2021. 22:00:00 h

Lic. Fernando Herrera Saldate  
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública  
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-0848/2021, de fecha 01 de junio del 2021, se me comisiona para que, en compañía del Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana, efectúe la verificación física de la obra anexa a este oficio, Pavimentación con concreto Hidráulico de 15 centímetros de espesor en el Bulevar Mariano Abasolo entre calle Sin Nombre y La Casona, la obra se encuentra en el municipio de Mazatán, Sonora

**El día 02 de junio del 2021, se realizó el traslado a la localidad y municipio de Mazatán, realizándose verificación de la siguiente obra:**


**OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN EL BULEVAR MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LA CASONA".**

**EJECUTORA: SIDUR**

**PROGRAMA DE INVERSIÓN: "FINANCIAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA 2020"**

**CONTRATO No.: SIDUR-ED-21-014**

AVANCE QUE PRESENTA LOS TRABAJOS AL MOMENTO DE LA VISITA AL MUNICIPIO DE MAZATAN

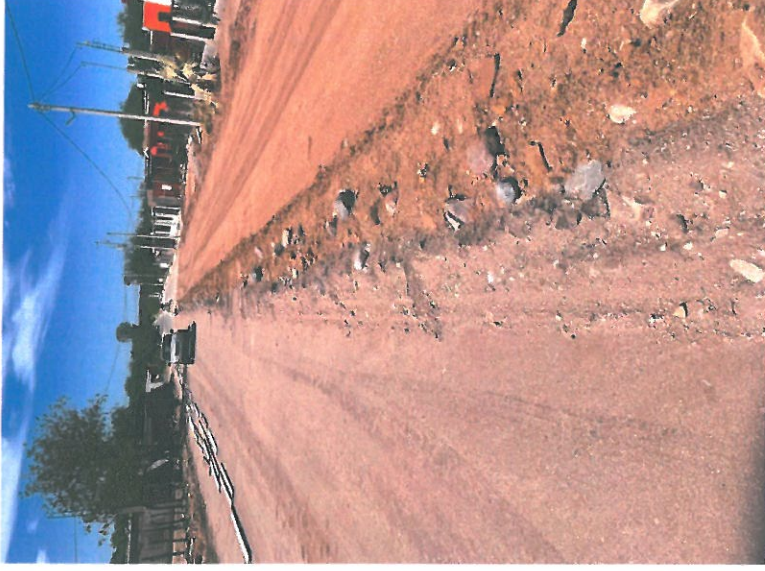

VISTA PANORAMICA DE LA OBRA EN LA VIALIDAD DE BULEVAR MARIANO ABASOLO  
SE OBSERVA QUE EL CUERPO POINIENTE ES TERRAPLEN Y EL LADO ORIENTE BASE  
HIDRAULICA



REALIZACIÓN DE TOMA DE MUESTRA DE CAPA DE BASE HIDRAULICA PARA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEL MATERIAL



TOMA DE CALAS EN CAPA DE BASE HIDRAULICA (IZQUIERDA) Y TERRAPLEN (DERECHA) PARA DETERMIANACIÓN DE GRADO DE COMPACTACIÓN





CORROBORACIÓN DE QUE LA BALANZA ESTUVIESE BIEN TARADA PARA EL PESAJE DEL CONO Y ARENA, COMO TAMBIÉN DE LA OBTENCIÓN DE MUESTRA DE GALAS



PREPARACIÓN DE CIMBRA PARA EL COLADO DE BANQUETAS Y SUS RESPECTIVAS GUARNICIONES

El día 02 de junio del presente año, habiéndose concluido las actividades de verificación física de las obras, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora

Se anexa copia de oficio de comisión:

**ATENTAMENTE**



**Ing. Eric Daniel García Ríos.**
