



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio.- No. ECOP-DEC-0631/2019.

Asunto: Se comisiona

Hermosillo, Sonora, 15 de abril del 2019

2019: Año del combate a la corrupción"

"2019: Año de la Megarregión Sonora-Arizona".

Ing. Jorge Rene Rodríguez Moreno
Auditor Encargado

Presente.

Con fundamento en el Artículo 18 Fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que en compañía del Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana, efectúe la verificación física de las obras anexas a este oficio correspondientes a los programas Crédito de Infraestructura, Recursos Propios y FIES2018, las obras están ubicadas en el municipio de Cajeme, Sonora.

Dicha comisión comprende del 23 al 25 de abril del año en curso, para lo cual dispondrá de 2 días de viáticos y 1 día de gastos de camino con cargos a la partida del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el camión Hino con número de placas VB-71-406, recorriendo 1,000 kms de carretera pavimentada, cruzando 4 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 23 de abril a partir de las 8:00 horas, entregándolo al término de la comisión de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Lic. Fernando Herrera Saldate
El Director General



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
HERMOSILLO, SONORA

C.c.p. Ing. Héctor González Tirado. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G.
Lic. Edgar Prendas Sandoval. Director de Recursos Financieros y Materiales.
Archivo.
EIEA/CLR/GVB



ANEXO AL OFICIO ECOP-DEC-0631/2019

Personal de Confianza SUR 2

NOMBRE DE LA OBRA	CLAVE DE VERIFICACION	LOCALIDAD	MUNICIPIO	PROGRAMA DE INVERSION	EJECUTORA	CONTRATISTA	CONTRATO	Monto del contrato mas iva	TIPO DEL RECURSO
CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS VIALES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA ZONA URBANA DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA	785-DV-SIDUR-ED-17-2018	CD OBREGON	CAJEME	CRED INFRAESTRUCTURA	SIDUR	GRUPO MILHER MB, S.A. DE C.V.	SIDUR-ED-17-248	\$39,900,210.01	ESTATAL
REMEDIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES (CUM) EN CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, PARA AMPLIAR ESPACIOS PARA OFICINAS GUBERNAMENTALES	1021-DV-SIDUR-ED-18-2019	CD OBREGON	CAJEME	RECURSOS ESTATALES (PROPIOS)	SIDUR	CORPORATIVO DE SERVICIOS & PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	SIDUR-ED-18-266	\$6,709,965.41	ESTATAL
(19-RS-0012) RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS, DIRECCION, AULA PARA USAER, AULA DE MEDIOS-BIBLIOTECA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DOS AULAS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS M. CALLEJA, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA	1033-DV-ISIE-ED-19-2019	CD OBREGON	CAJEME	RECURSOS PROPIOS	ISIE	SASAEM CONSTRUCCION Y SERVICIOS MULTIPLES, S.A. DE C.V	ISIE-ED-19-001	\$15,667,540.16	ESTATAL
REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN CALLE MICHOACÁN Y BLVD. C.T.M. EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA	1040-DV-SIDUR-PF-19-2019	CD OBREGON	CAJEME	FIES 2018	SIDUR	CW METAL, S.A. DE C.V.	SIDUR-PF-19-003	\$16,894,423.26	FEDERAL
(19-RS-0017) RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION DUPLEX, DOCE AULAS, BIBLIOTECA, AULA DE MEDIOS, PREFECTURA, OBRA EXTERIOR Y ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO, EN SECUNDARIA JOSE RAFAEL CAMPOY, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA	1041-DV-ISIE-ED-19-2019	CD OBREGON	CAJEME	RECURSOS PROPIOS	ISIE	EDIFICACIONES BOZA, S.A. DE C.V.	ISIE-ED-19-006	\$21,911,099.78	ESTATAL
(19-RS-0015) RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE DIRECCION, CONSTRUCCION DE EDIFICIO U-1C, CONSISTE EN UNA AULA, AULA DE MEDIOS-BIBLIOTECA, USAER Y DIRECCION Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA RECURSOS HIDRAULICOS, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA	1043-DV-ISIE-ED-19-2019	CD OBREGON	CAJEME	RECURSOS PROPIOS	ISIE	MINERA Y GANADERA TRES HERMANOS LCO, S. P. R. DE R. L.	ISIE-ED-19-008	\$5,151,315.24	ESTATAL
(19-RS-0019) RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO U-2C, CONSISTE EN: OCHO AULAS, AULA DE MEDIOS-BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA	1046-DV-ISIE-ED-19-2019	CD OBREGON	CAJEME	RECURSOS PROPIOS	ISIE	DESARROLLADORA Y URBANIZADORA IMNEX, S.A. DE C.V.	ISIE-ED-19-011	\$8,033,212.22	ESTATAL

4

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-0631/2019, de fecha 15 de abril del 2019, con motivo de la verificación física de las obras anexas al oficio correspondientes a los programas Crédito de Infraestructura, Recursos Propios y FIES2018, ubicadas en el municipio de Cajeme.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 23 de abril del 2019, se realizó el traslado y revisión de las obras ubicadas en el municipio de Cajeme:

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE MICHOACÁN Y BLVD. C.T.M. EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA


Nº de Contrato: SIDUR-PF-19-003

Ejecutora: Secretaria de Infraestructura de Desarrollo Urbano (SIDUR)

Programa: FIES 2018

Ejercicio Fiscal: 2018

Monto Contratado: \$ 16 894,423.26

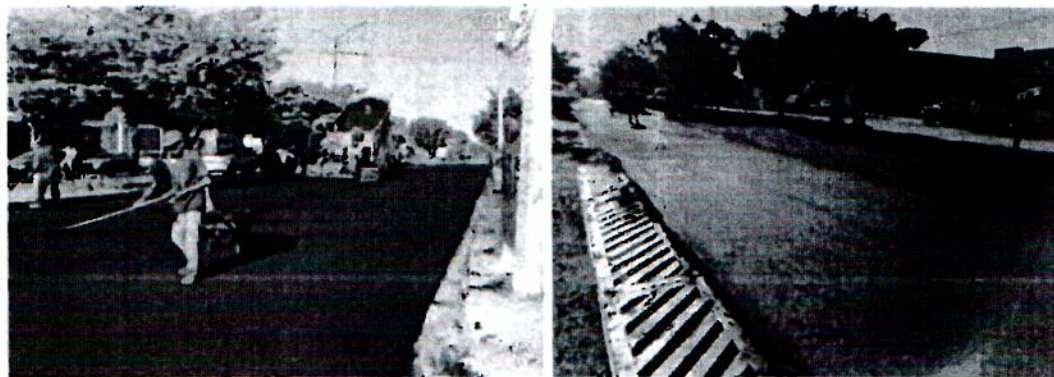

Redacción de hallazgo:

Durante la visita de encontraron trabajos de pavimentación de carpeta asfáltica del Blvd. C.T.M. entre Antonio Ochoa y Calle Tucán, se procedió a toma de muestra, así como elaboración de pastillas Marshall en el sitio de la aplicación.

Nombre de la Obra: RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS, DIRECCION, AULA PARA USAER, AULA DE MEDIOS-BIBLIOTECA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DOS AULAS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS M. CALLEJA, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA


N° de Contrato: ISIE-ED-19-001

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Programa: RECURSOS PROPIOS

Ejercicio Fiscal: 2019

Monto Contratado: \$ 15 667,540.16

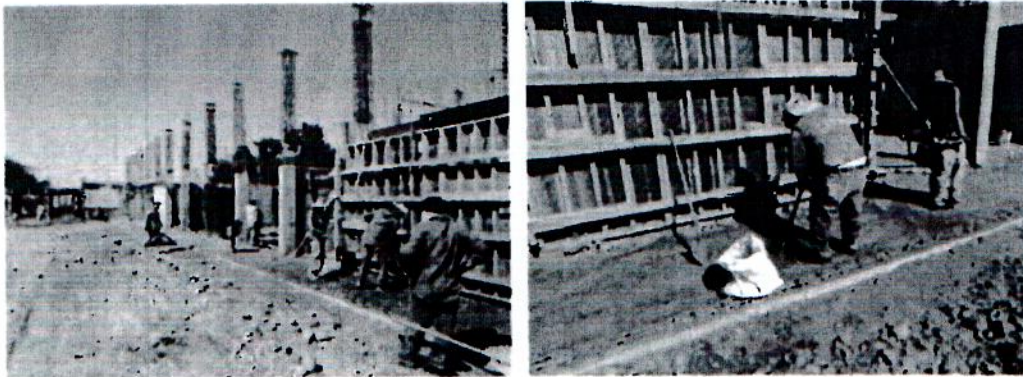

Redacción de hallazgo:

Se encuentran en trabajos de relleno en cimentación, resane en muros de concreto, cimbra de losa de entre piso, colocación de block en barda perimetral (noroeste), proceso de compactación en área de andadores.

Nombre de la Obra: RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE DIRECCION, CONSTRUCCION DE EDIFICIO U-1C, CONSISTE EN UNA AULA, AULA DE MEDIOS-BIBLIOTECA, USAER Y DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA RECURSOS HIDRAULICOS, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.


N° de Contrato: ISIE-ED-19-008

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Programa: RECURSOS PROPIOS

Ejercicio Fiscal: 2019

Monto Contratado: \$ 5 151,315.24

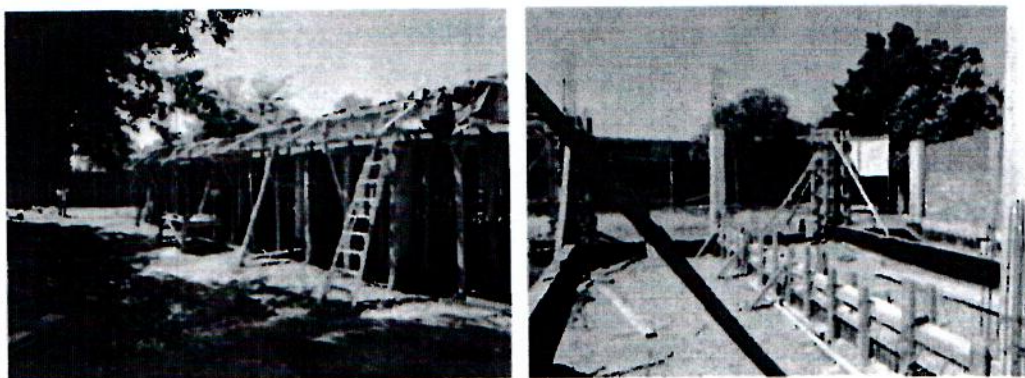

Redacción de hallazgo:

Durante la visita se encontraron trabajos de colado de losa en azotea, cimbra en columnas, colocación de ladrillo en muros.

El día 24 de abril del 2019, se continuó la revisión de las obras ubicadas en el municipio de Cajeme.

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS VIALES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA ZONA URBANA DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA


N° de Contrato: SIDUR-ED-17-248

Ejecutora: Secretaria de Infraestructura de Desarrollo Urbano (SIDUR)

Programa: RECURSOS PROPIOS

Ejercicio Fiscal: 2019

Monto Contratado: \$ 8 033,212.22

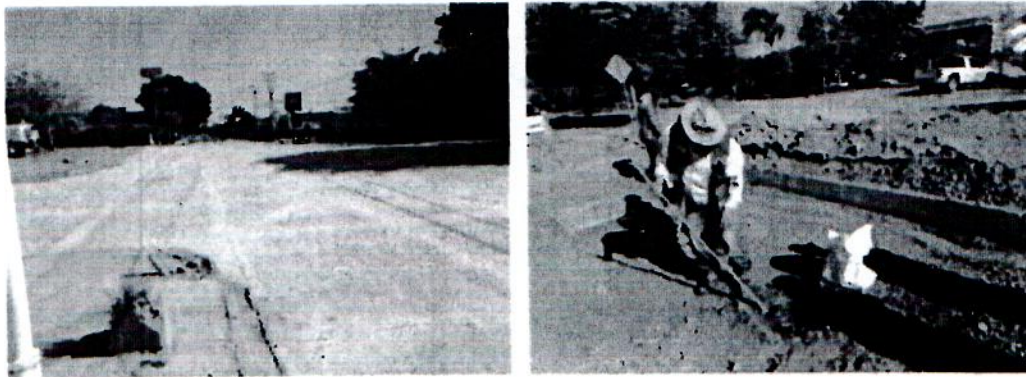

Redacción de hallazgo:

La obra se encontró en proceso suministro y compactación (en área de empate) de base hidráulica, en cruceo Blvd. Ignacio Ramírez y Tabasco.

Nombre de la Obra: RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION DUPLEX, DOCE AULAS, BIBLIOTECA, AULA DE MEDIOS, PREFECTURA, OBRA EXTERIOR Y ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO, EN SECUNDARIA JOSE RAFAEL CAMPOY, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA

N° de Contrato: ISIE-ED-19-006

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Programa: RECURSOS PROPIOS

Ejercicio Fiscal: 2019

Monto Contratado: \$ 21 911,099.78



Redacción de hallazgo:

Se encuentran en trabajos de colocación de block para dar nivel, cimbra de traveses de liga en edificio B, colado y cimbra de muros, columnas y losa de entepiso en edificio A, relleno en interior y exterior en edificios A y B.

Nombre de la Obra: RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO U-2C, CONSISTE EN: OCHO AULAS, AULA DE MEDIOS-BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA


N° de Contrato: ISIE-ED-19-011

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Programa: RECURSOS PROPIOS

Ejercicio Fiscal: 2019

Monto Contratado: \$ 8 033,212.22

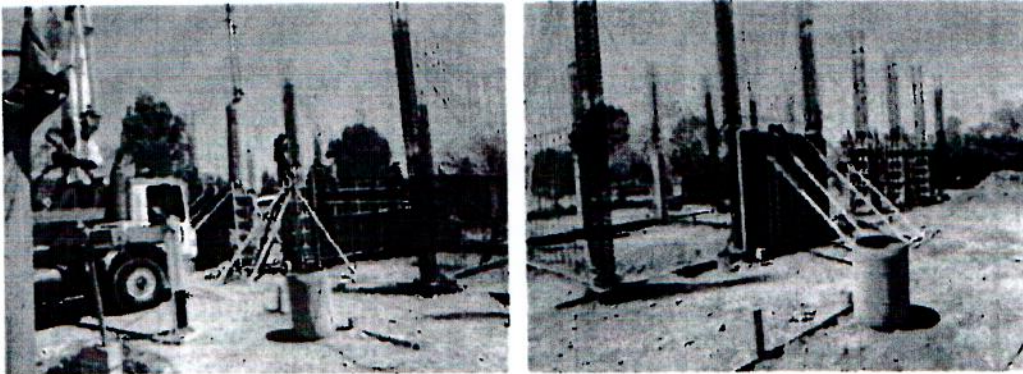

Redacción de hallazgo:

Se encuentran en trabajos de colado y cimbra en muros de concreto, relleno y compactación en interior de edificio.

El día 25 de abril del 2019, se continuó la revisión de las obras ubicadas en el municipio de Cajeme.

Nombre de la Obra: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES (CUM) EN CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, PARA AMPLIAR ESPACIOS PARA OFICINAS GUBERNAMENTALES

N° de Contrato: SIDUR-ED-18-266

Ejecutora: Secretaria de Infraestructura de Desarrollo Urbano (SIDUR)

Programa: RECURSOS ESTATALES (PROPIOS)

Ejercicio Fiscal: 2018

Monto Contratado: \$ 6 709,965.41



Redacción de hallazgo:

La obra se encuentra terminada.

El día 25 de abril del 2019, habiéndose concluido las actividades de verificación física de obras, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora. Se anexa copia de oficio de comisión.

ATENTAMENTE



Ing. Jorge Rene Rodríguez Moreno
