Hermosillo, Sonora, 16 de Enero de 2020.

16 ENE. 2020 12.21

ING. GUSTAVO CAMOU LUDERS
SUBSECRETARIO DE GANADERIA
P R E S E N T E.-

En relación al oficio N° 12/04/0024-2020, de fecha 13 de Enero de 2020, donde se me comisionó al Municipio Carbó, Sonora, el día 15 de Enero del presente año, le informo lo siguiente:

Acudimos a verificar acompañando al productor en su vehículo, al Sr. Jesús Jaime Vásquez Fernández, al rancho denominado "Ejido Carbó", para revisarle los conceptos de apoyo del que salió beneficiado, mismos que consisten en; Una pila de almacenamiento de agua construida a base de hojas de acero con capacidad para 210,000 lts. montada sobre una plataforma de concreto; Además de un equipo de bombeo el cual cuenta con varios aditamentos, celdas fotovoltaicas montadas sobre una estructura de acero, controladores eléctricos de encendido, cables para la corriente eléctrica, tubería de acero vaciado para extracción de agua desde 33.00 mts. de profundidad y una bomba sumergible.

Después de revisar que los trabajos culminados, se procedió a llenar cada una de las actas, en el lugar donde se encuentra la obra, para su trámite y pago correspondiente.

Se anexa: Informe Fotográfico.
Sin más por el momento me despido.

A T E N T A M E N T E

AGENTE TECNICO

ING. ALFREDO ALONSO GRAGEDA ARAGÓN

c.c.p. LIC. OSCAR ARMANDO ACUÑA ORTIZ.- Director General de Planeación, Administración y Evaluación
c.c.p. LIC. BERNARDO ESCALANTE MORUA.- Director General de Desarrollo Ganadero.
c.c.p. Lic. JESUS VICTOR CESAR GONZALEZ VIDAURRI/Enlace Administrativo
c.c.p. Archivo

R. 20

INFORME FOTOGRAFICO

PREDIO "EJIDO CARBÓ", MPIO. DE CARBÓ
COORD. (506047M E, 3285311M N)

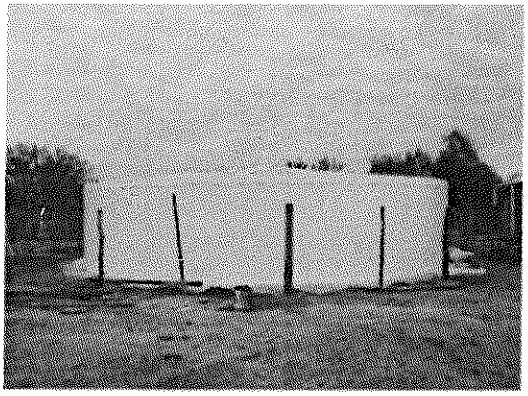

PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

FOTOCELDAS MONTADAS EN ESTRUCTURA

CONTROLADORES

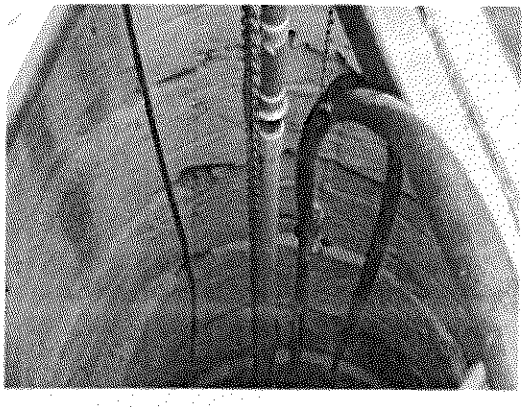

TUBERÍA DE ACERO

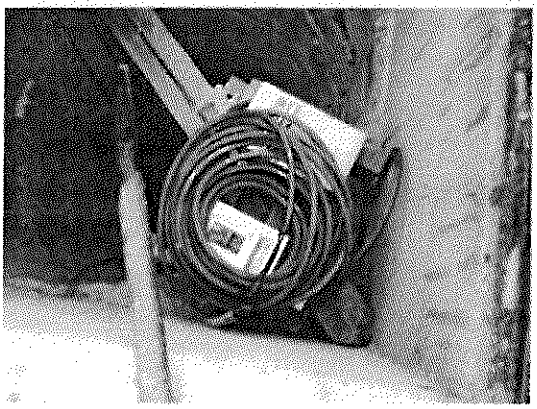

TABLERO Y CABLEADO
